

# Novidades do Reassentamento

Você está recebendo o Informe de Obras do reassentamento de Bento Rodrigues.

Aqui você vai encontrar informações atualizadas sobre quais serviços estão sendo executados.

20/08/2019



## Avanço das obras

### Construção das casas

Com a liberação dos alvarás de construção pela Prefeitura de Mariana, começaram as obras de alvenaria de **16 casas** do reassentamento de Bento Rodrigues.

## Quinzena agitada na Quadra F



### Contenções

A paisagem da Quadra F se transforma a cada dia. Para a construção das contenções dessa frente de obras, foram instaladas 124 de 169 estacas. A concretagem alcançou a marca de 215 m<sup>2</sup> dos 366 m<sup>2</sup> previstos. Estamos quase lá!

Contenções da escola municipal e dos postos de saúde e de serviços:

100%  
| realizado

### Fundações

A construção de fundações também avança. Nas primeiras casas, da Quadra F, foram instaladas **94 de 482 estacas**, e na escola municipal, esse número chegou a **89 de 435 estacas** projetadas.



### Outras Obras

No acesso principal às obras do reassentamento, foram instaladas **28 de 176 estacas-prancha** na área chamada de **contenção 2**. São grandes placas de metal, cravadas na terra, lado a lado, formando uma forte estrutura para evitar a movimentação do solo.



Visão aérea das obras da estrada de acesso

Na estrada de acesso à área atingida de Bento Rodrigues, a reforma do oratório de Nossa Senhora Aparecida começou.



Obra de demolição e projeto do novo oratório

## Fotos em destaque




Contenções da escola municipal concluídas





Concretagem de estacas de contenção do posto de saúde concluída



Construção das fundações dos Ids 62 e 57

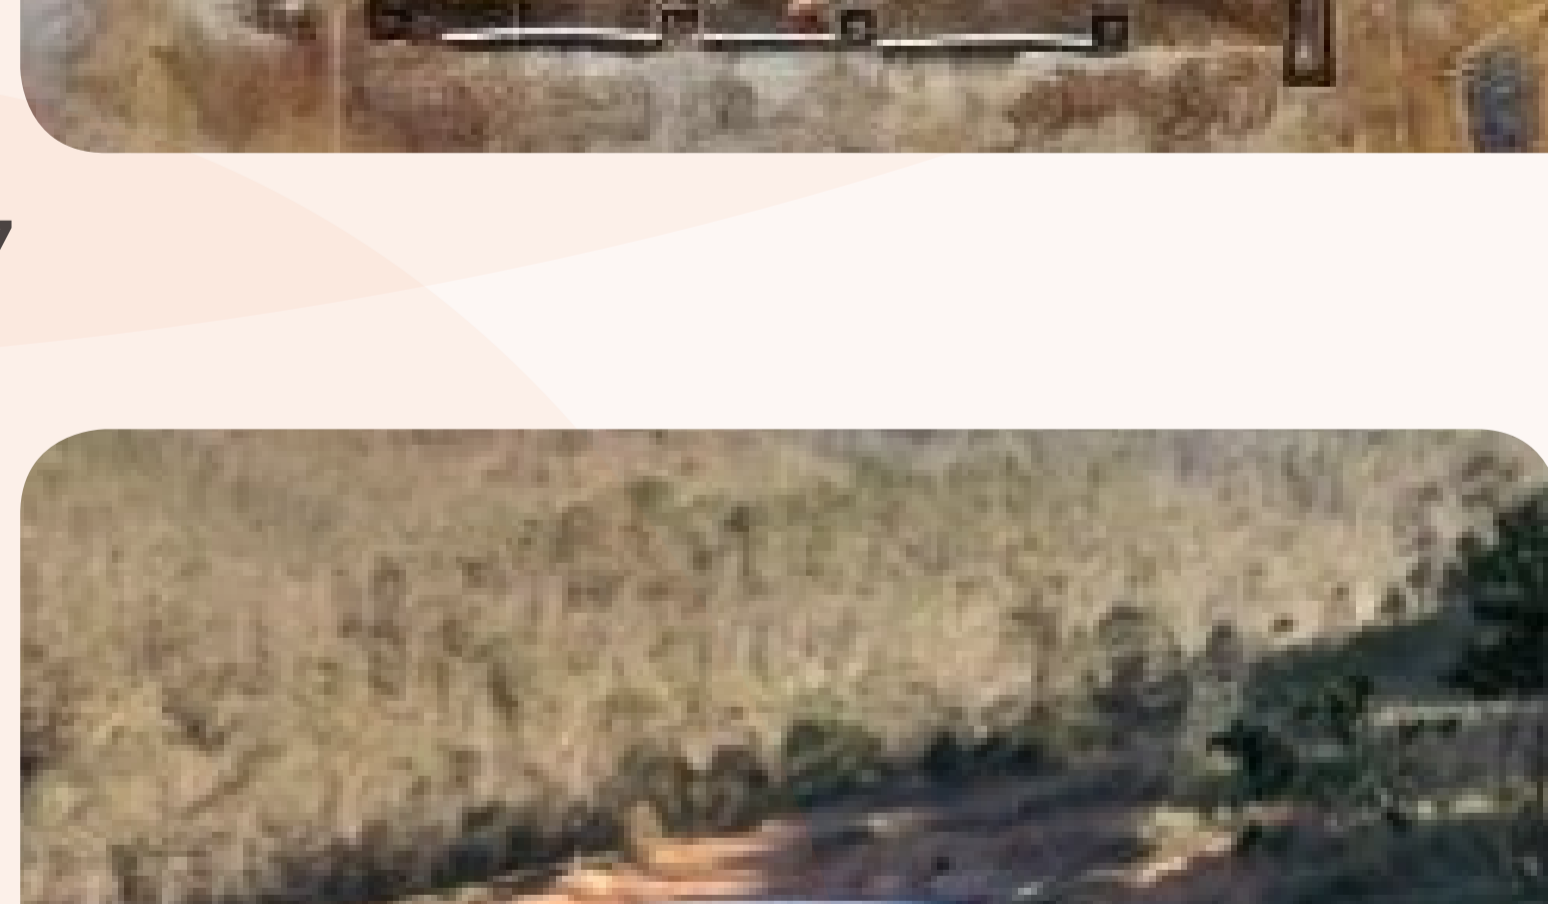

Obras de reforço da Rua Nova

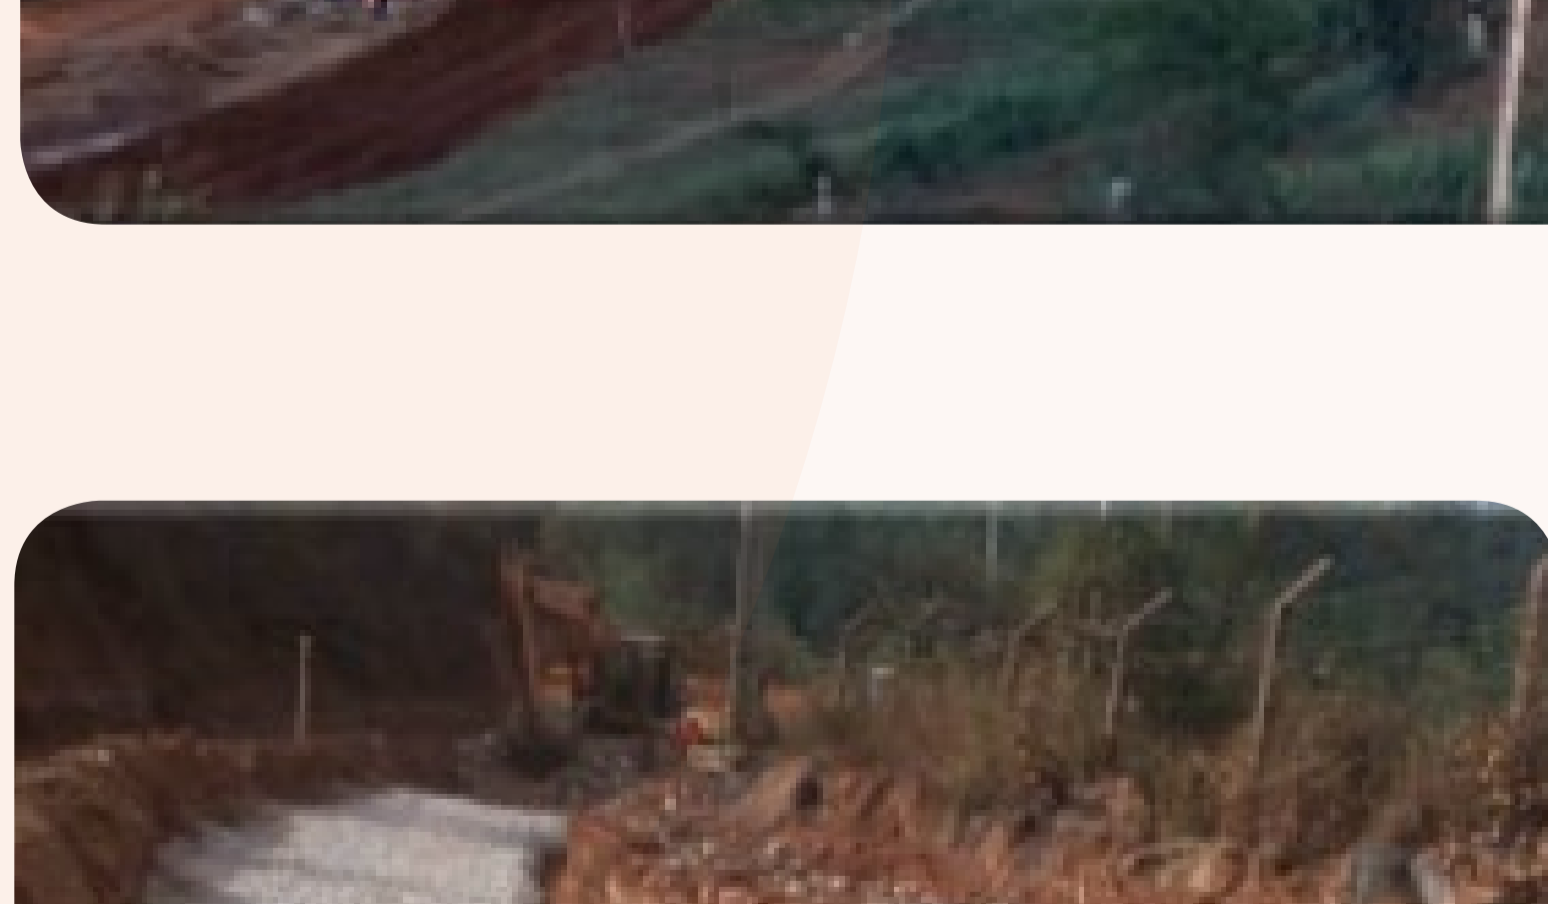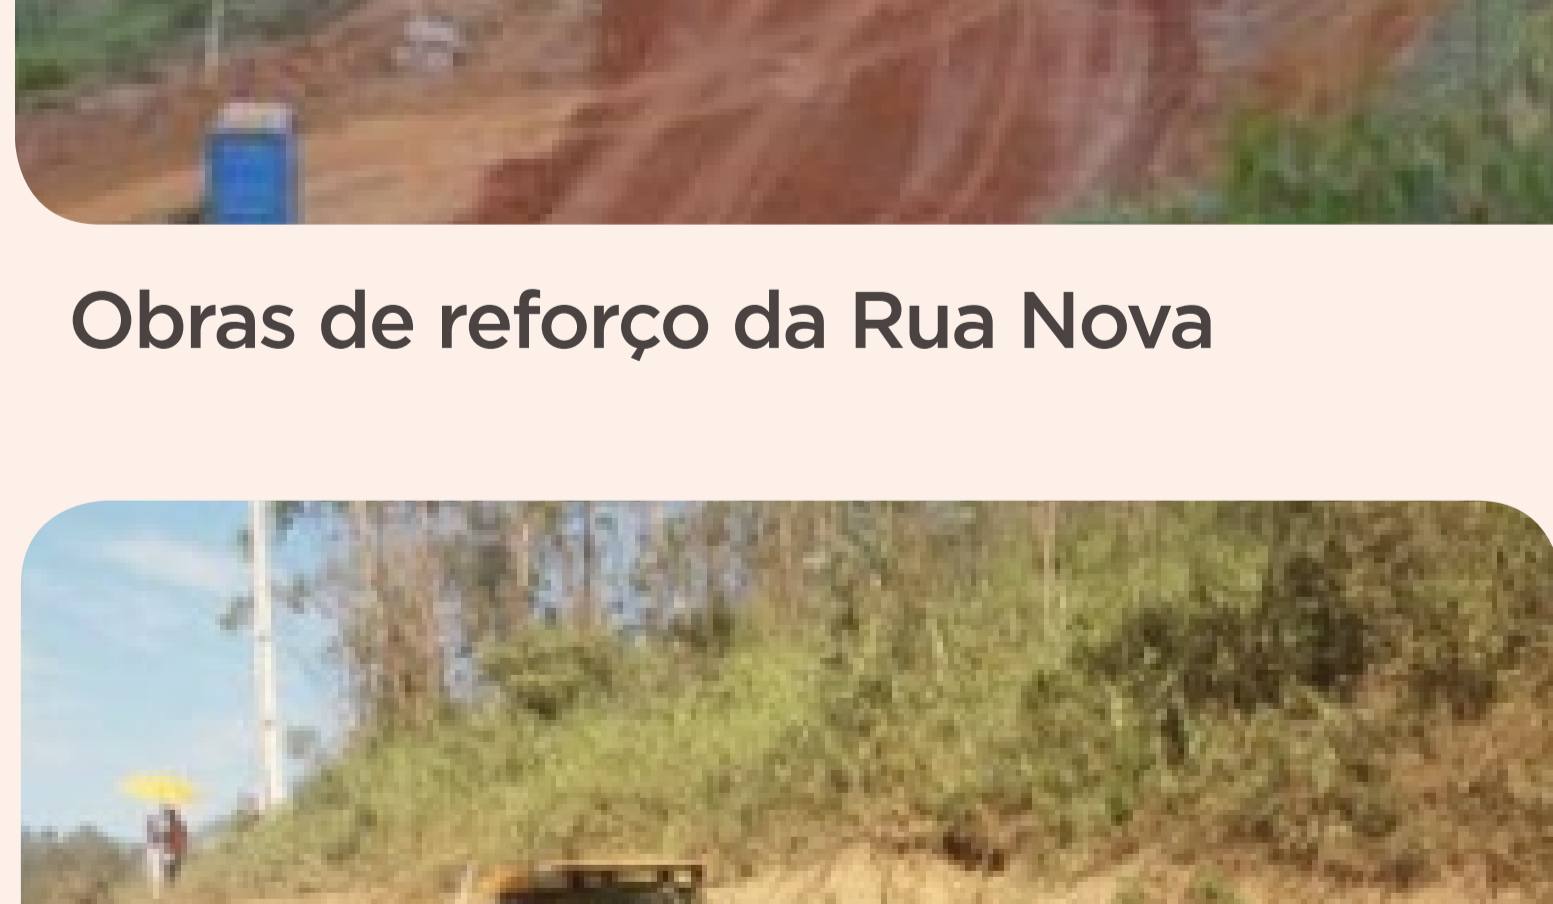

Obras de reforço e de drenagem no acesso principal

