

FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES\_R01**

Abril/2021

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Sumário Executivo .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>19</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>25</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>33</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>40</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>46</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>76</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>85</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>103</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>117</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>123</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>128</u></b>

<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>133</u></b>
<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>139</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>147</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>152</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>158</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>166</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>171</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>176</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>183</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>188</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>196</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>201</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>207</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>212</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>219</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>224</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>229</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>238</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>244</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>249</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>254</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>259</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>264</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>273</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>278</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>283</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>290</u></b>
<b>Gestão Econômica .....</b>	<b><u>296</u></b>

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em abril de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

### Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em abril houve o protocolo parcial dos Laudos da 2ª Campanha de Coleta Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310, protocolo do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano, protocolo informativo sobre o novo formato e periodicidade para os próximos relatórios do programa de garantia e controle de qualidade – QA/QC do PMQQS e protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378 (PG038, pág. 264).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 188). Em abril ocorreu o protocolo relatório referente aos resultados do 1º trimestre da rede automática de monitoramento da qualidade do ar, protocolo da Fase 3 dos Estudos do Balanço de Massa e Transporte de Sedimentos (atendimento ao item 2.1, Eixo 6 da ACP). Houve ainda a publicação na Revista Galileu do Estudo dos processos fluviais (Fase II) elaborado pela Rhama, por meio do Professor Carlos Tucci.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 103) a qual, até o mês de janeiro, bombeou cerca de 959 mil m<sup>3</sup> de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 76), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 430 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.667 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito e conclusão dos processos de contratação de reestruturação produtiva em todos os municípios. (PG017, pág. 158). Na região do Baixo e Médio Rio Doce, permanência da paralisação das atividades no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 201) e de Nascentes (pág. 207) — em abril, nos territórios do Alto e Médio Rio Doce não houveram fatos relevantes no mês e no território do Baixo Rio Doce, as atividades continuam paralisadas em função da pandemia do Covid-19.

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até abril/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de abril, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,3% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (99,4% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 547 indenizações, o que representa 94% do total das 612 propostas aceitas. 27 indenizações foram pagas em abril/21. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 183), atualmente existem 24.368 pessoas assistidas, com um total de 11.109 pagamentos. Em abril, 06 novos auxílios foram incluídos e 1.996 auxílios excluídos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 25) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 33). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.342 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 290 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 175 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 198 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.



Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 40) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 139) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, em relação a Plataforma Prosas, houve realização de 88 propostas efetuadas por organizações da sociedade civil no Edital de Proteção Social. Vale ressaltar que as inscrições foram encerradas em 30/04/2021.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 46; PG035, pág. 254 e PG036, pág. 259), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 229), os repasses já realizados somam R\$ 22.670.331,12 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, para os municípios de Aimorés/MG, Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 85) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de abril:

***Bento Rodrigues*** — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em abril, está em andamento a construção de 72 casas;

**Paracatu de Baixo** — em abril, para a engenharia Básica: foram concluídos para 64 casas, 4 lotes vagos e 7 bens públicos.

**Gesteira** — em abril, houve a aquisição de dois imóveis.

**Reassentamento Familiar e Reconstruções** — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em abril, houve a conclusão 09 reconstruções e 04 edificações com projeto detalhado/compatibilização.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

## PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

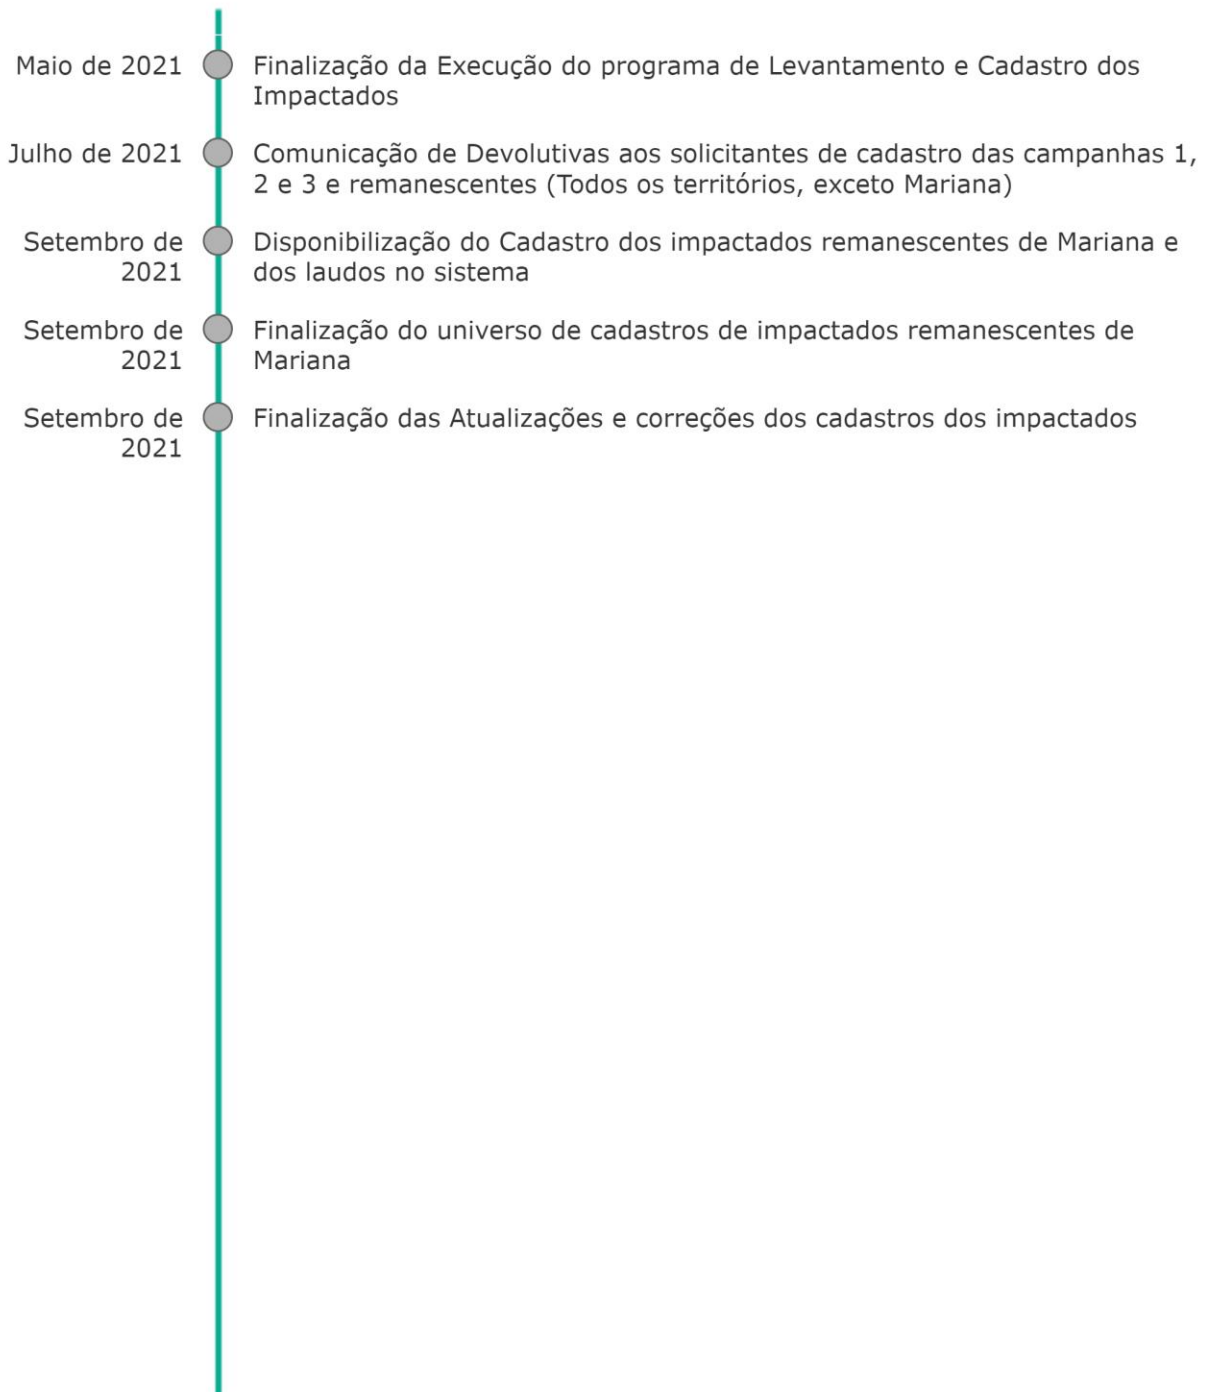

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 79.687 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

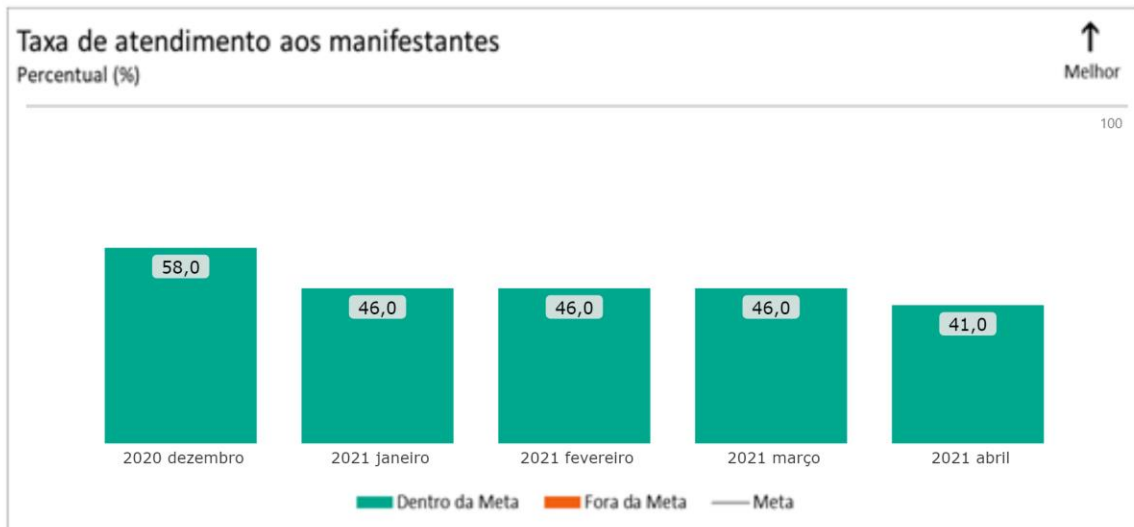


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

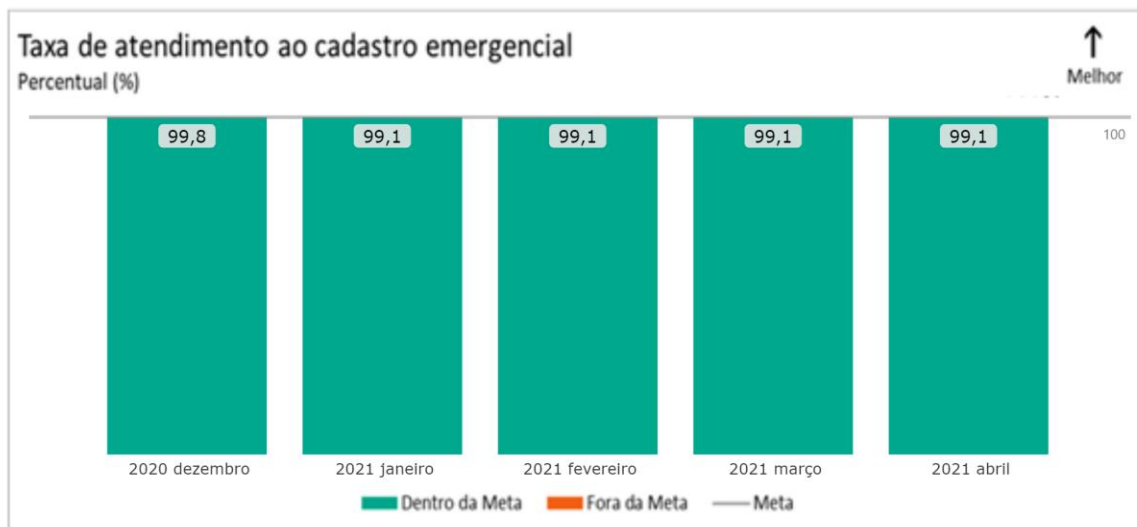


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado



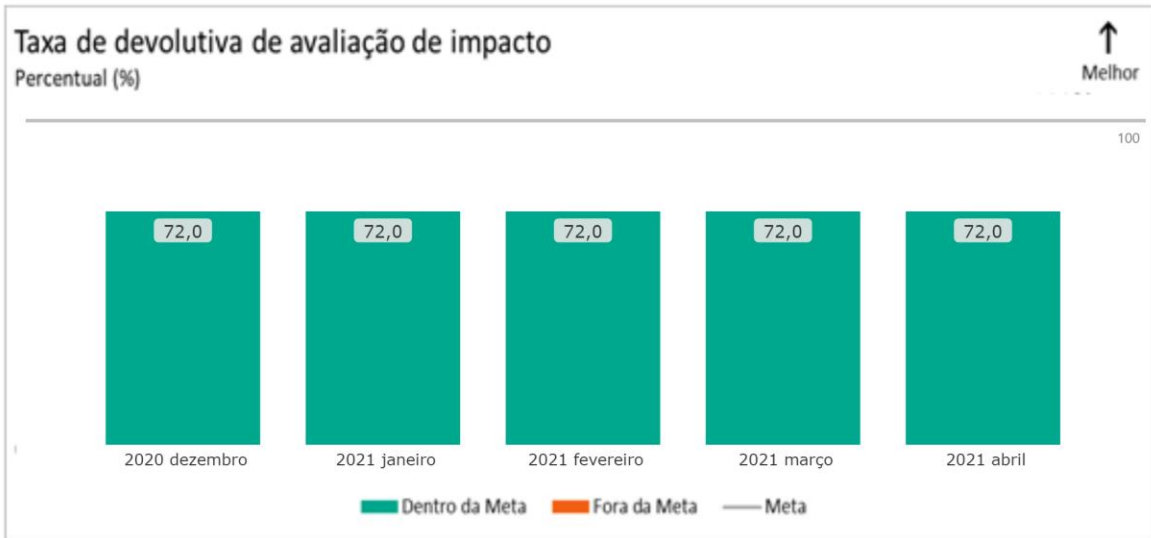


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

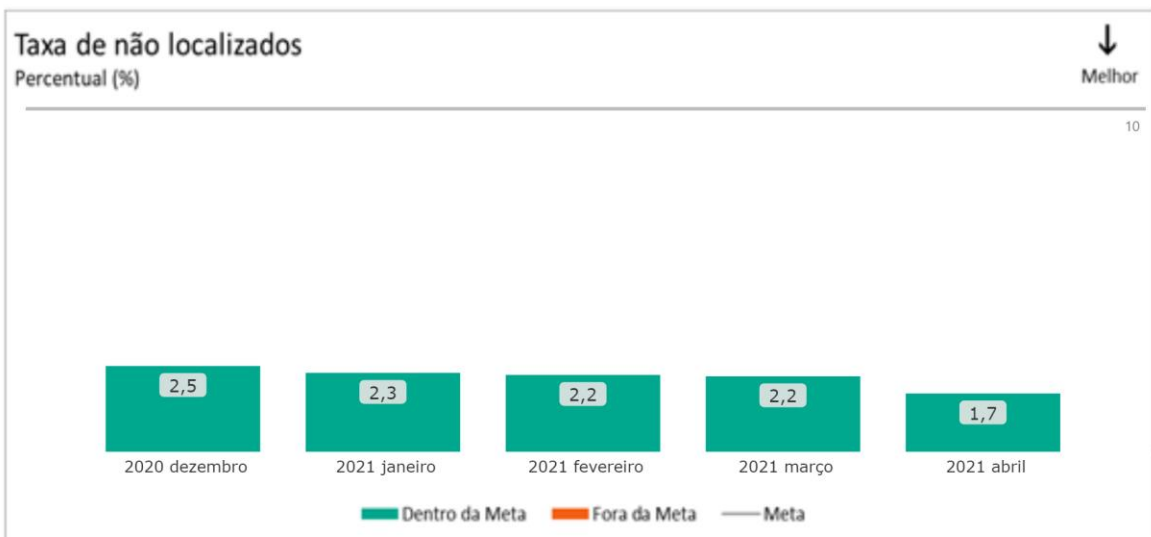


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

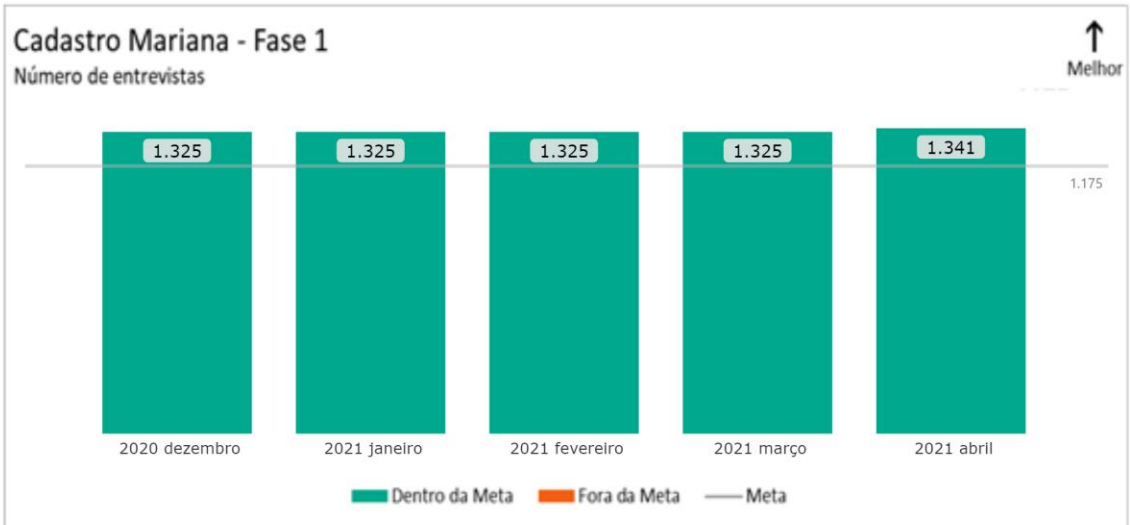


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

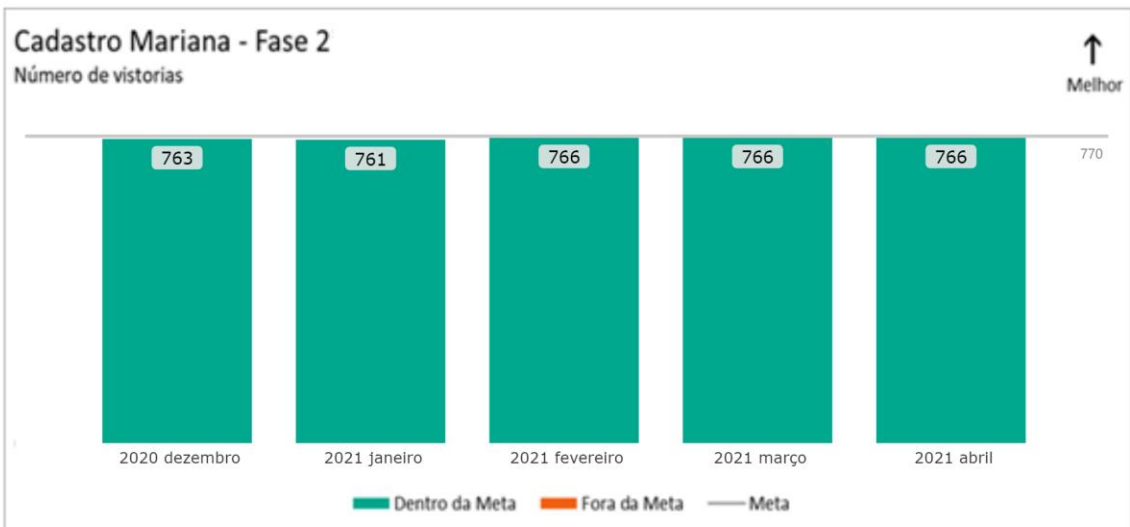


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

## **PG002    Ressarcimento    e    Indenização    dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	18	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.370 aceitaram propostas. Destas, 264.955 propostas já foram pagas ( 98 % das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 293 milhões**.
- **Para Danos Gerais**, 10.490 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.464 já foram pagos ( 99,8 % dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.135 milhões**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 574 indenizações, o que representa 94% do total das 612 propostas aceitas.
- **Para os Camaroeiros da Enseada do Suá**, até o momento foram atendidos 173 pessoas ( 98% do 176 elegíveis). 172 já receberam o pagamento das indenizações.

## **Fatos relevantes do mês**

Pagamento de 27 indenizações de Mariana

## Indicadores

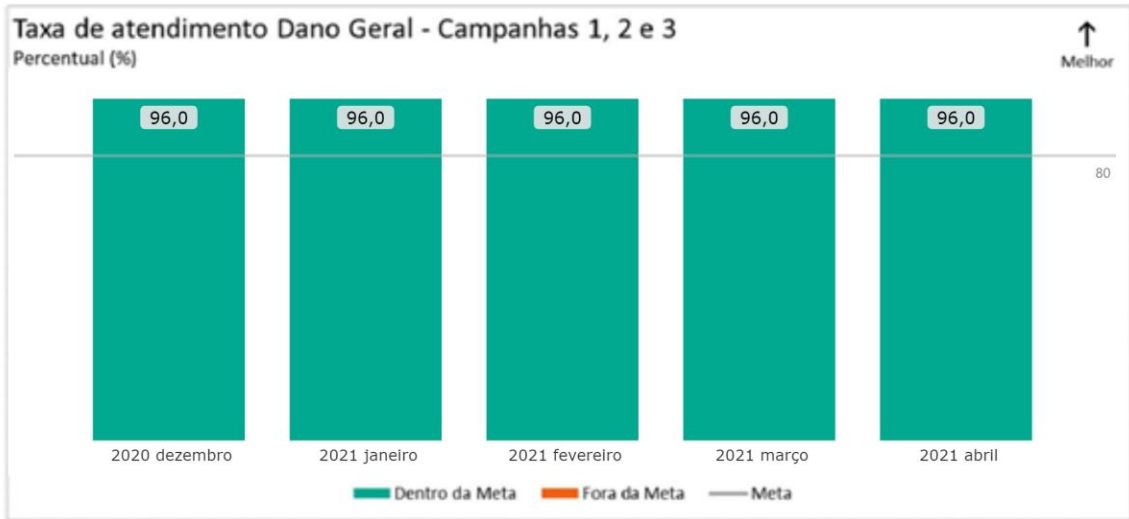


Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

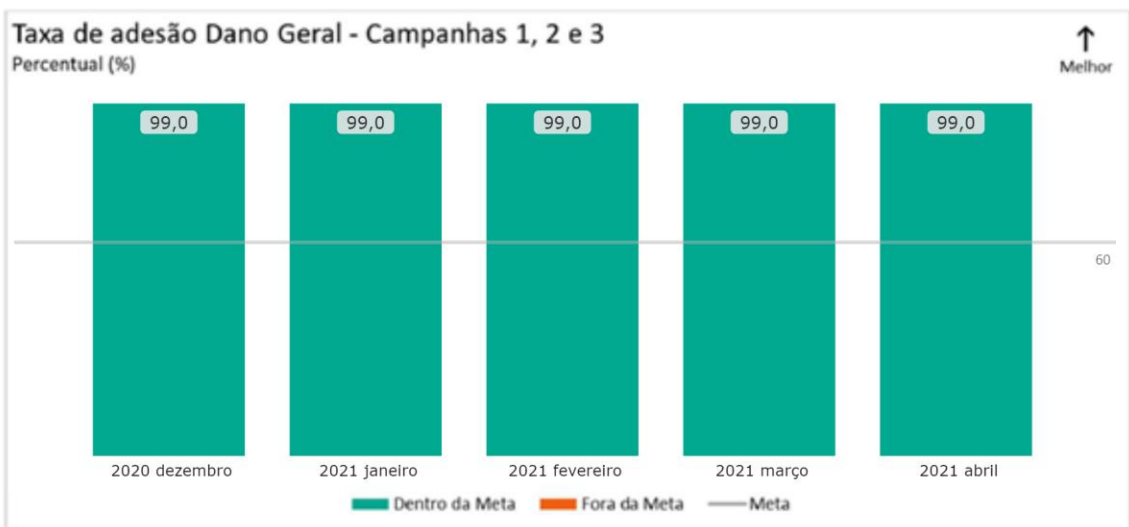


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



# PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

## Eixo Pessoas e Comunidades

### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Pendente
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

## Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1769 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 138 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor. (total de 4.303 m<sup>3</sup>);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.740 m<sup>3</sup>).

## Fatos relevantes do mês

### Tupiniquim-Guarani

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.186.877,01 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas ( ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1342 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1342 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 273 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 717 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.186.877,01 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

## **Comboios**

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 35.760 litros distribuídos nos dias 25 de março de 2021 e 01, 08 e 15 de abril de 2021 (total de 1788 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.522,84, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 290 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

## Resplendor

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números ( Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas ( UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ ( 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2021 até 20/04/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021.
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.



## PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Planejado
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	3	Reprogramado
Deliberação	423	4	Planejado

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente

Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Grandes números do programa

- 373 **titulares** ( 175 quilombolas, 94 fiscoadores de Rio Doce e 104 fiscoadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Finalização e Entrega da Versão Final do Plano de Comunicação da CRQ Degredo Revisado

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

| Cláusula

54


Caput

Em Andamento



Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	442	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

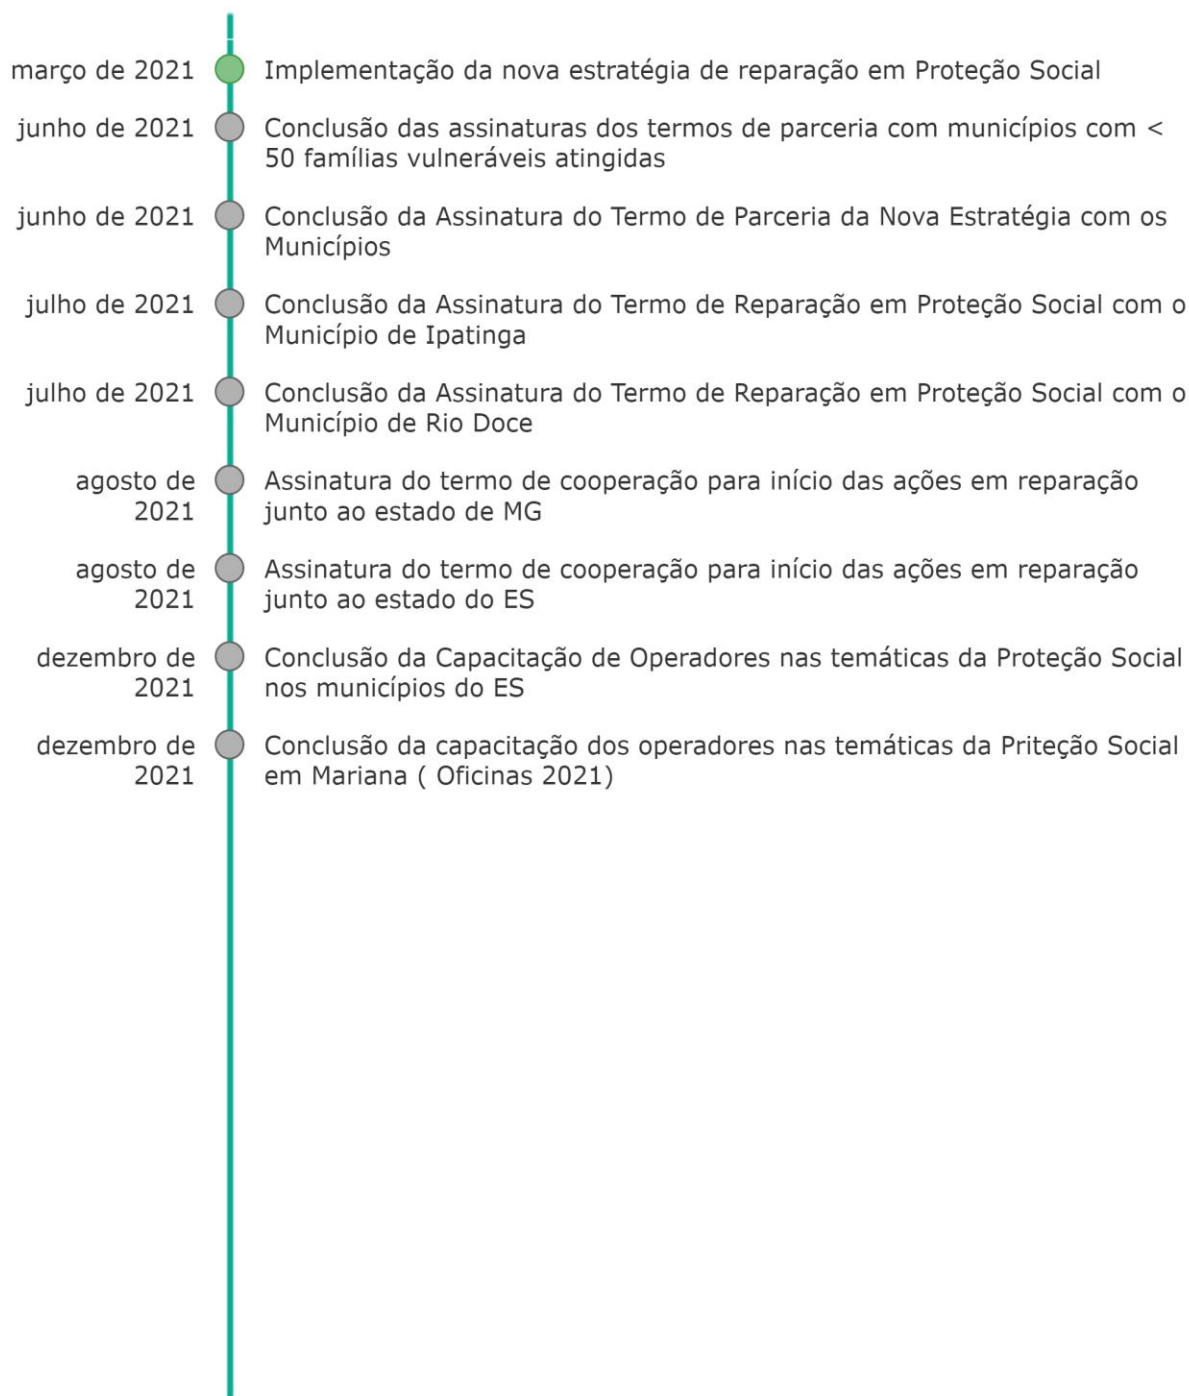

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Atuação de 20 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/ MG**, no período 16/03/2021 a 15/04/2021.
- *Atuação de 55 **profissionais** (entre assistentes sociais, psicólogos e motoristas) nos municípios de **Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares, Naque, Periquito e Santana do Paraíso**, contratados pelos municípios a partir de repasses financeiros anteriormente realizados pela Fundação Renova, no período 16/03/2021 a 15/04/2021.*
- Disponibilização de 15 **veículos** para transporte das equipes suplementadas nos municípios atenderem às famílias vulneráveis atingidas.
- 14.247 **total de famílias** no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas vulneráveis a partir de informações autodeclaradas.

## **Fatos relevantes do mês**

De acordo com a Plataforma Prosas, podemos constatar a realização de 88 propostas efetuadas por organizações da sociedade civil no Edital de Proteção Social. Vale ressaltar que as inscrições foram encerradas em 30/04/2021.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	caput	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Planejado
Cláusula	66	caput	Concluído Internamente
Cláusula	67	a	Em Andamento
Cláusula	67	b	Concluído Internamente
Cláusula	67	c	Concluído Internamente
Cláusula	68	caput	Concluído Internamente
Cláusula	69	caput	Concluído Internamente
Cláusula	70	caput	Em Andamento
Cláusula	71	caput	Concluído Internamente
Cláusula	72	caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

outubro de 2021		Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021		Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021		Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021		Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021		Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021		Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021		Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021		Realização do mapeamento de stakeholders e manutenção de contato proativo
dezembro de 2021		Atendimento a 29 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021		Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021		Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

 Concluído       Planejado       Reprogramado



## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

▲ INDICADOR MÊS	março de 2021	abril de 2021	▼ ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	9	7	117.834
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês )	34	16	3.457
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	983
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	11

## Fatos relevantes do mês

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período. Ao longo do mês foram realizadas reuniões em Santa Cruz do Escalvado (MG); Pingo D'água (MG); Periquito (MG) e Marilândia (ES).

Em Mariana (MG) foi realizada reunião do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo da comunidade para discussões sobre o reassentamento. Sobre o tema, foram realizados diálogos proativos com lideranças dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para esclarecimento sobre a judicialização da decisão do prazo final para entrega das obras. Destaque para a realização de encontro com Comunidades Rurais atingidas para discussão sobre o andamento das ações de compensação coletiva, impactos na telefonia local e disponibilização de internet por parte da Fundação Renova.

Em Regência (Linhares) foi realizada reunião com lideranças para esclarecimentos sobre o sistema de abastecimento de água fornecido atualmente pela Estação de Tratamento de água da comunidade e atualizações sobre o projeto de captação alternativa.

Na Calha do Rio Doce foram realizadas ações para a retomada das atividades agrícolas e agropecuárias: em Messias Gomes (São José do Goiabal) foram realizadas entrevistas com proprietários de quintais produtivos para levantamento de informações sobre acesso a serviços e características dos quintais. Os resultados foram discutidos em reunião com o público para planejamento de novas ações. Em Bom Jesus do Galho foi realizada reunião com integrantes da Associação dos Agricultores Familiares do Distrito de Revés do Belém (Afareves) para dialogar sobre ações coletivas para retomada de atividades agropecuárias na localidade.

Na comunidade quilombola de Degredo foram realizadas reuniões para discussão e apresentação dos planos de trabalho dos programas do Eixo Gestão do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

No Alto Rio Doce, foi realizada reunião para apresentação do Projeto "Inovando Futuros" que visa promover ações para capacitação de empreendedores da região. No município de Barra Longa foi realizada ação de Diálogo para repasse de informações e esclarecimentos sobre o Tac Governança (Envio conforme fluxo acordado da Deliberação 216).

No Médio Rio Doce foi realizada reunião com moradores de Tumiritinga (MG) e Galileia (MG) para esclarecimentos sobre o Tac Governança. Ainda no território, foi realizada reunião com comerciantes de Tumiritinga (MG) para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (MG) (Envio conforme fluxo acordado da Deliberação 216).

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020).

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)</b>
10.087,00	148,33

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	157,00
abril de 2021	157	
		-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. As primeiras ondas de mensuração serão realizadas a partir do início de 2021 e, quando aprovado o documento de definição do programa, para os indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos desde o início da medição.

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼ Grande Número	março de 2021	abril de 2021
Número de profissionais envolvidos nos canais permanentes	313	313
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	176.216	179.791
Canais: Número total de manifestações	762.603	775.225
Canais: Número de manifestações respondidas	693.720	704.838
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	130.637	131.311
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	12.812	13.915
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.091	13.127
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	606.063	616.872
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	6	1
Canais: Número de manifestações em tratamento	68.883	70.837

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.



### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

## Fatos relevantes do mês

Análise de manifestações relacionadas ao tema de Quintais do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas (PG10), Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG09) no território do Alto Rio Doce para subsidiar o planejamento de estratégias para resolução das demandas.

Apoio à equipe de Diálogo Social no levantamento de informações sobre os atingidos requerentes do Fluxo Ágil, para esclarecimento de dúvidas dos advogados.

Apoio à equipe de Diálogo Social para mobilização dos públicos de relacionamento do município de Colatina para inscrição e participação no Fórum de Prestação de Contas - Resulta. O evento teve como objetivo falar sobre os desafios e resultados das ações de reparação e compensação na bacia do Rio Doce, promovidas pela Fundação Renova até o momento.

Implementação, execução e monitoramento do Plano de Ação, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo a análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo do sistema. O objetivo é gerir e dar resolutividade de manifestações pendentes de resposta, vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamento de Bento Rodrigues, no município de Mariana (MG). O Plano está sendo replicado para resolução das manifestações referentes ao reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo.

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs.

Monitoramento e análise de manifestações relacionadas ao Informe de Rendimentos para articulação com a área responsável e celeridade nas devolutivas aos manifestantes.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos processos de trabalho deste Canal e ampliação do entendimento sobre temáticas e ações do processo de reparação e compensação: Treinamento para tratamento de protocolos de solicitação de Cadastro após 30/04 (05/04); orientações para respostas sobre pagamento de Lucro Cessante nas Novas Áreas (Foz/Litoral ES) (13/04); Alinhamento para contatos ativos sobre o Fluxo Ágil em municípios com data limite de ingresso até 30/04 (22/04); Desenvolvimento Profissional – Herkenhoff & Prates - Módulo: O trabalho e aspectos motivacionais (13/04); Encontro do Comitê de Qualidade de Vida – Herkenhoff & Prates.

Realização de interações junto aos públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, para os elegíveis das localidades em que o prazo final de adesão foi 30/04/2021, em que se encontrava em percentual de adesão inferior a 86% (Aracruz, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Colatina, Conceição da Barra, Governador Valadares, Itueta, Linhares, Naque, Periquito e Santana do Paraíso). No mês de abril, foram realizados 265 contatos pelos atendentes CIAs e foram recebidas 2.651 ligações pelo Canal 0800 de diversos municípios.

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar


Tabela 5. Quantidade de Publicações

Canais	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
Áudio			1		<b>1</b>
ÁudioZap	4	5	9	8	<b>26</b>
Carro de som			2		<b>2</b>
Cartilha	1				<b>1</b>
E-mail Marketing			3	6	<b>9</b>
Informe do Reassentamento	4	2	4	2	<b>12</b>
Jornal da Comunidade	8		15	9	<b>32</b>
Matéria - Boletim Jornada	14	31	22	49	<b>116</b>
Mídia Social			5		<b>5</b>
Newsletter	6	4	6	3	<b>19</b>
Outros	2		9	8	<b>19</b>
Pílula	27	26	51	46	<b>150</b>
Rádio			10	8	<b>18</b>
Vídeo	2	2	2	2	<b>8</b>
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>418</b>

## COMUNICAÇÃO

### Produção por Território

Canais: ● ÁudioZap ● E-mail Marketing ● Informe do Reassenta... ● Jornal da Comuni... ● Matéria - Boleti... ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo




\*Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

## COMUNICAÇÃO

### Temas mais publicados

Canais ● ÁudioZap ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria - Boletim Jornada ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio ● Vídeo

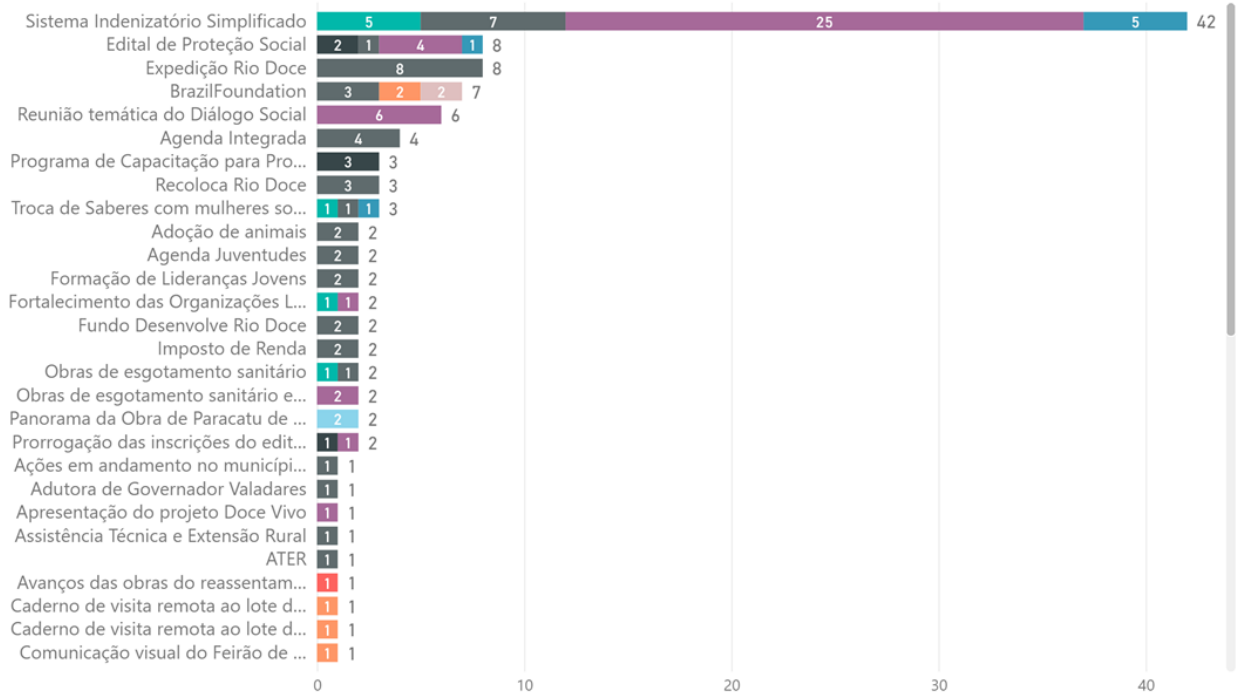

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Produção e distribuição digital da 8ª edição do boletim Jornada para a população de Barra Longa.

Produção e distribuição digital da 8ª edição do boletim Jornada para a população de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

#### Calha do Rio Doce

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores e lideranças de Baixa Verde, comunidade de Dionísio, para reunião virtual sobre Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 06/05.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores e lideranças de Pingo-D'Água para reunião virtual sobre Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 27/04.

Produção de audiozap com informações sobre os Encontros de Trocas de Saberes com Mulheres sobre associativismo e desenvolvimento econômico.

Produção de programa de rádio com informações sobre os Encontros de Troca de Saberes com Mulheres sobre associativismo e desenvolvimento econômico.

Produção e distribuição digital da 7ª edição do boletim Jornada para a população do território Calha do Rio Doce.

#### Mariana

Produção e distribuição digital da 13ª edição do jornal Voz da Comunidade, informativo com as comunidades atingidas de Mariana.

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Baixo Rio Doce

Elaboração de pílula de WhatsApp para convidar representantes de escolas dos municípios de Baixo Guandu, Colatina e Marilândia para conhecer o projeto Doce Vivo.

Produção de pílula para esclarecer que a Fundação Renova não mantém vínculo com as atividades exercidas no local onde foi o escritório de diálogo em Resplendor.

Publicação e distribuição digital da 11ª edição do boletim Jornada para a população do Baixo Rio Doce.

#### Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Rio Casca para reunião virtual, no dia 12/05, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

#### Médio Rio Doce

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores da sede de Periquito para reunião virtual, no dia 15/04, sobre Sistema Indenizatório Simplificado e ações do Plano de Suplementação do Programa de Proteção Social realizadas no município.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Conselheiro Pena para reunião temática do Diálogo sobre TAC Governança.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Pedra Corrida para reunião virtual, no dia 22/04, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado e Lucro Cessante.

Produção e distribuição digital da 5ª edição do boletim Jornada para a população de Conselheiro Pena, Galiléia e Tumiritinga.

Produção e distribuição digital da 7ª edição do boletim Jornada para a população de Governador Valadares.

Produção e distribuição digital da 8ª edição do boletim Jornada para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito.



## **Fatos relevantes do mês**

### **Territórios**

#### **Foz do Rio Doce**

Produção e distribuição digital da 15ª edição do boletim Jornada para a população de Linhares.

#### **Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

Produção de pílula sobre o lançamento da plataforma Expedição Rio Doce.

#### **Comunicação com Territórios**

Veiculação de nove programas (Momento Renova) em cinco territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em abril com um total de 54 programas em julho, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Imprensa**

Animais resgatados após rompimento de Fundão podem ser adotados.

Expedição faz mapeamento inédito do rio Doce e ganha plataforma de conhecimento.

Indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado chegam a R\$ 400 milhões em Minas.

Indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado chegam a R\$ 660 milhões no ES.

Inscrições para projeto de fortalecimento de organizações locais vão até 16 de abril.

Prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado vence em 30 de abril em 13 localidades.

Rio Doce está se recuperando após rompimento de barragem em Mariana.

## Fatos relevantes do mês

### Imprensa

Encontro virtual apresenta ações de capacitação a empreendedores de Minas.

Inscrições para o Edital de Proteção Social vão até 30 de abril.

Pagamento do lucro cessante de 2020 chega a R\$ 95,6 milhões para cerca de 4,2 mil pessoas.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Divulgação das redes sociais da Fundação Renova sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

Produção de programa de rádio para informar sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

#### **Suporte à Relações Institucionais**

Produção de programa de rádio no território Médio Rio Doce para divulgar o 2º repasse da Agenda Integrada aos governos e prefeituras de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluindo investimentos com recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para a educação estadual e municipal dos 8 municípios.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Elaboração de áudiozap informando quais são os encaminhamentos adotados pela Renova em relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de indenizações pelo novo Sistema.

Elaboração de pílula de WhatsApp com atualizações sobre o número de indenizações pagas pelo Sistema Indenizatório Simplificado e previsão de novos pagamentos.

Elaboração de pílula de WhatsApp divulgando que o distrito de Senhora da Penha, em Fernandes Tourinho, passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp informando quais são os encaminhamentos adotados pela Renova em relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de indenizações pelo novo Sistema.

Elaboração de pílula de WhatsApp informando que o município de Marilândia passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de programa de rádio com informações sobre o Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Sem-Peixe passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Resplendor passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Ipaba passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o município de Caratinga passa a fazer parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap informando que Caratinga, Sem-Peixe e Ipaba passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap divulgando que o município de Bugre passou a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap divulgando que o município de Aimorés passou a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de arquivo de áudio para distribuição via WhatsApp com informações sobre o Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

Elaboração de pílula de WhatsApp informando que o município de Periquito passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de vídeo divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

Produção de pílula de WhatsApp para atingidos de Resplendor sobre necessidade de preenchimento da Autodeclaração de não-pertencimento à comunidade indígena para acesso Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando o prazo final para 14 localidades acessarem o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o desconto do Imposto de Renda do pagamento das indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

Produção de audiozap informando que Marilândia e Periquito passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado e lembrando que o prazo para 14 localidades aderirem ao Sistema vai até 30 de abril.

Produção de audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

Produção de audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos e passa a atender o município de Resplendor.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Elaboração de pílula sobre o prazo final para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de pílula de WhatsApp sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

#### **Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

Produção de pílula-convite para a primeira reunião do Comitê Gestor do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

#### **Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social**

Elaboração de pílula-convite para a última oficina de esclarecimento sobre o edital de Proteção Social.

Produção de e-mail marketing sobre a realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições interessadas sobre o Edital de Proteção Social.

Produção de e-mail marketing sobre abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

Produção de e-mail sobre abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

Produção de pílula sobre a realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições interessadas sobre o Edital de Proteção Social.

Publicação de post nas redes sociais da Fundação Renova divulgando as oficinas de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital de Proteção Social.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Elaboração da 25ª edição do Informe do reassentamento de Bento Rodrigues com informações atualizadas sobre as obras.

Elaboração da 18ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Elaboração da 17ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Criação de GIF animado para ser enviado às famílias de Bento Rodrigues como primeira comunicação rápida sobre o início da construção de casa no reassentamento.

#### **Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social**

Produção de pílula sobre a prorrogação, até o dia 30/04, das inscrições no Edital de Proteção Social.

Produção de e-mail marketing reforçando os últimos dias para inscrições no edital de Proteção Social.

Elaboração de pílula sobre o fim das inscrições do edital de Proteção Social.

#### **Suporte ao PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**

Produção de pílula sobre a prorrogação das inscrições no edital indígena.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de programa de rádio informando que 30/04 é o prazo final para algumas localidades mineiras aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.



## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

Produção de e-mail marketing para convidar gestores municipais de saúde para apresentação do Programa no dia 16/04.

Produção de e-mail marketing para convidar gestores municipais de saúde para apresentação do Programa no dia 14/04.

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Elaboração de pílula de WhatsApp reforçando o prazo final para inscrições no projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Elaboração de audiozap divulgando que o prazo de inscrição para o projeto de Fortalecimento das Organizações Locais foi prorrogado.

#### **Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**

Produção de pílula de WhatsApp informando, mais uma vez, o adiamento do prazo de duração das obras de esgotamento sanitário em Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp informando o novo prazo de duração das obras de esgotamento sanitário em Barra Longa.

Produção de audiozap informando para a comunidade o início das obras de esgotamento sanitário no bairro Volta da Capela, em Barra Longa.

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Produção de newsletter para apresentação nas obras do Reassentamento de Paracatu de Baixo sobre os grandes números do reassentamento.

Elaboração da 25ª edição do Informe do reassentamento de Paracatu de Baixo com informações atualizadas sobre as obras.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica**

Elaboração de convite para novo Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Fundação Renova.

## Indicadores

Durante o último trimestre de 2020, a CT<sub>7</sub>PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A pesquisa com os atingidos e atingidas será realizada até o fim do primeiro semestre de 2021. Caso o documento de definição do programa seja aprovado após a realização da pesquisa, os indicadores mensurados serão apresentados de forma retroativa desde o início da pesquisa.

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento

Deliberação	226	1	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre EAP x EAC, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1121 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 338 devoluções, 157 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 430 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 307 bovinos, 63 equinos, 38 caninos, 18 suínos, 30 aves, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1667 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.



## Indicadores

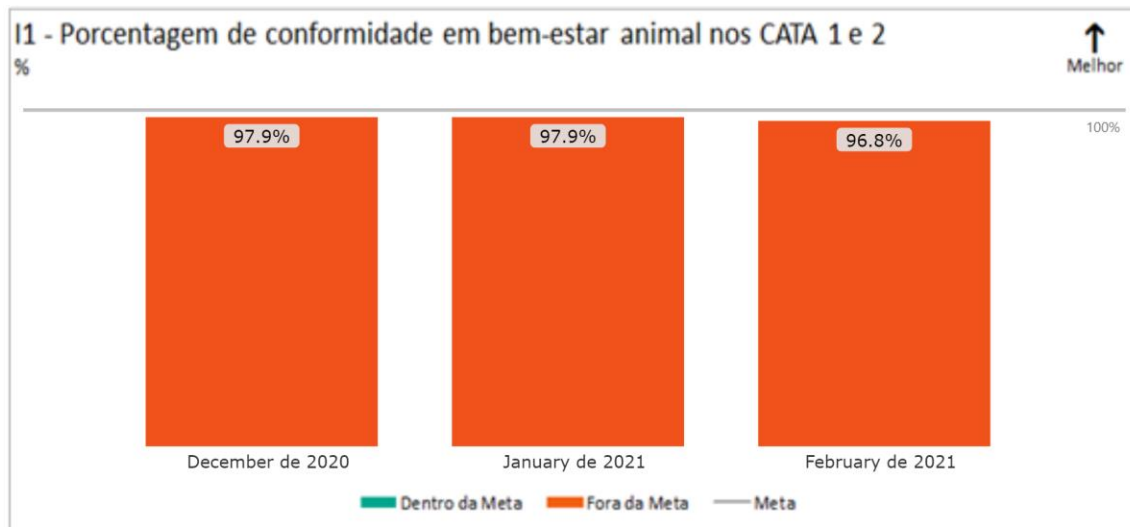


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.

A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição Do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que as ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Em relação à finalização dos processos adotivos, nos meses de março e abril cinco acompanhamentos pós-adoção foram concluídos, resultando na atualização do indicador, conforme previsto na Definição do Programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I3</b>	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	$\frac{\text{Número de restituições no reassentamento}}{\text{Número de animais acolhidos nos CATA's}}$	%
<b>I4</b>	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	$\frac{\text{Número de acompanhamentos finalizados}}{\text{Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação}}$	%

## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

| Cláusula

76


Caput




Judicializado

Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## **Fatos relevantes do mês**

Treinamentos com funcionários e colaboradores em home office

Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders das ações para garantia do retorno das atividades de maneira segura

Tratativas de processos de suprimentos/APRO's

Social: Continuação dos atendimentos remotos às famílias dos reassentamentos

Recebimento de Agregados e alguns materiais tais como: Brita, Areia, Bloco Estrutural, Bloco de concreto, Meio Fio, intertravado.

Logística e gestão dos materiais para estoques.

Estamos tendo em média 10% de faltas no efetivo das contratadas.

Elaboração de estudos referente aos impactos da pandemia COVID 19

Continuação de elaboração de projetos possíveis de serem realizados em home office



## **Fatos relevantes do mês**

Social: Continuação dos atendimentos remotos às famílias dos reassentamentos;

Social: Aquisição do Imóvel para o ID SGC 42448 em Paracatu de Baixo (Rural);

Social: Aquisição do Imóvel para o ID 19 em Paracatu de baixo (Urbano).

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Grandes números do projeto

- 199 **famílias** atendidas;
- Construção de 71 casas iniciadas;
- Conclusão de 8 casas e 3 bens públicos (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde);
- **Projetos conceituais** concluídos para 165 casas, 21 lotes e 16 de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 164 casas, 21 lotes e 8 bens públicos;
- 146 **casas com projetos básicos e 21 lotes vagos** protocolados na prefeitura;
- **Alvarás** para 120 casas e 4 de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços, unidade básica de saúde) e 18 **licenças de autorização de construção** de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- **Projetos de contenção** concluídos para 133 casas e 14 lotes;
- **Projetos de fundação** concluídos para 151 casas.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**


### **Fatos relevantes do mês**

Termo de Adesão – 109 assinados para Edificações e 18 assinados para Lotes Vagos.

Alvarás Emitidos: Foram emitidos alvarás para 135 casas + 22 de lotes vagos + 04 Bens Coletivos. Há 15 casas com atendimentos interrompidos ou substituídos + 4 lotes vagos com atendimentos interrompidos ou substituídos.

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Grandes números do projeto

- 83 **famílias** atendidas;
- 6 **casas** em construção;
- **Projetos conceituais** concluídos para 64 casas, 3 lotes e 11 bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 64 casas, 3 lotes e 7 bens públicos;
- 39 **casas e 6 bens públicos com projetos básicos** protocolados na prefeitura;
- **Licenças simplificadas** emitidas para 23 edificações, 1 bem público (escola) e 2 lotes;
- **Projetos de fundação** concluídos para 54 casas e 5 bens públicos.
- 6 projetos conceituais concluídos para **casas em andamento**.
- 3 **lotes vagos** com projetos básicos protocolados na prefeitura.

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Termos de Adesão – 3 assinados para Edificações.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas para o ano de 2021**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Grandes números do projeto**

- 14 **famílias** atendidas.




## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Fatos relevantes do mês**

Aquisição de dois imóveis. (Por segredo de Justiça não será possível informar os nomes das Famílias).

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Entregas para o ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
  - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
  - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números do Familiar**

- 139 famílias atendidas;
- 59 imóveis adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
- 36 imóveis para construir;
- 19 imóveis para reformar;
- 4 lotes vagos a serem entregues;
- 43 projetos conceituais finalizados;
- 24 projetos para construção (Casa Nova);
- 15 projetos para reforma;
- Construção, 42 projetos básicos;
- Construção (Casa Nova), 23 licenças, alvarás/dispensa rural protocolados na Prefeitura ou não necessário;
- Lote Vago, 4 dispensas de licença emitidas ou não necessário;
- Reforma, 14 licenças/dispensas simplificadas protocolados na Prefeitura ou não necessário;
- Casa Nova, 11 licenças emitidas;
- Lote Vago, 3 licenças ou não protocolados na Prefeitura;
- Reforma, 7 licenças simplificadas emitidas;
- Gesteira: 23 famílias com acordo homologado;
- Gesteira: 5 imóveis adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números de Reconstruções**

- Comunidades rurais: 9 famílias na modalidade de Reconstruções;
- Comunidades rurais: 12 casas da modalidade de reconstrução;
- Comunidades rurais: 6 casas (edificação principal) da modalidade de reconstrução entregues.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Fatos relevantes do mês**

- PU: Vina – Conclusão do processo de contratação para execução de 06 reformas em área urbana, empresa em fase de mobilização.
- Engenharia: Protocolado o projeto (reforma) do ID83 na PMM, nº protocolo 1765/2021, em 08/04/21.
- Engenharia: Emissão de alvará de construção do ID NN.66 em 16/04/21.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Indicadores



Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

## PG009 Programa de Recuperação UHE Risoleta Neves – Candonga


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	150	§3º	Reprogramado
Cláusula	79	Caput	Judicializado
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

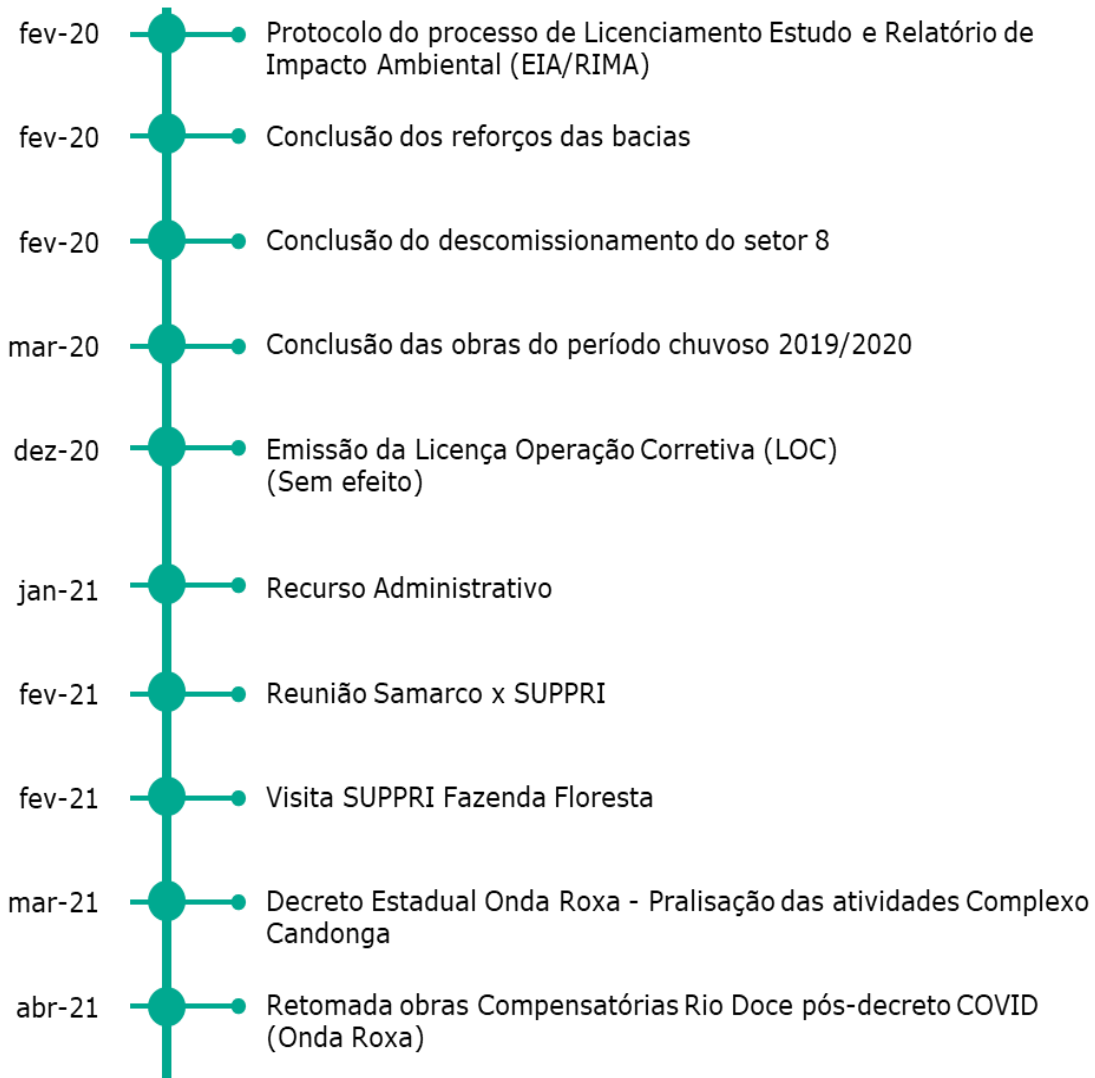



## **Grandes números do programa**

959 mil m<sup>3</sup> de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

## Fatos Relevantes

### Obras Preliminares Para Descomissionamento do Setor 4

- Conclusão da melhoria de acesso do Córrego dos Borges até o dique do setor 4;
- Execução de sistema temporário de condução das vazões do córrego dos Borges;



- Melhoria no acesso entre o Setor 4 e Setor 5;



- Sequência na abertura de acesso intermediário margem esquerda entre km 11 e o km 12;



- Avanço nas obras de abertura do acesso intermediário entre Setor 1 e Setor 4



- Em fase de finalização os projetos de engenharia para o Descomissionamento do Setor 4: Sistema temporário de condução de vazões do Córrego dos Borges, Passagem Molhada, Remoção do Dique do Setor 4, Remoção dos Sedimentos, Adequação definitiva do Córrego dos Borges e Proteção para restituição de vazão.
- Finalizado processo de contratação da empresa que executará as obras do pacote de Descomissionamento do Setor 4. Mobilização iniciada em 19/04/21.



## **REABILITAÇÃO da UHE - RISOLETA NEVES**

- Conclusão da limpeza da guia e soleira da comporta da tomada d'água UG2 e UG3.

- Conclusão da Limpeza da tubulação relativa ao sistema de resfriamento 12 e 14”;
- Realizada pintura da Caixa Espiral da UG1:



- Recuperação do vertedouro 1:



- Manutenções das comportas do vagão da tomada d'água:



- Processo de contratação dos serviços de limpeza do canal de fuga em andamento:
  - ✓ Equipe de mergulho: mobilização prevista para 15/05/21;
  - ✓ Equipe de limpeza por bombeamento (UG3, drenos e limpeza fina): em fase de contratação;

### Adendo ao Projeto Básico:

- Status das sondagens nas Galerias da UHE Risoleta Neves (necessárias à verificação das condições de estabilidade do barramento principal):
  - ✓ Avanço geral de 88,85%:

Dreno	Perfuração	Executada	Ensaio Perda d água	Avanço (Em %)
	estimada (metros)			
SRBP-501	41,50	41,50	13	100%
SRBP-502	39,50	39,50	11	100%
SRBP-503	31,50	31,50	10	100%
SRBP-505	42,30	42,30	14	100%
SRBP-504	38,1	35,90	12	100%
SRBP-507	38,2	38,31	14	100%
<b>SRBP-506</b>	<b>38,4</b>	<b>8,25</b>	<b>2</b>	<b>21%</b>
			<b>04/05/2021</b>	<b>88,85%</b>

- Status ensaios laboratoriais das amostras das Galerias da UHE Risoleta Neves:

### Ensaio de Laboratório

Grupo	Furos	Datas	Status
1º Grupo	502 e 505	19/abr	Concluído
2º Grupo	501 e 503	31/mai	Em execução
3º Grupo	504 506 e 507	30/jun	Não coletado

### Limpeza dos Drenos

Atividade	Datas	Status
9 Drenos do barramento		Em planejamento
2 Drenos da galeria do Vertedouro		Em planejamento

### Perfilagem

Atividade	Datas	Status
9 Drenos do barramento		Em planejamento
2 Drenos da galeria do Vertedouro		Em planejamento
8 Furos de Sondagem		Em planejamento

## Monitoramento Ambiental

### ➤ Monitoramento de Efluentes:

- Lançamento Bacia 1 - Monitoramento de efluentes de montante e de jusante Observados desvios de turbidez, provenientes do background do Rio Doce (não houve incidência de chuvas nos pluviômetros associados à Fazenda Floresta).
- Sistema fossa filtro: Sistema desativado.

### ➤ Monitoramento de Ar

- Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidade de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venha ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Se ocorrer a ultrapassagem do limite permitido, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR.
- Para garantir a qualidade do ar nessas comunidades é realizada umectação periódica nas vias, controlada por rotograma, bem como a limpeza com caminhão vassoura.



- **Monitoramento de Fumaça Preta:** Todas as áreas da Samarco e contratadas, responsáveis pela operação de equipamentos e veículos a diesel, realizam o monitoramento periódico de emissão de fumaça preta através do Opacímetro. A periodicidade do monitoramento é semestral após a data de mobilização do veículo/equipamento. Em caso de identificação de desvios fora dos parâmetros é realizada correção através de manutenção dos equipamentos que apresentarem falha. Na eventualidade de ocorrência futura, essa será relatada nesse relatório.
- **Monitoramento Hídrico Superficial:** Foi realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe, e foram identificados desvios correspondentes a elementos naturais (background) da região. Monitoramento hídrico realizado no córrego Micaela apontou distorções na medição de PH e turbidez, provavelmente ligados à dinâmica do curso d'água e chuvas no período. Previstos estudos para investigação das causas dos desvios identificados.

## Relacionamento Socioinstitucional

No mês de março de 2021, foi instituído o Canal de Comunicação para o Projeto Candonga, a central de relacionamento, que objetiva receber solicitações de informações, reclamações e sugestões, pode ser acessada por meio do telefone 08000338485, e-mail [relacionamento@samarco.com](mailto:relacionamento@samarco.com) ou site [www.samarco.com/fale-conosco](http://www.samarco.com/fale-conosco)

- O Canal de Comunicação receberá todos os tipos de demandas, inclusive sobre ruídos e vibrações. Ressalta-se que até o momento não houve registros desta natureza.



- Com o intuito de reforçar o compromisso da Samarco em relação às obras em andamento no município de Rio Doce, a equipe de Relações Socioinstitucionais do Projeto Candonga aderiu a uma nova metodologia de diálogo que consiste em:

- ✓ Visitar os moradores;
- ✓ Informar sobre a metodologia da obra;
- ✓ Informar sobre acessos possíveis e seguros durante a execução;
- ✓ Informar sobre as intervenções que serão feitas;
- ✓ Informar e disponibilizar o Canal de Diálogo da Samarco





- Divulgação da Central de Relacionamento da Samarco via spot, nas principais emissoras de rádio que atuam nos municípios da AID (Área de Influência Direta) da Samarco, totalizando 312 inserções. No território do Projeto Candonga totalizaram-se 02 inserções nas rádios locais que cobrem a área de influência do projeto, sendo os mesmos no município de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova.


### **Licenciamento Ambiental**

- 05/04/2021: Protocolo do ofício GMA-C 206/2021, comunicando o descomissionamento do Dique Setor 4;
- 05/04/2021: Protocolo do ofício GMA-C 207/2021, em atendimento ao ofício FEAM/NUBAR nº 52/2021 e comunicando o descomissionamento do Dique Setor 4;
- 09/04/2021: Protocolado do ofício GMA-C-216/2021 com comunicação de intervenção ambiental para contenção de processos erosivos ao longo do acesso para Santana do Deserto;
- 15/04/2021: Protocolo do ofício GMA-G 230/2021, apresentando a declaração do arqueólogo acerca dos potenciais impactos ao patrimônio arqueológico no âmbito do empreendimento em questão;
- 15/04/2021: Protocolo do ofício GMA-C 238/2021, evidenciando o cumprimento das obrigações do TAC Fazenda Floresta (Item 20 do TAC);
- 16/04/2021: Publicado parecer da SUPPRI sobre o recurso administrativo indeferindo 100% dos pedidos feitos;
- 22/04/2021: Protocolo das informações complementares referente a CONAMA 454/2012;


- 28/04/2021: O recurso administrativo foi pautado na CNR. Ocorreram pedidos de vista pela FIEMG, FIEMG – Micro/pequenas empresas, FAEMG, IBRAM, CREA e MPMG;
- 29/04/2021: A SUPPRI emitiu o ofício SEMAD/SUPPRI/DAT nº 104/2021 aprovando o plano de amostragem para dragagem;
- 30/04/2021: Encaminhado via e-mail os estudos ambientais à Prefeitura Municipal de Rio Doce para que seja providenciado o licenciamento da ETE de Santana do Deserto.

## Indicadores


Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas.

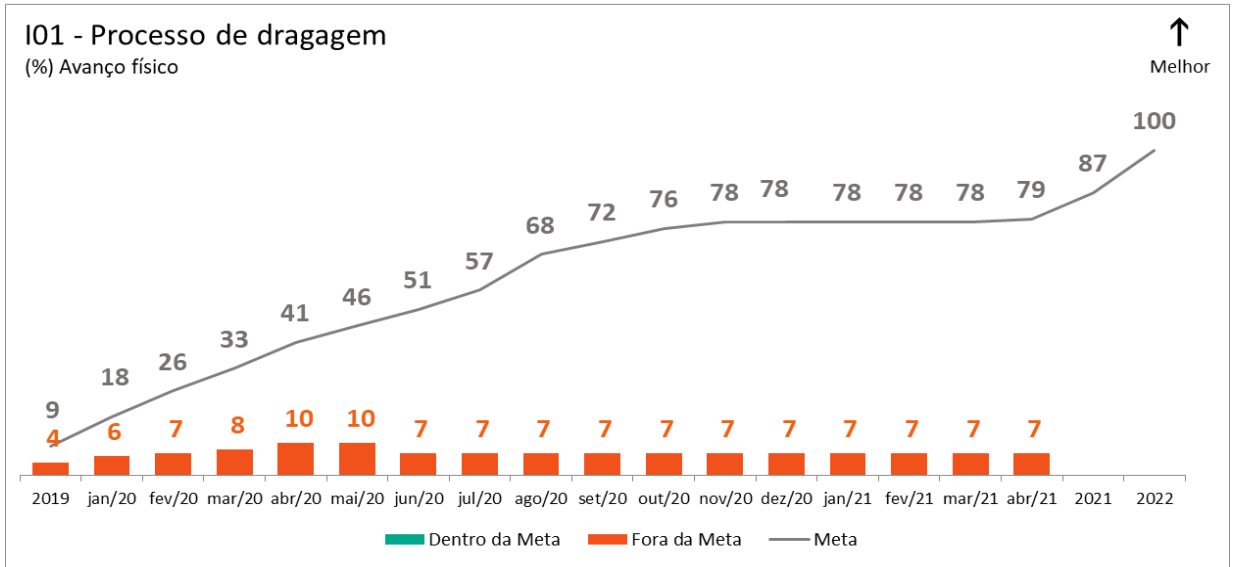


**Gráfico 1.** Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

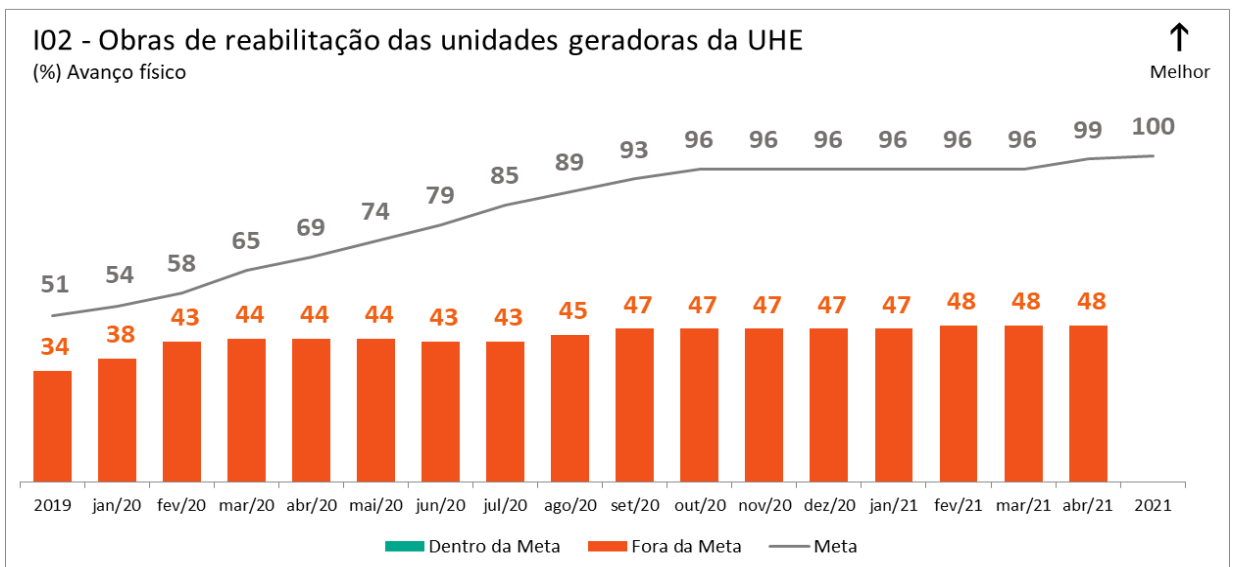

**Gráfico 2.** Avanço físico das obras de recuperação das Unidades Geradoras da UHE.

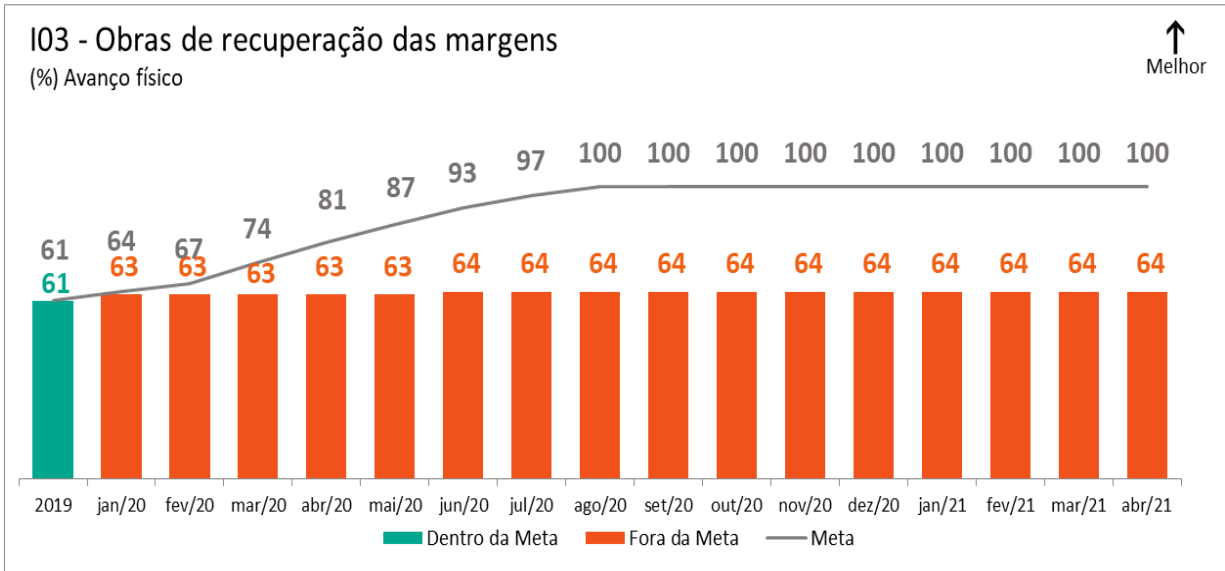

**Gráfico 3.** Avanço físico das obras de recuperação de margens.

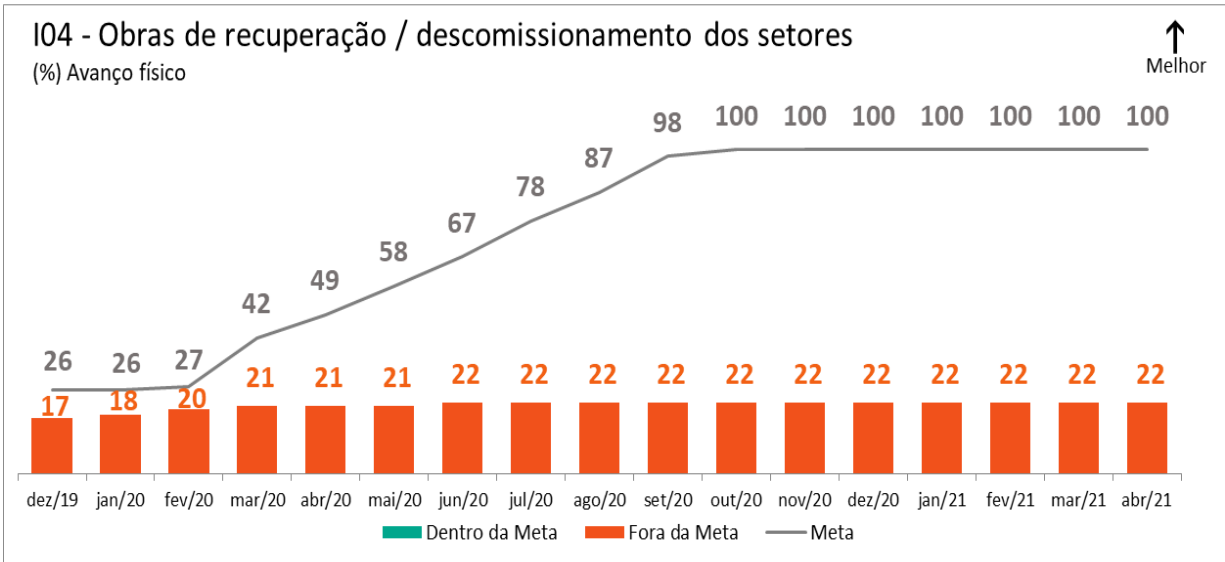

**Gráfico 4.** Avanço físico das obras de reabilitação/ descomissionamento dos setores.

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

| Cláusula

82

caput

Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Concluído Internamente
Deliberação	217	3	Concluído Internamente
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

## Grandes números do programa

### **1618 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total:**

- **904** correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1602,66Km de manutenções realizadas, 142,20km de acessos recuperados e 209km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- **103** correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- **15** correspondem a Casas reconstruídas;
- **28** correspondem a Comércio reformados;
- **163** correspondem a Quintais e lotes reformados.

### **Barra Longa:**

- Residências e Propriedades recuperadas: 100
- Casas reconstruídas: 8
- Comércio reformados: 27
- Quintais e lotes reformados: 163

### **Mariana:**

- Residências e Propriedades recuperadas: 3
- Casas reconstruídas: 7
- Comércio reformados: 1
- Quintais e lotes reformados: 0

## **Fatos relevantes do mês**

Iniciado o rito de Gestão de Mudanças para adequação do cronograma vigente às alterações de escopo do programa e posterior definição de nova linha de base.

Atendimento às demandas de restauro em obras compensatórias e recuperação de memória histórica, cultural e artística do município de Barra Longa

- Atraso na liberação do escopo de reforma de moradia devido ao processo de Judicialização;
- Realizadas as primeiras cinco vistorias pelos representantes da ACP em 26/04/2021
- Possíveis problemas com os moradores na autorização para acesso as residências para realização das atividades, devido ao COVID-19;



## Indicadores

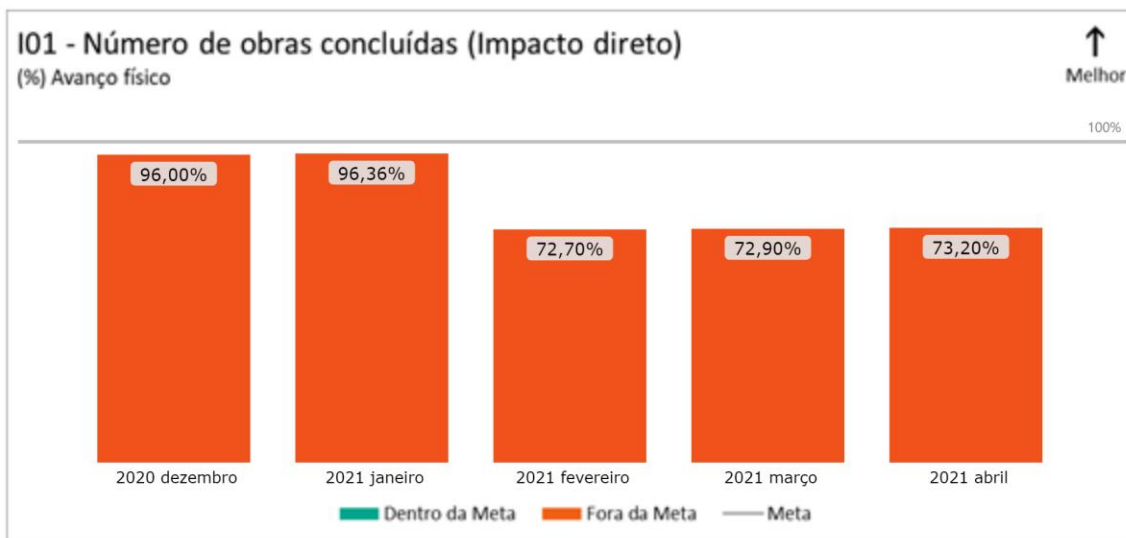


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

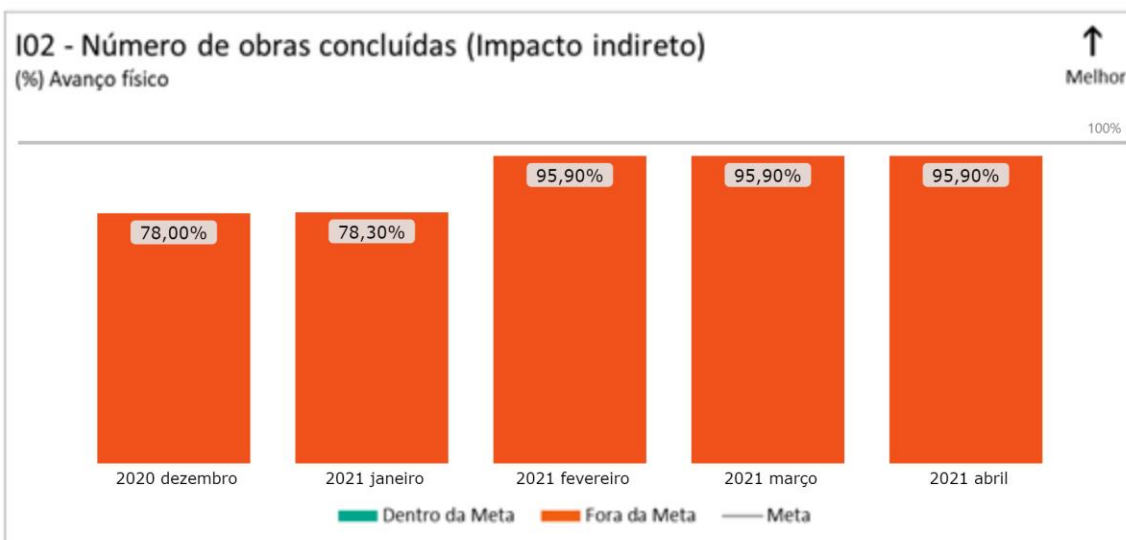


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

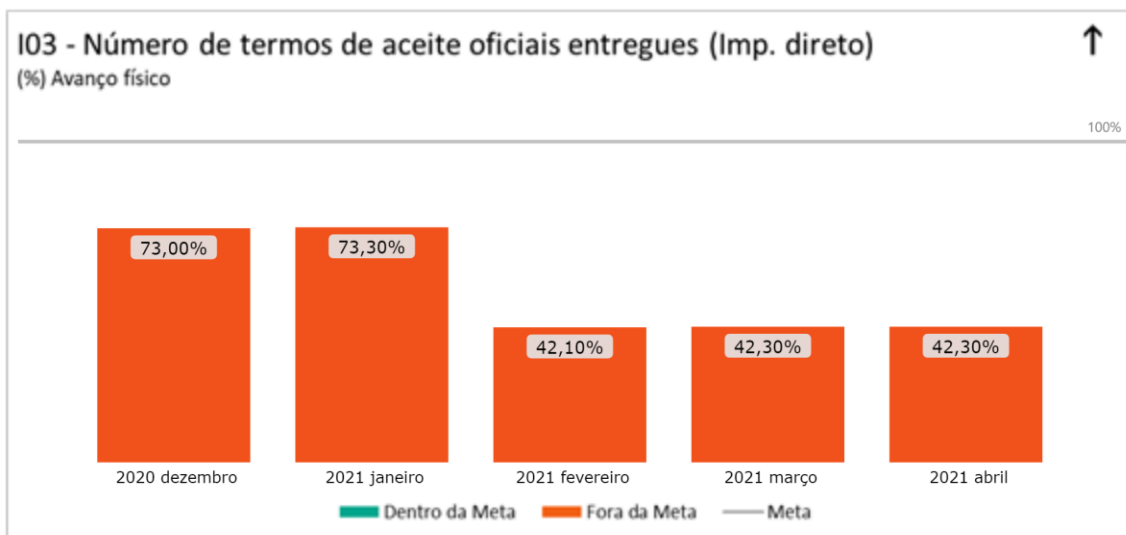


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

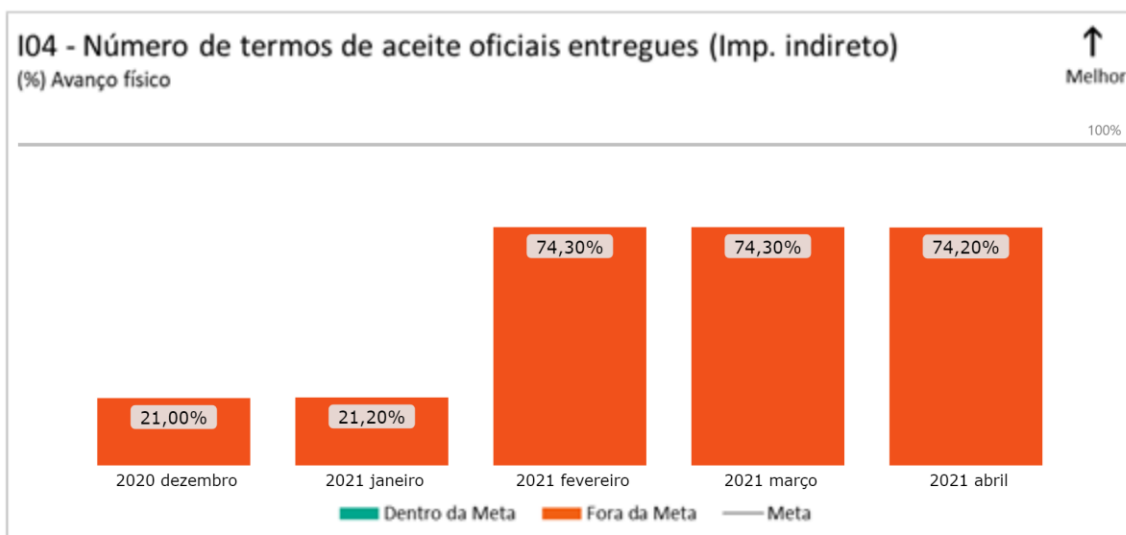


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

## **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**


### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
  - dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
  - dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana e Barra longa
  - dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números para reportar no momento em função da COVID-19.

## **Fatos relevantes do mês**

Elaboração da proposta da revisão dos indicadores e apresentação para a CTECLET.

Processo de Gestão de Mudança finalizado. Entrega do cronograma revisado refletindo a realidade atual do PG.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I1</b>	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%
<b>I2</b>	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%
<b>I3</b>	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%
<b>I4</b>	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%
<b>I5</b>	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%
<b>I6</b>	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2021

July de 2021	●	Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
August de 2021	●	Início das ações de reparação das Referências Culturais
August de 2021	●	Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
November de 2021	●	Publicação do Diagnóstico de Referências Culturais
December de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário esportivo
December de 2021	●	Início das ações de reparação dos Bens Arqueológicos
December de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
December de 2021	●	Finalização da confecção de projetos na Reserva Técnica
December de 2021	●	Oficinas sobre Educação Patrimonial
December de 2021	●	Restauração de 200 peças na Reserva Técnica

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Processo de Gestão de Mudança finalizado. Entrega do cronograma revisado refletindo a realidade atual do programa.

## Indicadores




Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado

\* Manifestações culturais paralisadas devido ao COVID-19.

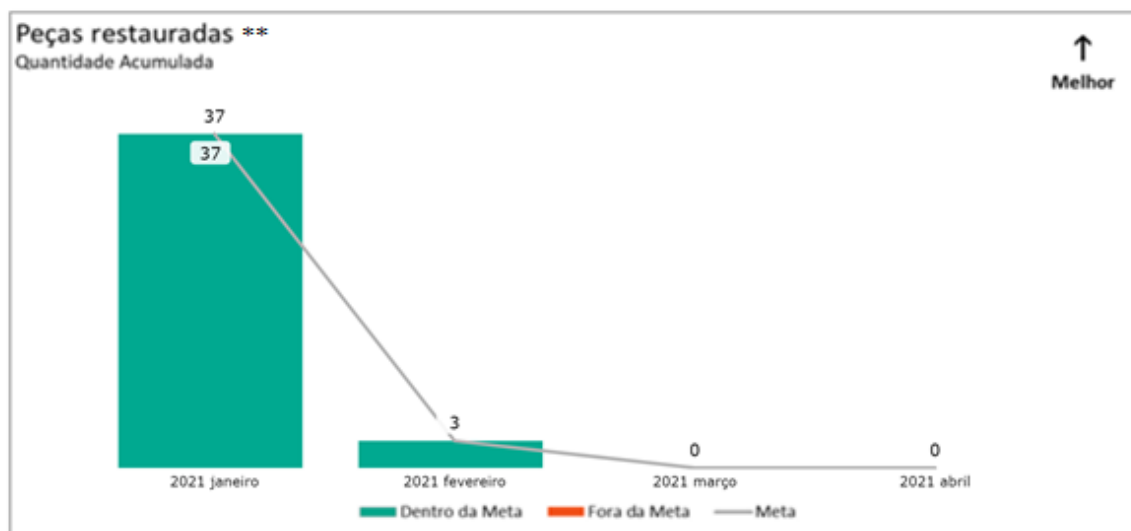


Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado

\*\* Indicador sem evolução devido a ausência de projetos de restauro aprovados pelo IEPHA.

## PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente

Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- May de 2021 ● Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- October de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- December de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.



## **Fatos relevantes do mês**

Processo de Gestão de Mudança finalizado. Entrega do cronograma revisado de acordo com a EAC do projeto.

Início das reuniões de mobilização com o empresariado de Mariana visando a viabilização de um arranjo produtivo local para o desenvolvimento turístico (Moore) e continuidade em Marliéria.

Encerramento das inscrições para o Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

### Eixo Pessoas e Comunidades


#### Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente

Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

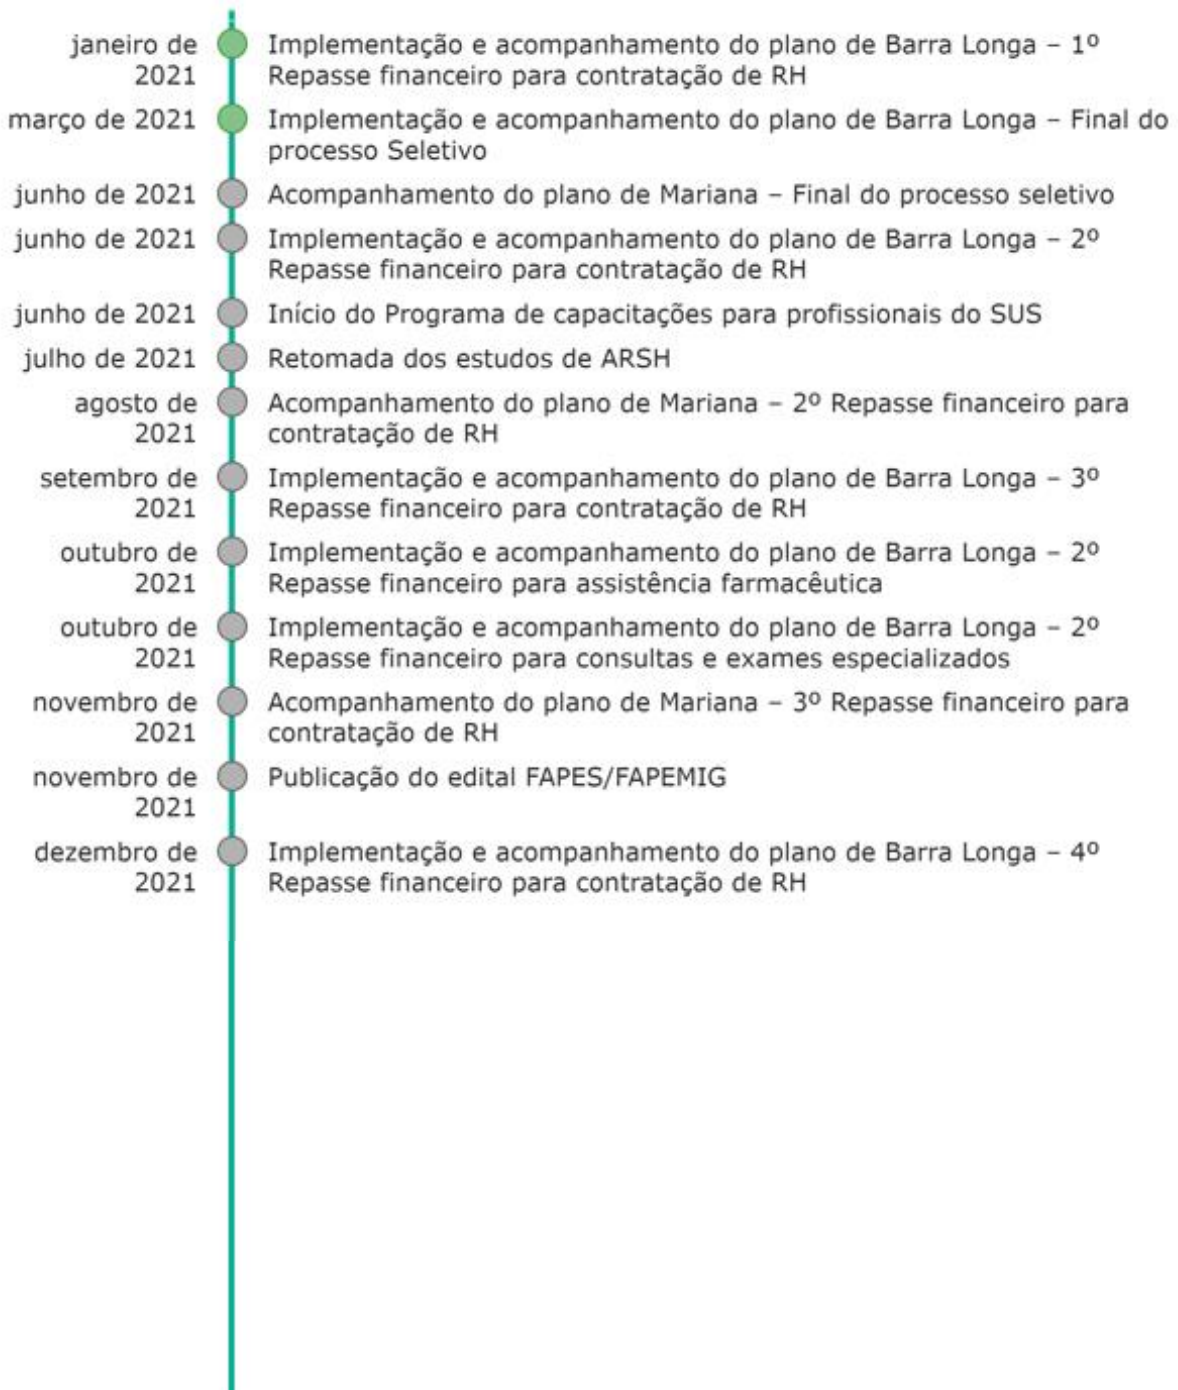

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Durante os sete primeiros meses de vigência do Acordo (setembro/20 a março/21), a Secretaria de Saúde de Barra Longa reportou que foram realizados 3.816 atendimentos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 atendimentos por mês.

A Secretaria de Saúde, reportou que neste período foram realizados 1528 procedimentos médicos, com média de 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e 567 atendimentos pela profissional psicóloga no período de seis meses. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção Sanitária em estabelecimentos Comerciais, dentre outras.

## **Grandes números do programa**

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos.

### **Mariana**

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, o Município de Mariana conta com a suplementação de 20 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

## **Grandes números do programa**

- problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

### **Mariana – Saúde (20 profissionais atuando pela Contexto no dia 15 de abril/21):**

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;

Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 8 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 3 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 no Conviver e 1 no CAPSij.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando reforçar o trabalho das áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.



## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## PG015 Promoção da Inovação

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Cláusula	114	Item A	Em Andamento
Cláusula	114	Item B	Em Andamento
Cláusula	115	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	Item 1	Concluído Internamente
Deliberação	126	Item 2	Concluído Internamente
Deliberação	126	Item 3	Concluído Internamente
Deliberação	137	Item 1	Em Andamento
Deliberação	170	Item 1	Em Andamento
Deliberação	31	Item A	Concluído Internamente
Deliberação	338	Item 1	Concluído Internamente
Deliberação	463	Caput	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

- maio de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
- junho de 2021 ● Início da execução do projeto de pesquisa para desenvolvimento e registro de herbicida orgânico
- julho de 2021 ● Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
- agosto de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
- setembro de 2021 ● Início do Projeto Empreende Rio Doce
- outubro de 2021 ● Lançamento da Chamada do Programa de Incentivo à Inovação
- dezembro de 2021 ● Homologação do resultado final da chamada de Agroecologia e Produção Orgânica do ES
- dezembro de 2021 ● Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo Pessoas e comunidade**

#### **Objetivo**

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do “Pescador de Fato” ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.



Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Pendente
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	caput	Pendente
Cláusula	121	caput	Pendente
Cláusula	122	caput	Pendente
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121		Concluído Internamente
Deliberação	480		Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

junho de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
agosto de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - yEntrega do Book do Município de Linhares
setembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
setembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Book do Município de São Mateus
outubro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
outubro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Book do Município de Bugre
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial I - Foz do Rio Deoce - Litoral
dezembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG ( 107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES ( 87 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA e APAP no ES ( 98 beneficiários );
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 163 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 04/2021 ; aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar.

Nota: Grandes número apresentados de forma acumulada. Devido as restrições da pandemia do COVID não estamos realizando atividades em Campo.

## **Fatos relevantes do mês**

Início da revisão do programa na Câmara Técnica de Economia e Inovação (CTEI).

## Indicadores

#	Indicador	Meta	Prazo	Status
I01	Percentual de pescadores(as) /aicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

## PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	124	caput	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- outubro de 2021 ● Cursos de capacitação da EMATER concluídos
  - dezembro de 2021 ● Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 188 são PASEA planejados sendo que 184 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 14 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 148 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA),<sup>34</sup> não aderiram e 2 estão em análise pelo produtor;
- 50,1 Mil toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 681,5 toneladas no mês;
- 5.575,2 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 437 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 852 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.757 hectares de reestruturação produtiva executados.



## **Médio Rio Doce**

- 2.906 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 5.415 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 23.048 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 2.013 toneladas no mês.

## **Baixo Rio Doce**

- 1.005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 2.526 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 190 toneladas no mês.

## **Parcerias**

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Não houve fatos relevantes no mês.

### **Baixo Rio Doce**

Paralisação das atividades em 29/03, com a saída das equipes de campo em função da pandemia.

### **Médio Rio Doce**

Permanência da paralisação parcial das contratadas de ATER/ATES, em virtude da pandemia do COVID 19.

## Indicadores

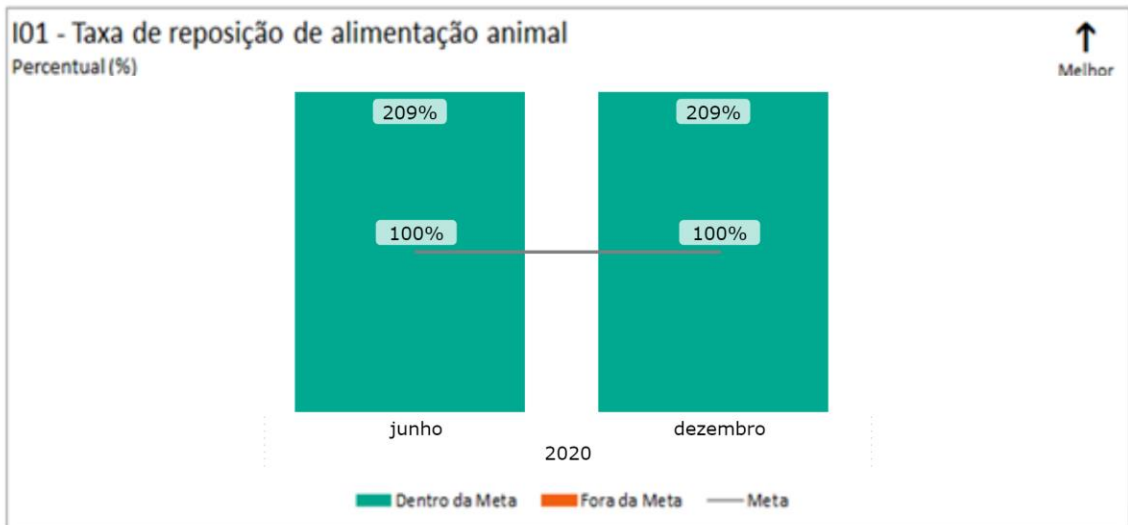


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$N^{\circ}$ de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / $n^{\circ}$ de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$N^{\circ}$ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

## PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica


### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130		Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- January de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
  - May de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG
  - September de 2021 ● Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF
  - December de 2021 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 53.61 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 44 milhões foram **desembolsados** para 1341 contratos e 1067 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 10 milhões foram **desembolsados** para 404 contratos e 394 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 220 contratos e 127 empresas.



## **Fatos relevantes do mês**

Veiculação dos vídeos de casos de sucesso do Promoção de Negócios Coletivos e Individuais, em parceria com a Brazil Foundation.

Recomendação por parte da CT-EI de aprovação do projeto Distrito Empresarial.

## Indicadores

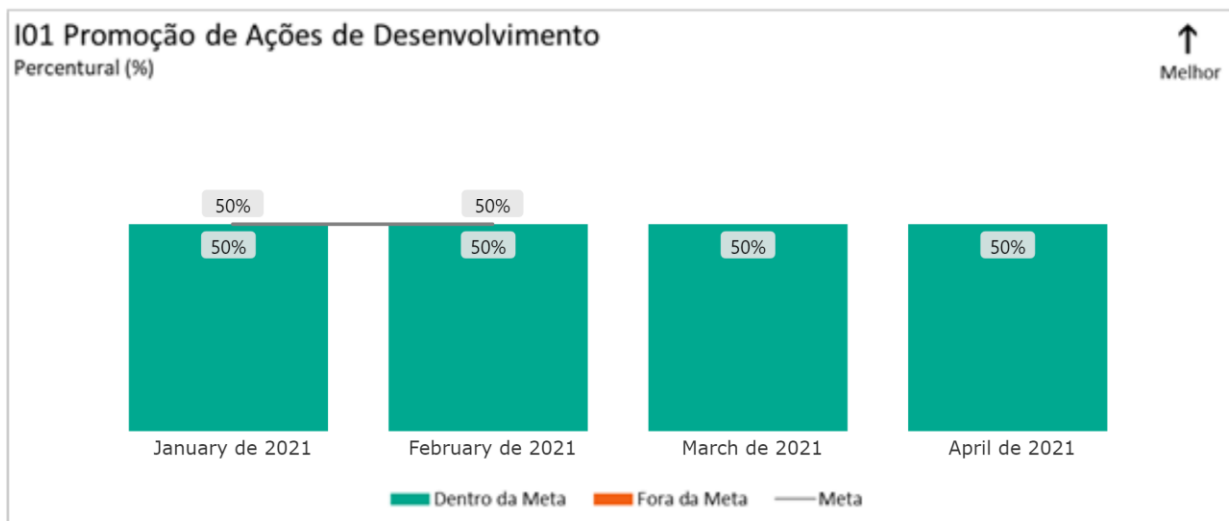


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Gráfico Acumulado

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	Item 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG
- dezembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 211 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis** e 170 o número de **reposições de equipamentos e insumos**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo ( 396 ) ultrapassa a quantidade total de atendidos ( 321 ). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em maio/21.

<sup>1</sup> A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

<sup>2</sup> O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

<sup>3</sup> O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em maio/21.

## PG020 Estímulo à Contratação Local

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
- julho de 2021 ● Conclusão do projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
- julho de 2021 ● Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019 de Candonga
- julho de 2021 ● Incio do 2º Ciclo do Projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - ES
- julho de 2021 ● Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
- julho de 2021 ● Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana/MG
- setembro de 2021 ● Conclusão de 2 turmas de capacitação
- outubro de 2021 ● Conclusão de 3 turmas de capacitação

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 132 turmas ofertadas, abertura de 3.705 vagas, 9.175 pessoas matriculadas, 3.257 concluintes, 1.474 reprovados e 2.587 evadidos.
- **R\$ 1.540.718** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

## **Fatos relevantes do mês**

Realizado curso on-line de “Segurança Alimentar”, com 34 vagas ofertadas, 33 matriculados e 17 aprovados.

Realização de dois workshops online, participação de 31 pessoas, em que foram abordados objetivos profissionais, elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego.

Lançamento do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais, com 133 participantes.

## Indicadores

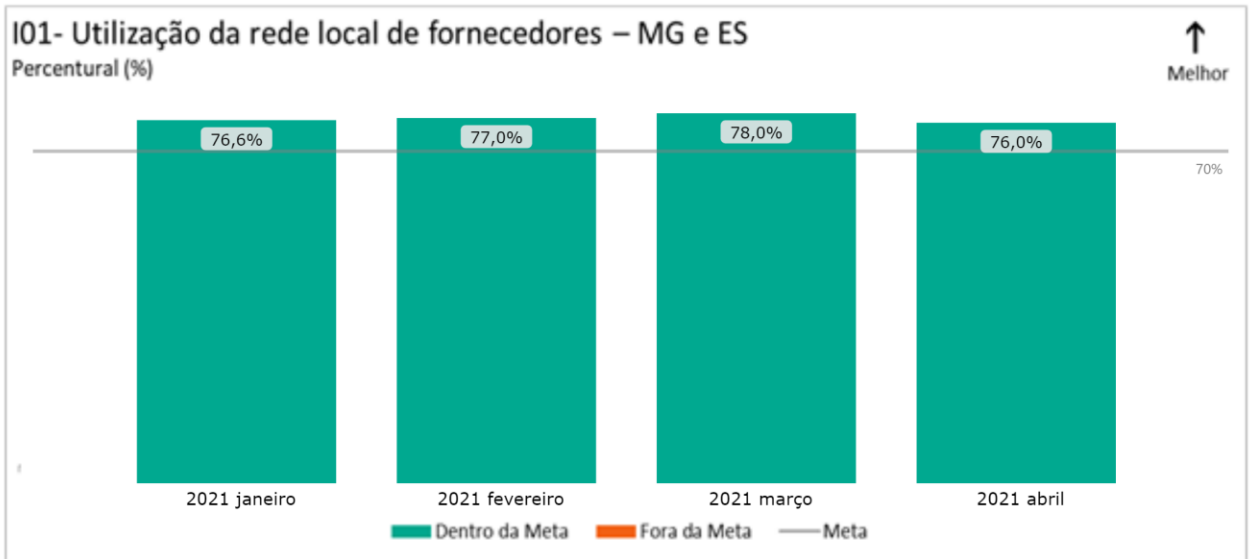


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado  
Data de corte 22/04/2021

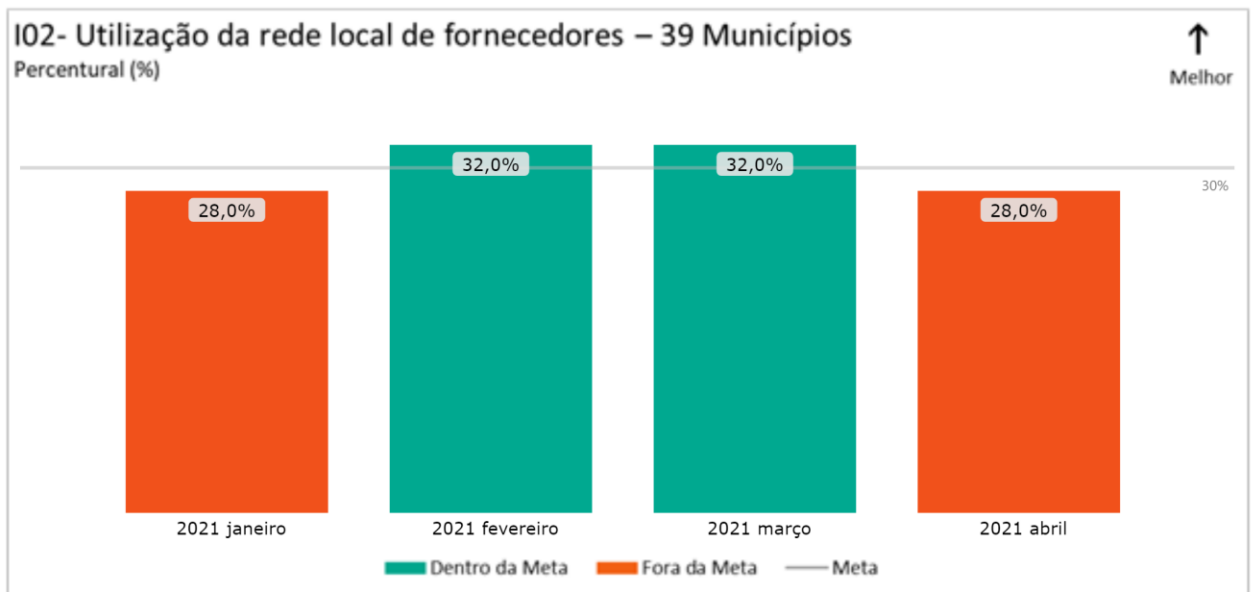


Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Gráfico Mensal  
Data de corte 22/04/2021

### I03- Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual (%)

↑  
Melhor

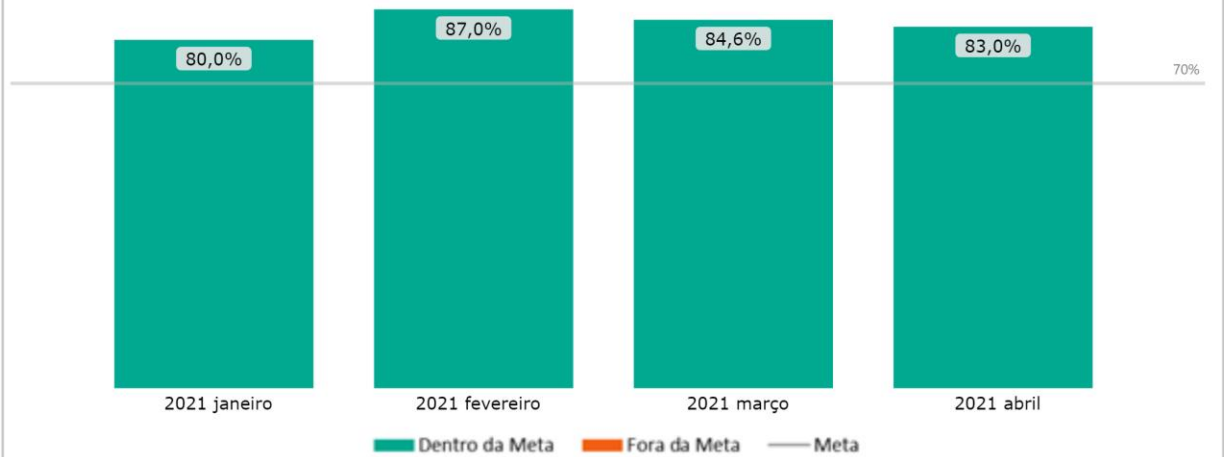


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado

### I04- Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Percentual (%)

↑  
Melhor

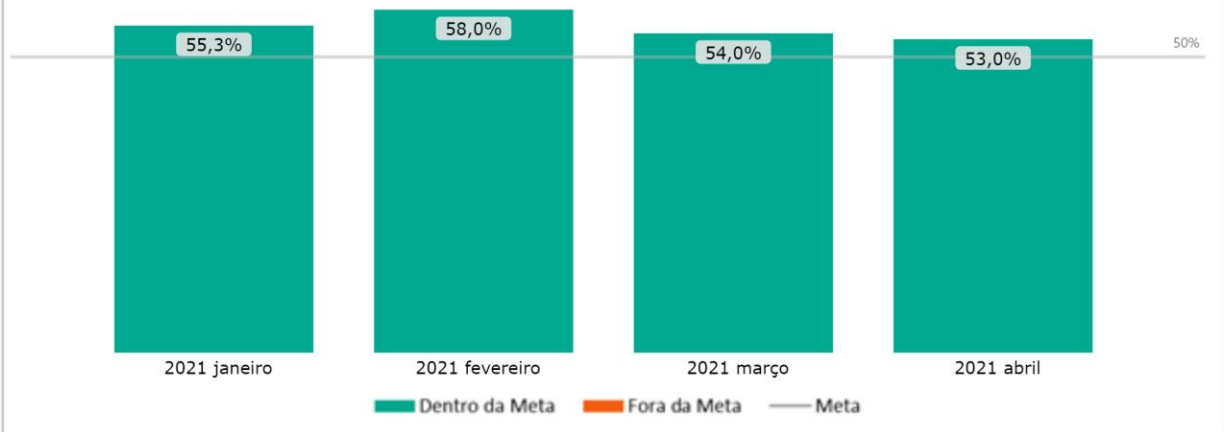


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado

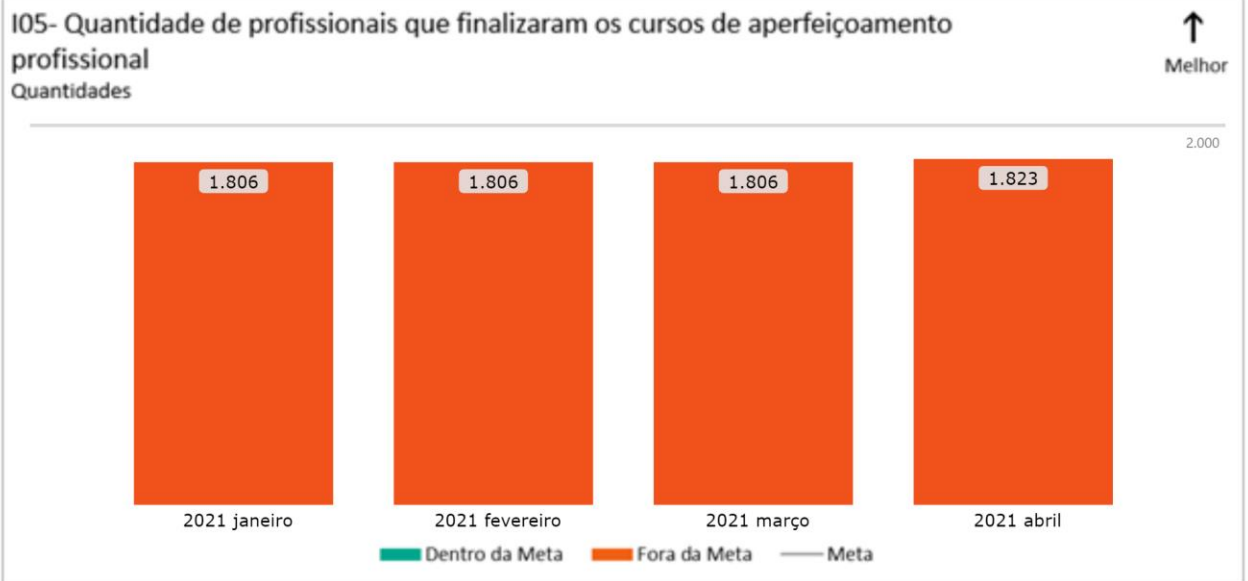


Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado

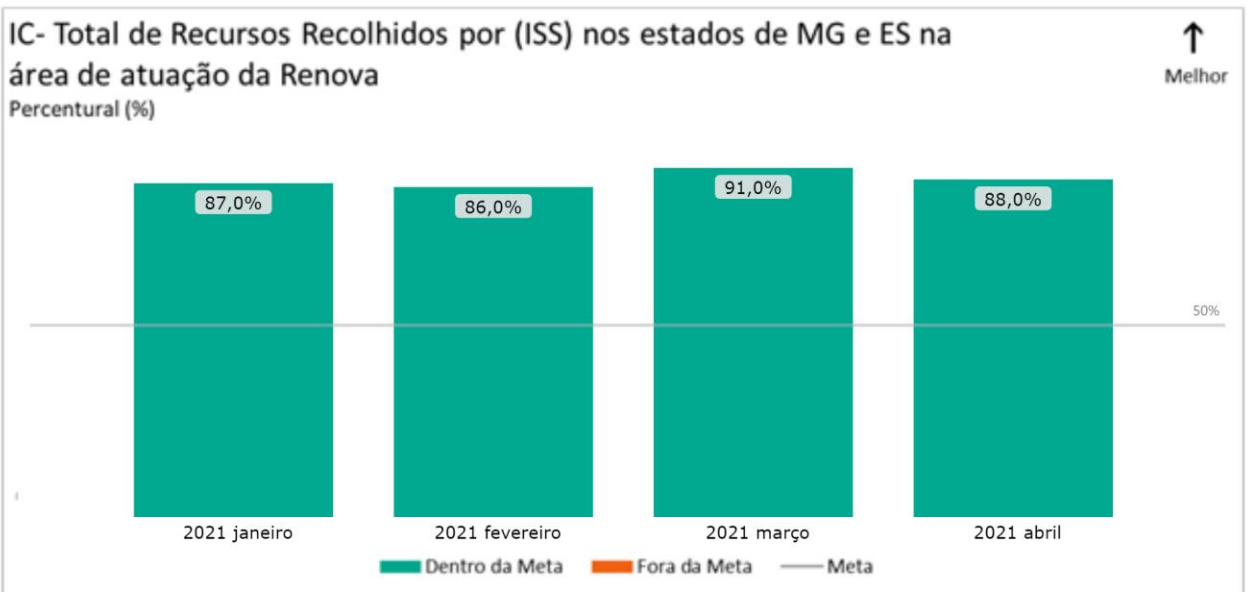


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Gráfico Acumulado

Data de corte 30/04/2021

\*Valor sujeito a alterações

## PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Em Andamento
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Concluído Internamente

Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente



## Grandes números do programa

- Atualmente há 11.109 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes ( 13.259 ), são 24.368 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.582,5 milhões**.

## Fatos relevantes do mês

- Inclusão de 06 auxílios;
- Exclusão de 1.996 auxílios.
- Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

## Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

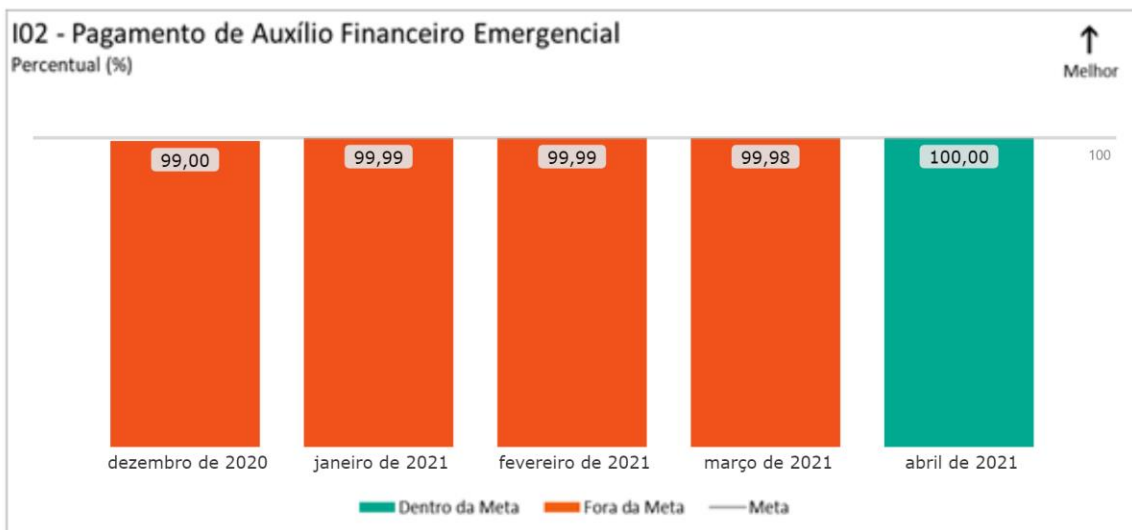


Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

## PG023 Manejo de Rejeitos

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Pendente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Em Andamento

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
abril de 2021	●	Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
maio de 2021	●	Consolidação do 1º relatório anual de estudos da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
junho de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
setembro de 2021	●	Mobilização da equipe que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
setembro de 2021	●	Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
novembro de 2021	●	Conclusão do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14
dezembro de 2021	●	Conclusão da execução do plano de controle de emissões atmosféricas

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Publicação na Revista Galileu do Estudo dos processos fluviais (Fase II) elaborado pela Rhama, por meio do Professor Carlos Tucci, em 08 de abril de 2021.

Protocolo do relatório referente aos resultados do 1º trimestre da rede automática de monitoramento da qualidade do ar (estações fixas).

Protocolo da Fase 3 dos Estudos do Balanço de Massa e Transporte de Sedimentos (atendimento ao item 2.1, Eixo 6 da ACP), em 30 de abril de 2021.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- April de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- July de 2021 Conclusão do monitoramento terrestre executado pela empresa Golder
- October de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Ponte Nova - 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Rio Doce - 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Santa Cruz do Escalvado- 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

## **Fatos relevantes do mês**

Estratégica: Aprovação das definições do programa no âmbito do Comitê Interfederativo através da deliberação CIF 491.

Alto: Restauro florestal em área impactada em todos os municípios finalizado.

Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Alto: Acumulado de 579 hectares implantadas de áreas passíveis de restauração florestal.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I02</b>	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I03</b>	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
<b>I04</b>	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
<b>I05</b>	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
<b>I06</b>	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I07</b>	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
<b>I08</b>	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%



## PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo












Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Cláusula	161	Caput	Em Andamento
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
maio de 2021		Realização do kickoff com CEFORMA que implantará restauro florestal nos Assentamentos (ES) no ano 02 (2020/2021)
maio de 2021		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
junho de 2021		Conclusão da elaboração do 2ª versão do Plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
julho de 2021		Desenvolvimento de software para gestão e acompanhamento da produção de sementes da rede (objetivo específico 13)
outubro de 2021		Entrega dos programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce (objetivo específico 13)
outubro de 2021		Conclusão do engajamento nos Assentamentos (ES) no ano 02 (2020/2021)
novembro de 2021		Elaboração do plano de monitoramento da produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Doce (objetivo específico 6)
novembro de 2021		Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
dezembro de 2021		Desenvolvimento dos processos e sistemas para a precificação das sementes produzidas (objetivo específico 7)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Não houve fatos relevantes no mês.

### **Baixo Rio Doce**

Paralisação das atividades no período 29/03 até 28/04 em função da pandemia.

### **Médio Rio Doce**

Permanência da paralisação das atividades devido ao Covid.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

maio de 2021	●	Implantação dos serviços da NBL Engenharia Ambiental EIRELI EPP - Bioflora realizada
setembro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia do Rio EME no ano 04 (2019/2020)
outubro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
novembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
dezembro de 2021	●	Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2021	●	Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Alto Rio Doce**

Não houve fatos relevantes no mês.

### **Baixo Rio Doce**

Paralisação das atividades no período 29/03 até 28/04 em função da pandemia.

### **Médio Rio Doce**

Permanência da paralisação das atividades devido ao Covid.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Pendente
Cláusula	166	§2º	Planejado

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	5	Planejado
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente










| Deliberação

450

2

Judicializado

## Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
julho de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
setembro de 2021		Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
setembro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
setembro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
setembro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
setembro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

Obs.: As entregas referentes à Realização de coletas de amostras para o Monitoramento das Linha Temáticas I, II, III, V e VI sofreram impacto nas datas devido às restrições da pandemia.

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.



## **Fatos relevantes do mês**

Em 08/04/2021, foi protocolada a versão final do documento de Proposta do Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática do rio Doce em atendimento à Nota Técnica nº 01/2021/CTBio/DIBIO/ICMBio, referente à alínea "c" da Cláusula 164.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Cláusula	167	caput	Em Andamento
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico ES
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

### Eixo Terra e Água



#### Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2021

- fevereiro de 2021  Protocolo do Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
- setembro de 2021  Finalização das amostragens em campo do monitoramento da Fauna Terrestre, realizada em período seco

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## **Fatos relevantes do mês**

Emissão da Nota Técnica nº 3/2021 que aprova a Proposta de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, com sugestões de alteração que necessitam de esclarecimentos.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**


### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente
Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- 
- mai-21 Conclusão do repasse do recurso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE, de Colatina.
  - mai-21 Conclusão do repasse do pleito RICESOB05 - Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços), de Rio Casca.
  - out-21 Conclusão do repasse do pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal.
  - nov-21 Conclusão do repasse do pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14, de Sem-Peixe.

## Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ R\$ 22.670.331,12 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Aimorés/MG, Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga);
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica realizou **1.937** visitas e/ou reuniões de **apoio técnico aos municípios**.




## **Fatos Relevantes**


- No dia 01/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 8.332,69, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;
- No dia 16/04/21 , foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 79.206,74, referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;
- No dia 26/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 45.629,22, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Matadouro;
- No dia 27/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 60.227,99, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge;
- No dia 30/04/21 , foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 150.555,11, referente ao pleito da complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14.

## Indicadores


Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.

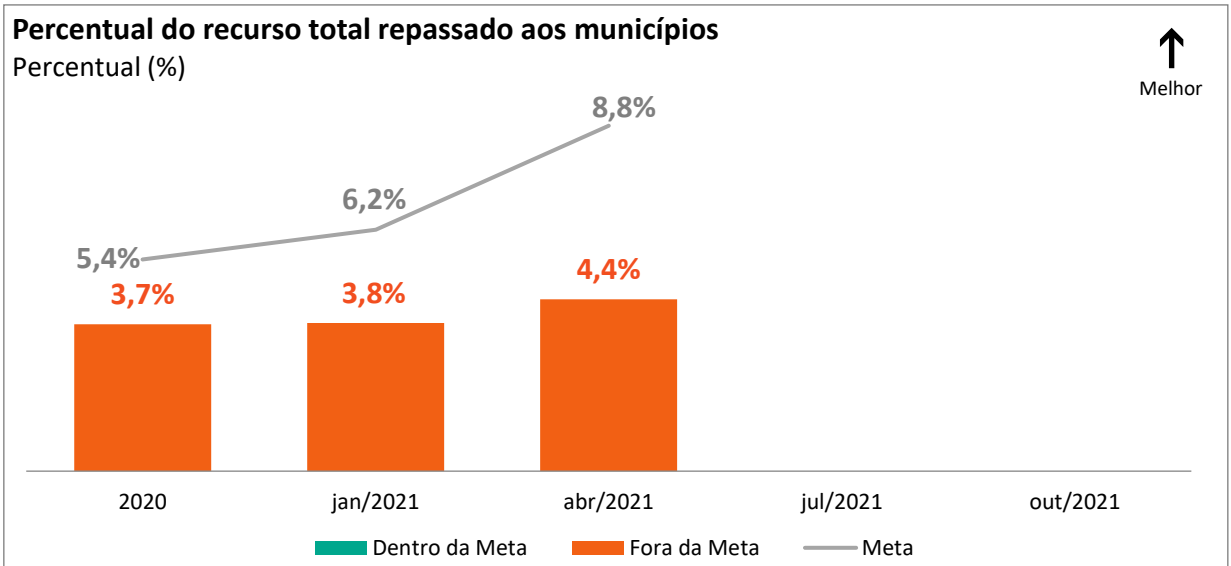


**Gráfico 1.** Percentual do recurso repassado.

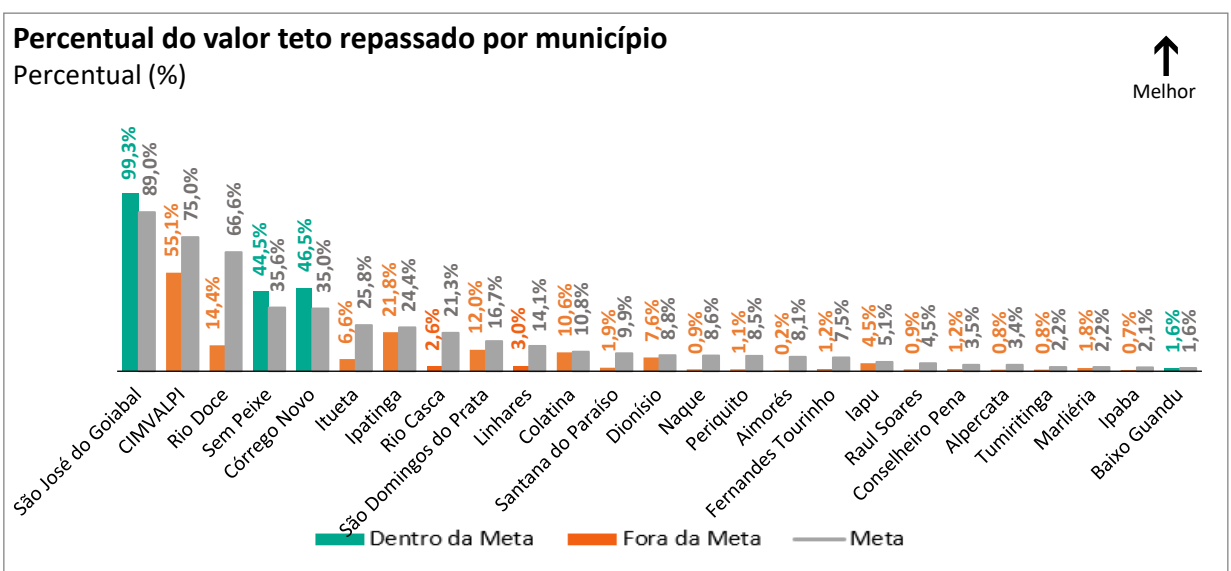

**Gráfico 2.** Percentual do valor teto repassado, por município.

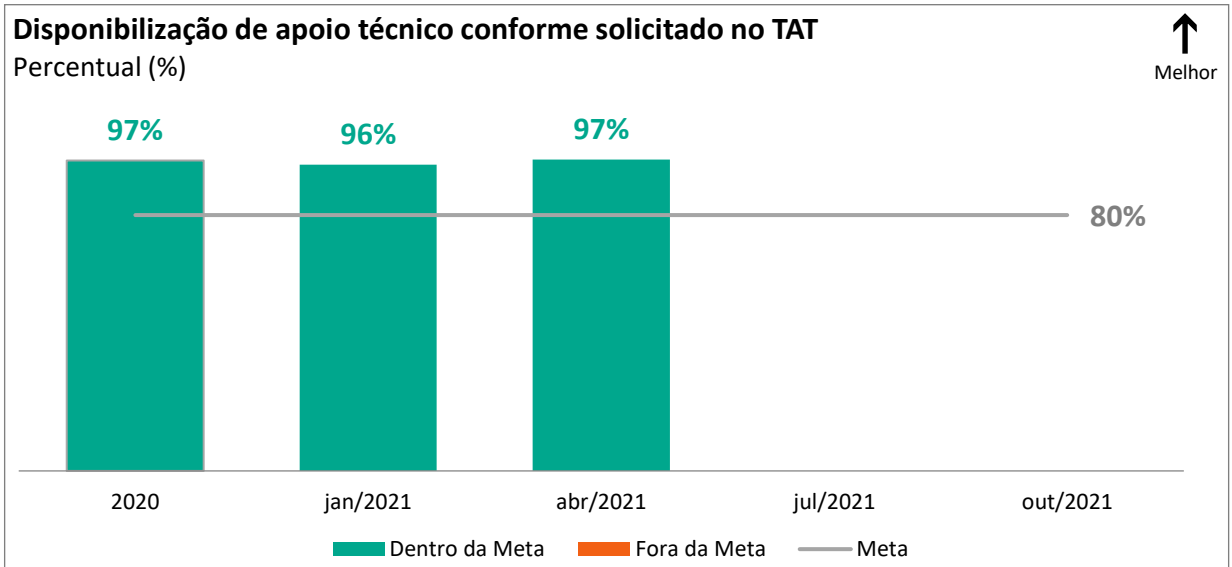

**Gráfico 3.** Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

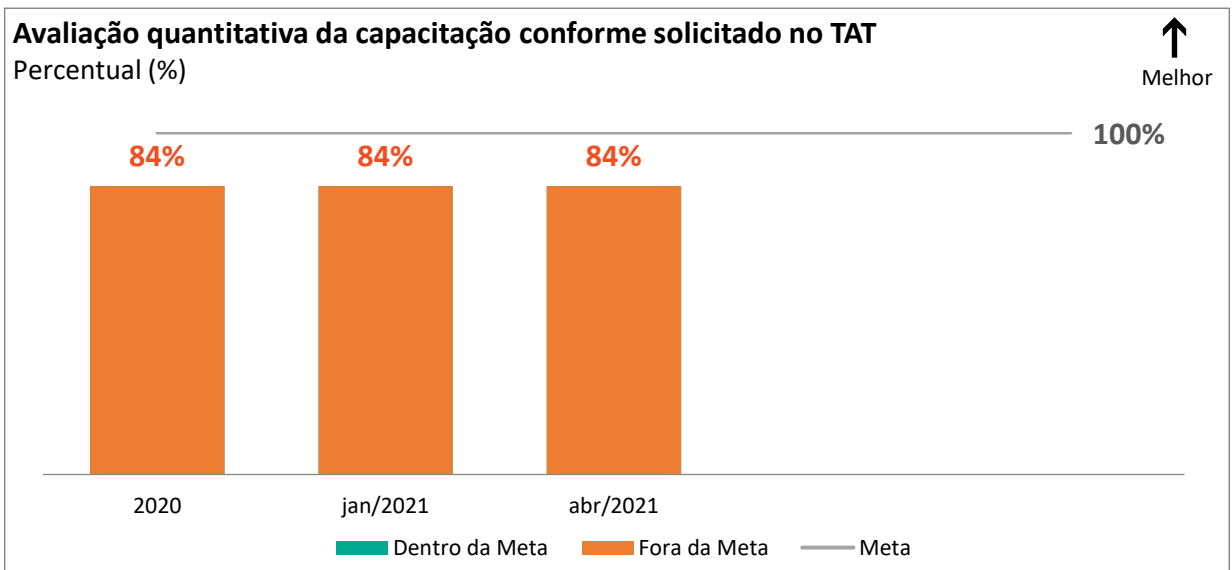


**Gráfico 4.** Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.

### Repasse de recurso financeiro aos municípios

Percentual (%)

↑  
Melhor

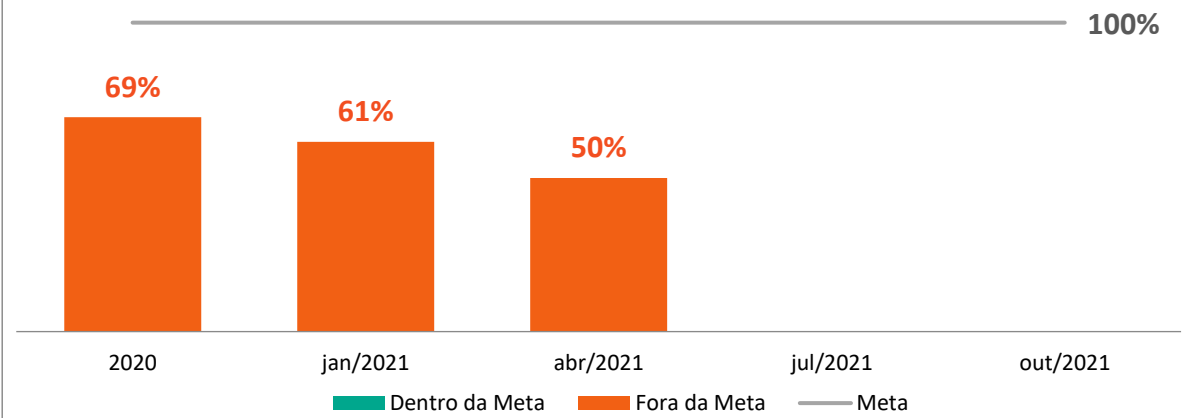


**Gráfico 5.** Repasse de recurso financeiro aos municípios.


### Avaliações qualitativas do apoio técnico

Percentual (%)

↑  
Melhor

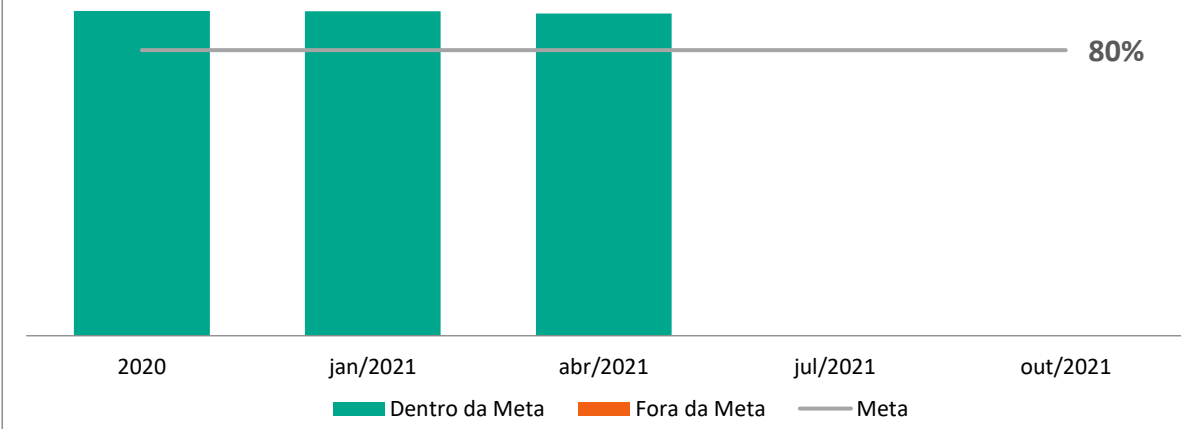

**Gráfico 6.** Avaliações qualitativas do apoio técnico.

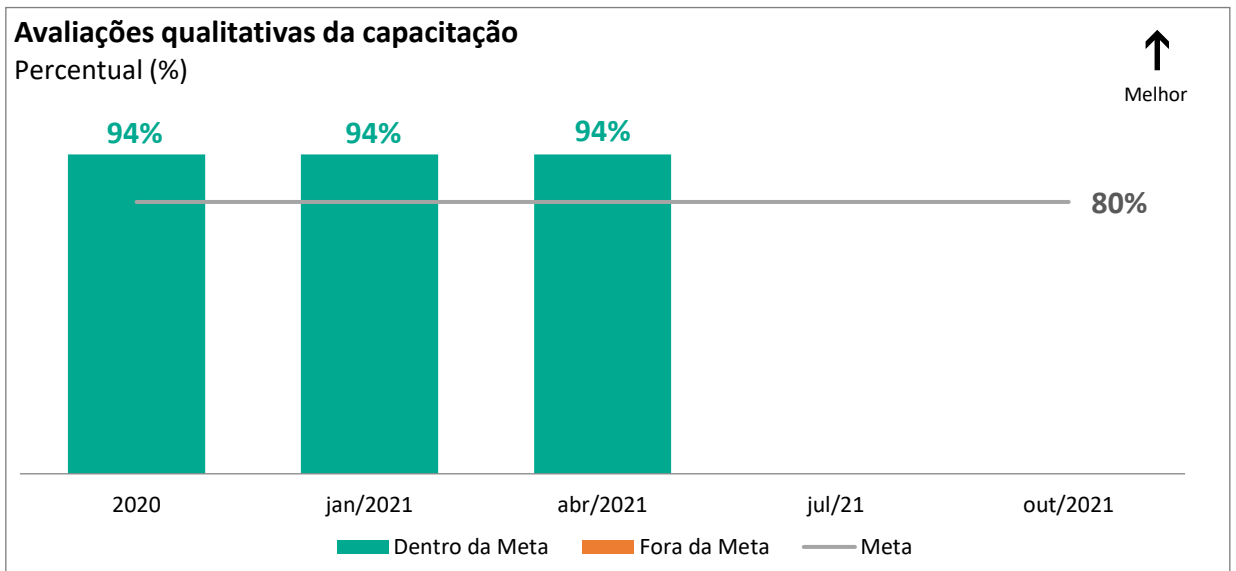

**Gráfico 7.** Avaliações qualitativas da capacitação.

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	10	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	N/A	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i;ii	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	4	N/A	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

## **Entregas do ano**

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.



## **Grandes números do Programa**

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

## **Fatos relevantes**

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

## **Indicadores**

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

## **PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021



● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Não houve grandes números no mês.

## **Fatos relevantes do mês**

Processo de Gestão de Mudança finalizado. Entrega do cronograma revisado refletindo a realidade atual do PG.

Conclusão da Etapa 2 da 3ª Turma do Curso de Formadores em Agroecologia, realizado pelo projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária – MG [Francisca Veras].

## Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

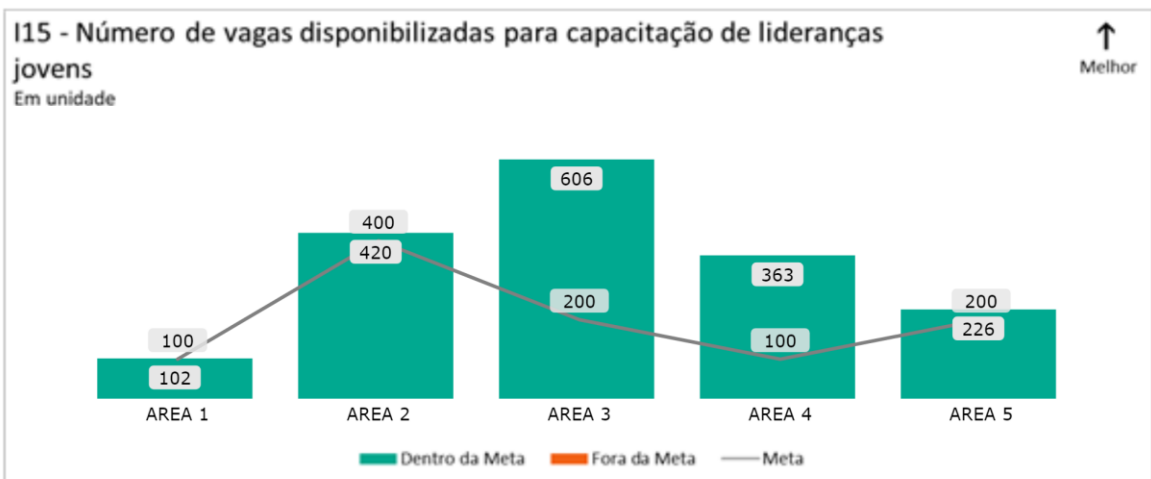


Gráfico 2. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças, por área. Gráfico semestral.



## PG034 Preparação para Emergências Ambientais

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente
Deliberação	460	N/A	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

março de 2021	<span style="color: green;">●</span>	Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
maio de 2021	<span style="color: red;">●</span>	Kick-off do Mapeamento das áreas de risco geológico e geotécnico dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
agosto de 2021	<span style="color: red;">●</span>	Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
agosto de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
novembro de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	<span style="color: gray;">●</span>	Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Em Definição
<b>I02</b>	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I03</b>	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Em Definição
<b>I04</b>	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Em Definição

# PG035 Programa de Informação para a População





## Eixo Pessoas e Comunidade

### Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	174	§1º (Histórico 2016)	Concluído Internamente
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Em Andamento
Deliberação	437		Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

- abril de 2021  Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
- maio de 2021  Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
- julho de 2021  Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
- julho de 2021  Finalização da Implantação do Repositório Técnico

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.



## **Fatos relevantes do mês**

Realização de reuniões de alinhamento junto às equipes de Diálogo Social e dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) para estruturação das ações de Itinerância e Descentralização do PG35 em 2021.

Formalização da contratação de fornecedor para desenvolvimento do Inventário e Repositório de Informações de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, com início das atividades em 30/04/2021.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## PG036 Comunicação Nacional e Internacional

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	março de 2021	abril de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	502.039	353.940	5.194.125	28.295.866
Documentos no site (mês)	7	6	178	2.612
Notícias Publicadas (mês)	15	14	239	5.245
Vídeos (mês)	17	12	158	3.150

## **Fatos relevantes do mês**

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

▲	INDICADOR	março de 2021	abril de 2021
	Acessos das cidades prioritárias ao site **	391.801	269.504
	Alcance orgânico Facebook (impressões)	24.932	32.707
	Alcance orgânico LinkedIn (impressões) *	31.524	55.263
	Visualizações de páginas de serviço	1.033.890	637.634
	Visualizações no Youtube (views)	8.530	12.104
	Tempo médio de resposta nas redes sociais	12,65 horas	33,86 horas ***

\* O linkedin disponibiliza apenas dados de impressões, não de alcance.

\*\* Os números podem sofrer variações, tendo em vista que algumas localidades não são mapeadas/avaliadas no google analytics.

\*\*\* Em abril de 2021, houve um pico no tempo médio de repostas nas redes sociais, ultrapassando a meta limite de 24h. No dia 28/4, por uma falha da ferramenta utilizada para a gestão das interações (stilingue), 13 interações de julho de 2020 retornaram para a plataforma e, ao classificarmos o status como já respondidas, a plataforma calculou equivocadamente que houve um atraso de aproximadamente 10 meses para as respostas. Essa alteração impactou o tempo médio de resposta calculado pela plataforma em abril de 2021, gerando o valor incorreto de 33 horas e 41 minutos. A plataforma não permite a exclusão dessas interações para novo cálculo, mas considerando a conta sem essas 13 interações, o resultado correto seria de 5h52m. |

## PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	§2º	Pendente
Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	178	Caput	Pendente
Cláusula	179	Caput	Em Andamento
Deliberação	125		Pendente
Deliberação	17		Pendente
Deliberação	248	1.b	Pendente
Deliberação	275	1	Pendente
Deliberação	310	1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Em Andamento
Deliberação	310	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	339	1	Pendente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente



Deliberação	383	1	Pendente
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1	Concluído Internamente
Deliberação	432	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	3	Concluído Internamente
Deliberação	444		Pendente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458		Em Andamento
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	53		Concluído Internamente
Deliberação	77		Pendente
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

## Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Nov/20
janeiro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Dez/20
março de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
março de 2021	●	Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021	●	Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/20 a Dez/20
julho de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/21 a Mar/21
setembro de 2021	●	Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/21 a Jun/21

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2020 à Julho 2021
- dezembro de 2021 Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/21 a Set/21

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em [www.monitoramentoriadoce.org](http://www.monitoramentoriadoce.org);
- 650 **quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, 215 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos no Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

## Grandes números do programa

### Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São 56 **pontos de monitoramento**, sendo 23 com tratamento e (E... sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; Sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em 56 pontos.
- São monitorados mensalmente 98 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 23 **parâmetros**.

## **Fatos relevantes do mês**

CT-SHQA: Protocolo parcial dos Laudos da 2ª Campanha de Coleta Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310.

CT-SHQA: Protocolo informativo sobre o novo formato e periodicidade para os próximos relatórios do programa de garantia e controle de qualidade – QA/QC do PMQQS.

CT-SHQA/GAT: Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.

CT-Saúde: Protocolo do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano.

## Indicadores

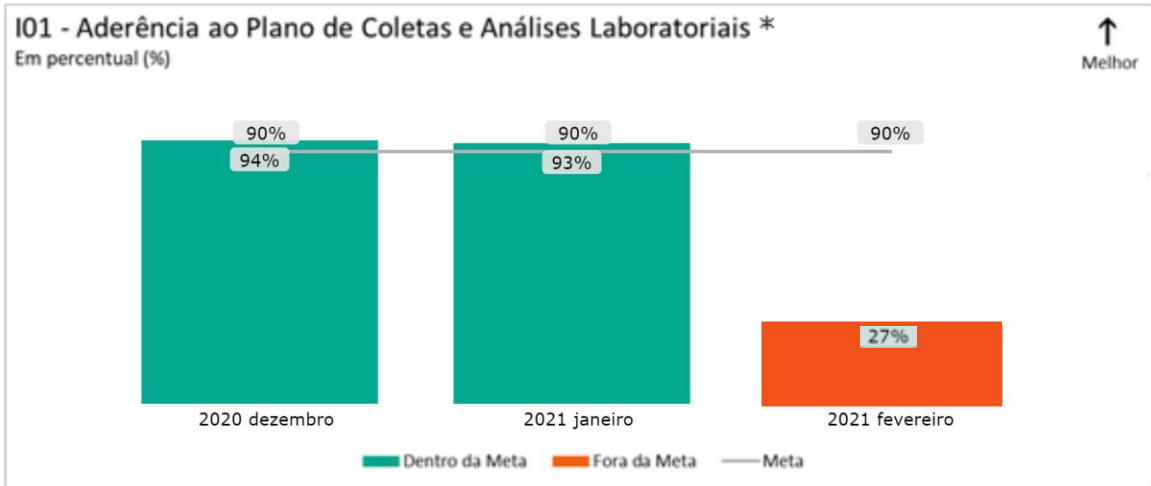


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

\*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Nota 1: Baixa aderência do ID01, devido as revisões nos laudos e ajustes para atender a padronização do banco de dados da Renova. A apuração segue em ajuste no mês de Maio e será corrigida no próximo CIF.

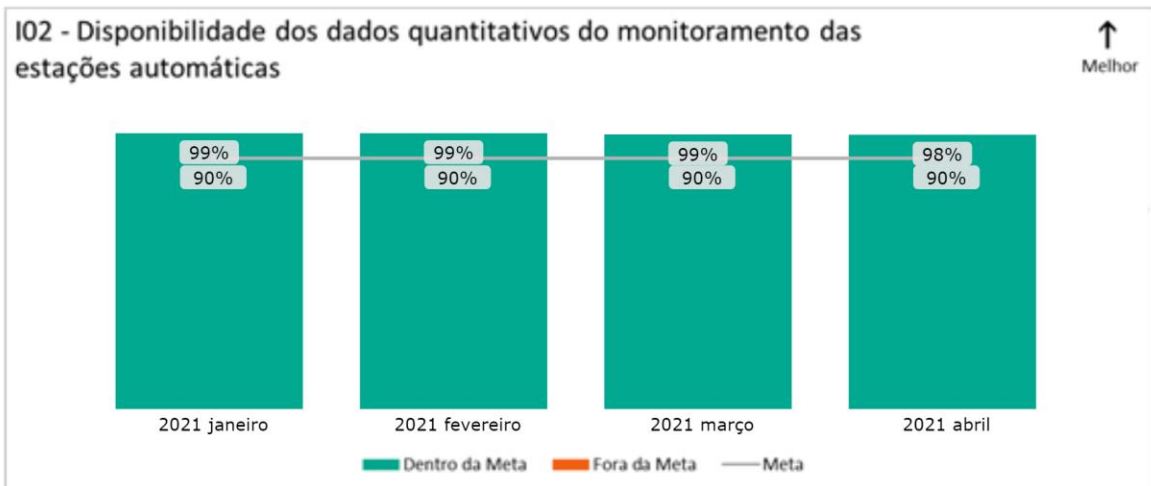


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

## Indicadores

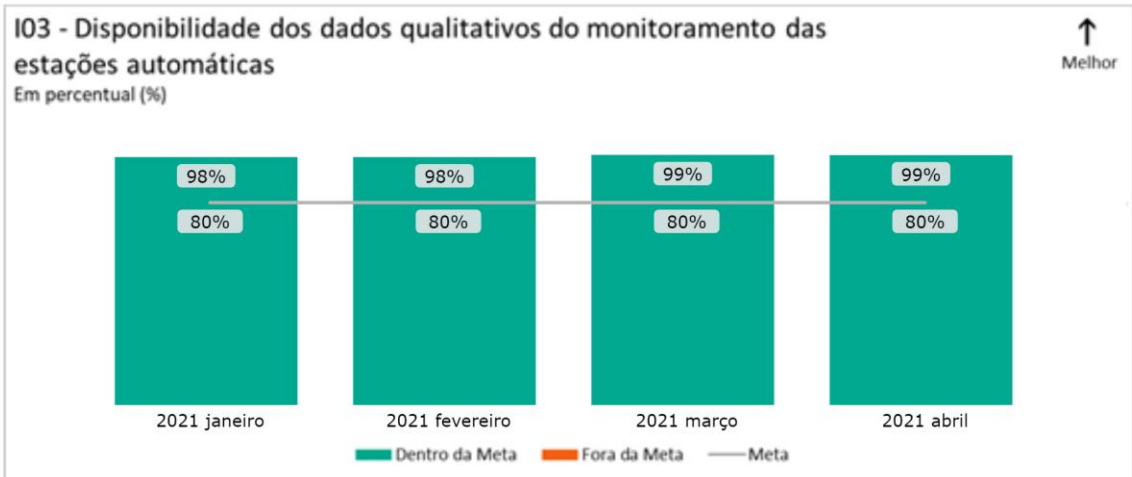


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

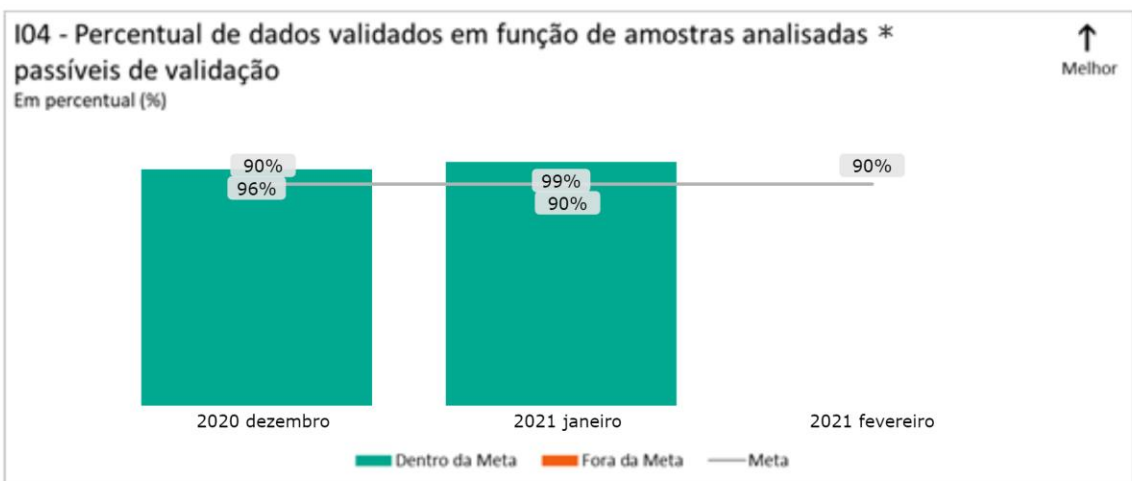


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

\*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Nota 2: Não foi possível apurar o IND04- Percentual de dados validados, referente ao mês Fevereiro/2021, devido aos ajustes nos cálculos dos validadores do MP5, que serão feitos para atender a revisão do PMQQS, que iniciou em Fevereiro/2021.



## PG039 Unidades de Conservação


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.




Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Pendente
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- abril de 2021  Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Obs.: A entrega referente à Contratação de apoio técnico especializado para o RVS sofreu alteração de datas diante da obrigatoriedade de aguardar as diretrizes do ICMBio (Ofício FR.2021.0492), o que resultou no adiamento da atividade para o ano de 2022.

Ressalta-se que, os marcos considerados do Programa estão em processo de revisão, o que pode impactar diretamente na *timeline* apresentada nesta página.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- julho de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 ● Conclusão do apoio técnico para estruturação de um viveiro de mudas com utilização de mão-de-obra penitenciária

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 244 (88,4%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 183 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.



## Fatos relevantes do mês

### **Baixo Rio Doce**

- Atividades no Espírito Santo paralisadas desde o dia 29/03, devido a nova onda do COVID 19.

### **Médio Rio Doce**

- Atividades de realização do CAR não iniciadas, devido a permanência da paralisação parcial dos contratos com as instituições responsáveis por ATER no território.

### **Parcerias**

- Aprovação da definição do programa no âmbito CIF.

## Indicadores

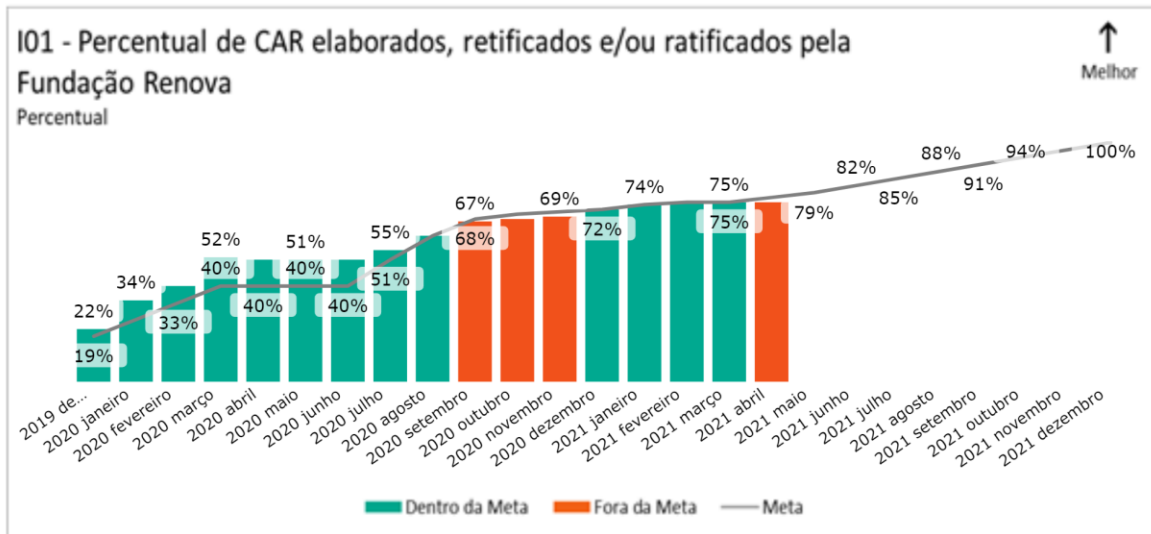


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

## PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

### Eixo Pessoas e Comunidades

#### Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Em Andamento
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Pendente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente

| Deliberação

85

3

Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- agosto de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.
- agosto de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana

\* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,6** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 28,8** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização de entrega de equipamentos de informática ao órgão comprometente SEMAD, em razão de saldo remanescente calculado pelo índice do IPCA em abril de 2021.

## Indicadores

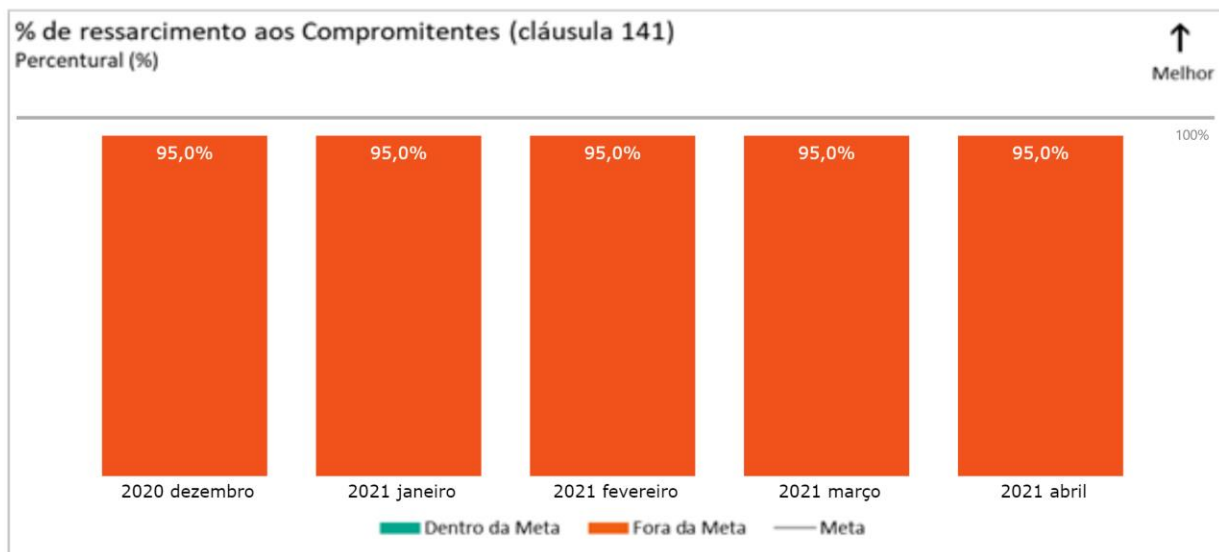


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

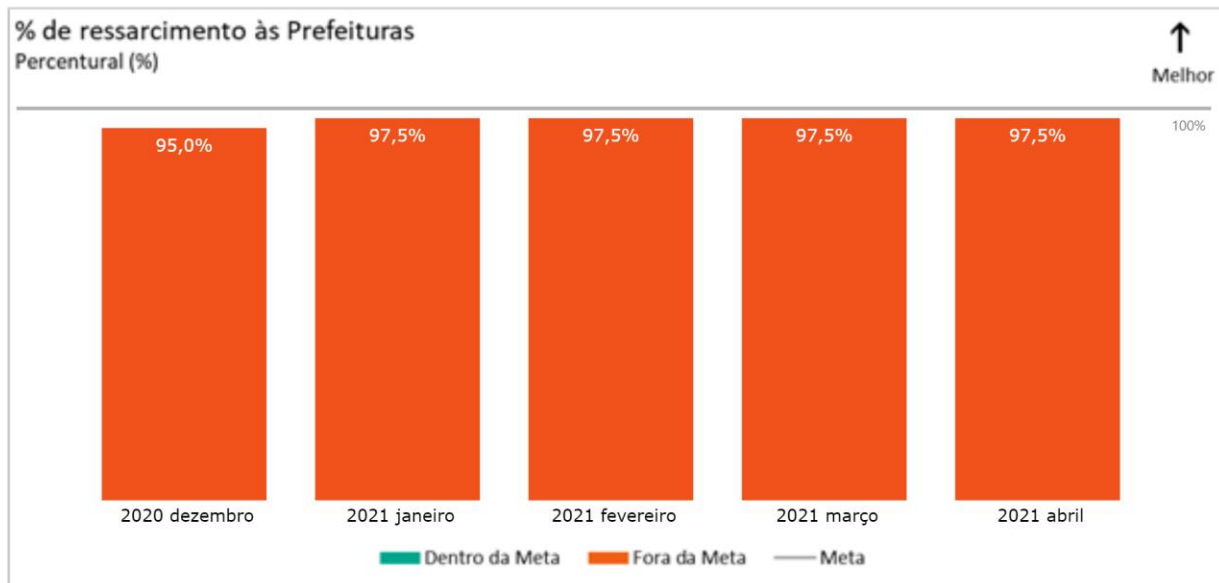


Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

\*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.






Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

\* 100% se refere às solicitações feitas até abril de 2021.

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

## Taxa de acidentes registrados

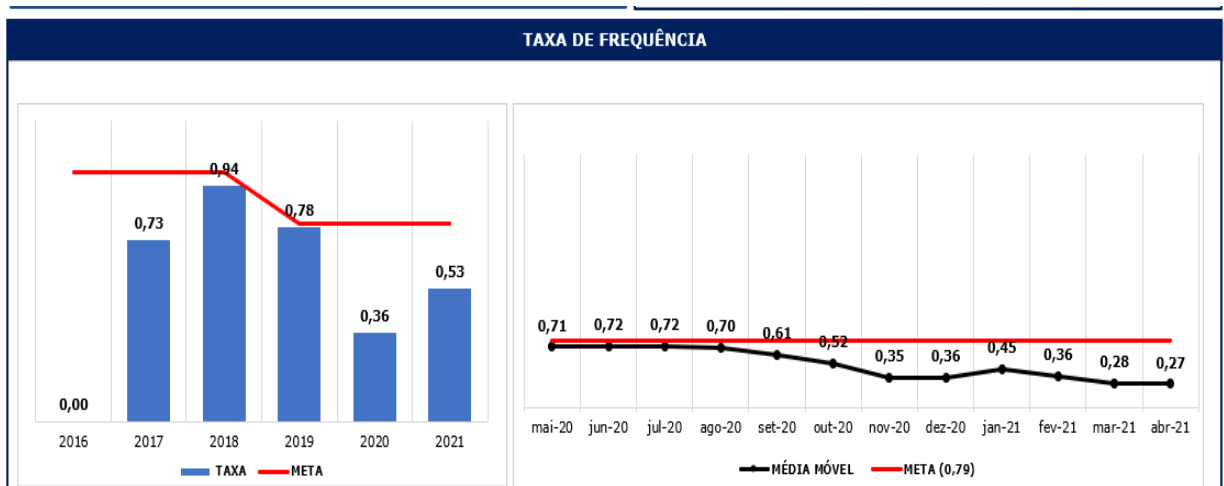

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	1,3	13,9	-92%	3,6	1,3	2,3	-65%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,3	4,7	-95%	2,2	0,3	1,9	-88%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	1,5	13,1	-90%	0,9	1,5	0,5	59%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,5	6,3	-93%	1,4	0,5	0,9	-67%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	3,2	48,4	-94%	16,4	3,2	13,2	-80%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	2,8	17,9	-87%	6,0	2,8	3,2	-54%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,3	12,8	-98%	2,8	0,3	2,5	-89%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	5,9	50,6	-90%	15,3	5,9	9,4	-62%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	7,9	55,1	-87%	20,6	7,9	12,7	-61%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	1,6	16,6	-91%	8,7	1,6	7,2	-82%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	1,0	14,9	-94%	4,5	1,0	3,5	-78%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,1	6,9	-99%	4,0	0,1	3,9	-97%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,4	1,8	-80%	1,0	0,4	0,5	-53%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,1	1,3	-7%	2,6	18,1	15,5	590%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,1	2,4	-95%	0,3	0,1	0,2	-60%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	258,1	191,8	-43%	285,4	258,1	27,3	-10%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
<b>Total Compensatórios</b>		<b>761,6</b>	<b>303,0</b>	<b>458,5</b>	<b>-60%</b>	<b>375,7</b>	<b>303,0</b>	<b>72,7</b>	<b>-19%</b>



Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,0	0,1	0,9	-88%	- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	0,2	0,1	0,1	-40%	- Aguardando aprovações das governanças interna e externa para início da Pesquisa e desenvolvimento do Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, com prestação de contas trimestral. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Previsão de execução do Empreende Rio Doce para agosto/21.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,4	0,2	0,2	-45%	- Casa do Empreendedor: custos realizados acima do previsto para o período. - Estruturação da área de TI da Prefeitura Municipal de Mariana (entrega de computadores e equipamentos) prevista para dez/20 ocorreu em jan/21.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,5	0,2	0,3	-57%	- Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Cancelamento do Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	3,7	0,5	3,2	-88%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.) - Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,5	0,8	0,7	-49%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,2	0,0	1,2	-97%	- Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma. - Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	4,9	1,6	3,3	-67%	- Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,6	3,0	2,7	-47%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6,4	0,5	5,9	-92%	- Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,9	0,1	0,8	-91%	- Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada. - Apoio à Defesa Civil, Escola Segura e NUPDEC: Execução abaixo do previsto para contrato vigente e atraso no faturamento da nota fiscal de medição de Abril pela H3M. - Formação Continuada: Conclusão de medição Unisol para distrato do contrato de parceria.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,4	0,0	0,4	-96%	- CIT Mariana: atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da Cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. - CIT GV: atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Atualmente em análise técnica a oferta do Horto Florestal para implantação do CIT em GV. - CIT Linhares: atraso das obras devido a alteração do projeto executivo e orçamento (inclusão de reforma dos banheiros e auditório) gerando atraso na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,1	-40%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,3	18,1	17,8	6263%	- 1º Repasse do Acordo de Cooperação com o IEF para a consolidação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce; no âmbito da cláusula 182 TTAC.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,1	0,0	0,1	-79%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Encerramento do contrato com a JM Reflorestamento, que realizava a retificação dos CARs no Alto Doce, devido à baixa demanda atual. As retificações que restaram serão realizadas por demanda, uma vez que restaram aquelas com pendências fundiárias da família ou de documentação. - Atividades de análise do tratamento CAR no Médio e Baixo sofreram um replanejamento de cronograma, pois, devido a pandemia o início do Projeto precisou ser postergado.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	31,1	1,2	29,9	-96%	- PRA não iniciado: Aguardando celebração de parceria com o IDAF (ES) e publicação. - Decreto estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/2021 - Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	- Novas áreas Agenda Integrada e Gestão Pública em discussão 12ª vara. - Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações.
<b>Total Compensatórios</b>		<b>58,4</b>	<b>26,5</b>	<b>31,9</b>	<b>-55%</b>	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	4,2 -	21,1	-84%	15,5	4,2 -	11,3	-73%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	854,8 -	570,9	-40%	497,8	854,8	357,0	72%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	30,8 -	96,9	-76%	42,5	30,8 -	11,7	-27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	2,9 -	43,1	-94%	7,5	2,9 -	4,6	-61%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	2,0 -	14,6	-88%	4,4	2,0 -	2,4	-55%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	19,0 -	107,1	-85%	49,4	19,0 -	30,4	-62%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	1,8 -	5,0	-73%	2,3	1,8 -	0,4	-18%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	185,0 -	827,6	-82%	254,0	185,0 -	69,0	-27%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	40,8 -	161,6	-80%	45,9	40,8 -	5,1	-11%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	25,1 -	114,1	-82%	49,8	25,1 -	24,7	-50%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,3 -	8,1	-96%	2,5	0,3 -	2,2	-86%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	1,1 -	27,7	-96%	8,3	1,1 -	7,1	-86%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	0,2 -	18,1	-99%	4,2	0,2 -	3,9	-95%
PG14	SAÚDE	19,7	2,5 -	17,2	-87%	6,4	2,5 -	3,9	-61%
PG16	PESCA	53,4	1,3 -	52,0	-98%	12,1	1,3 -	10,7	-89%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	22,0 -	103,6	-83%	45,0	22,0 -	23,0	-51%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	0,6 -	4,9	-89%	1,0	0,6 -	0,4	-37%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	81,1 -	135,6	-63%	96,6	81,1 -	15,5	-16%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	33,7 -	118,4	-78%	56,6	33,7 -	22,9	-40%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,1 -	0,7	-85%	0,3	0,1 -	0,1	-54%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	7,9 -	26,5	-77%	13,2	7,9 -	5,3	-40%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	39,1 -	29,3	-43%	14,3	39,1	24,8	173%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	0,4 -	11,3	-97%	1,8	0,4 -	1,4	-80%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	30,2 -	147,1	-83%	64,1	30,2 -	33,8	-53%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	9,4 -	38,2	-80%	21,7	9,4 -	12,4	-57%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	0,0 -	3,8	-99%	1,9	0,0 -	1,9	-98%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	70,8 -	228,5	-76%	101,0	70,8 -	30,2	-30%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,1 -	3,9	-98%	1,7	0,1 -	1,7	-96%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	492,1	-100%	164,0	-	164,0	-100%
<b>Total Reparatórios</b>		<b>4.896,3</b>	<b>1.467,3 -</b>	<b>3.429,0</b>	<b>-70%</b>	<b>1.585,5</b>	<b>1.467,3 -</b>	<b>118,2</b>	<b>-7%</b>
<b>Total Programas</b>		<b>5.657,8</b>	<b>1.770,3 -</b>	<b>3.887,5</b>	<b>-69%</b>	<b>1.961,2</b>	<b>1.770,3 -</b>	<b>190,9</b>	<b>-10%</b>

		Anual Total				Anual Acumulado					
PG	Programas	Orçamen	Realizad	Variaçã	%	Orçamen	Realizad	Variaçã	%		
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	35,8	-	138,7	-79%	58,1993	35,8488	-	22,3505	-38%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	1,1	-	27,3	-96%	8,8	1,1	-	7,7	-88%
Total Despesas Administrativas		202,9	36,9	-	166,0	-82%	67,0	36,9	-	30,1	-45%
Total Geral		5.860,7	1.807,2	-	4.053,5	-69%	2.028,2	1.807,2	-	221,0	-11%

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	3,7	1,1	2,6	-71%	- Variação devido ao atraso no início do cadastro com a Cáritas e mudança de estratégia/planejamento dos laudos e cadastros da Fase 2 (decisão judicial).
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	116,8	118,2	1,4	1%	- Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel. - Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de 193,0 MM.
PG03	POVOS INDÍGENAS	11,0	6,3	4,7	-43%	- Detalhamento do PBAI Tupiniquim Guarani está em contratação; Monitoramento social, revisão do programa, atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia; - Processo de inclusão de famílias nos acordos 2021 (Comboios e Tupiniquim) em andamento, encerrando em maio/21 com pagamentos retroativos à janeiro; - Atividades do FAIC foram postergadas, em função do Protocolo de Segurança Covid, ajustes internos de procedimentos para execução. Edital prorrogado por mais 30 dias até maio/21
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,4	0,7	0,7	-51%	- Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento.. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em jun/21.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,2	0,7	1,9	-162%	- Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecedor Contexto); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro das capacitações. - Desalinhamento entre cronograma físico e desembolso financeiro. Obs.: Plano de Reparação de Proteção Social em Mariana: Houve medição equivocada (R\$ 1,3 milhão) referente o repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto será refletido no próximo relatório referente a Abril/21.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	10,6	5,4	5,3	-49%	- Diálogos e Canais – Economia(R\$ 5MM): Fechamento dos escritórios dos CIAs e atendimento remoto. - Comunicação - Economia (R\$1,6MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 23,4MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,5	0,1	-21%	- Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 4800020125). - Atraso no lançamento da medição da gerenciadora UST (Progen - Contrato 4800029406); - Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadora de saúde e segurança (EJ Assessoria - Contrato 4800003657)
PG08	REASSENTAMENTO	74,6	55,2	19,4	-26%	- Custos Covid (-34,1): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Novas Moradias Bento (+19,4): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Infraestrutura e Bens Públicos Bento (+18,9): Pagamento a maior no período em função de medições pendentes anteriores que aguardavam evidências; - Adutora ETE/ETA Paracatu (-12,9): Revisão Escopo da Adutora e revisão do cronograma (linha de base fev/21) - previsão de início ago/21; ETE e ETA - Novo Processo - previsão ago/21; - Contêineres Bento (-11,7): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêineres e não conclusão da contratação da segunda empresa de contêineres; - Engenharia (-8,3): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Condicionantes, Semitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-8,3): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021) - Equipamentos Públicos Paracatu (-7,5): Escola - previsão de montagem até jun/21 custos a serem contabilizados até jul/21 . Demais equipamentos públicos conforme distribuição física (linha de base fev/21) - iniciam a partir de agosto/21 - Infraestrutura, Benfeitorias e instalações proviórias Paracatu (-6,5): Medições pendentes do Consorcio RPAR - 22 (reajuste), 23, 24 e 25, serviços remanescentes que serão contabilizados até jul/21. e Novo Contrato de acordo com Cronograma (linha de base fev/21) - previsão até jan/22; - Adutora ETE/ETA Bento (-4,8): Aguardando a definição de faturamento direto para a subempreiteira da HTB, executora da ETE; - Aterro Sanitário Bento (-4,3): Aguardando definições de projeto e aprovação da APRO; - Demais Pacotes Bento (-4,6): Variação a menor em Comunicação (928mil), Logística (807mil), Infraest. Sítiante (508mil), Aquisição de Terras (503), Cemitério (481mil), Ambulancia (391mil), Alimentação Elétrica (234) e Outros (808mil). - Gesteira (-2,4): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Iluminação pública e instalações provisórias Bento: Aguardando a definição de faturamento direto para a subempreiteira da HTB, executora da ETE

PG	Programas	Mensal		Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado			
PG09	UHE CANDONGA	13,2	11,1	2,1	-16%	- Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	13,2	5,0	8,2	-62%	- Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	0,6	-90%	- Execução a menor nos serviços de transportes, devido à suspensão das aulas presenciais. - Execução a menor nas atividades de socialização, devido ao isolamento social (pandemia), por serem atividades essencialmente presenciais. - Execução a menor no atendimento psicopedagógico e pedagógico, devido ao isolamento social (pandemia).
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,1	0,3	1,9	-87%	- Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em processo de contratação - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: paralisação temporária das atividades em função da pandemia.254 - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes e em revisão - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a conclusão do plano de trabalho da UNESCO - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,4	0,0	1,3	-99%	- Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais.
PG14	SAÚDE	1,2	1,0	2,2	-181%	- Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: pendência da manifestação técnica, por parte do CIF, sobre o Termo de Referência para chamamento público; - Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa: previsão orçamentária foi maior que o acordo firmado com o município; - Plano de Reparação de Saúde em Mariana: não apresentação de demanda por parte do município à Fundação Renova quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP; - Plano de Capacitação SUS em Mariana: solicitação do município para aguardar a posse da nova gestão municipal e atraso na realização das capacitações previstas na ACP Mariana em decorrência da Covid 19; - Plano reparação demais municípios: os municípios solicitaram que aguardasse a nova gestão municipal. Atraso na assinatura, por parte dos municípios, de Acordo de cooperação técnica; - Atraso nos estudos epidemiológicos e toxicológicos: a execução das ações de mitigação de possíveis impactos depende dos resultados dos estudos e definição de correlação com o rompimento. Obs.: Plano de Reparação de Saúde em Mariana: No mês de Março/21, houve medição equivocada por parte de outro programa da FR (R\$ 1,6 milhão), referente ao repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto está sendo refletido neste relatório referente a Abril/21.
PG16	PESCA	3,9	0,8	3,1	-80%	- Baixa execução das ações em revisão devido a necessidade de revisão do orçamento (redução), sendo revisto juntamente com a estratégia dos Caminhos da Retomada. - Eixo 1: Readequação dos projetos estruturais devido a alteração de cronograma; - Eixo 2: Readequação dos projetos estruturais - Necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16, quanto à definição do programa. - Atraso no processo de aditivo, e readequação de cronograma. - Suspensão das atividades em campo devido a pandemia. - Ações Gerais: mudança na estratégia de contratação, escopo absorvido pelo Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura e suspensão de atividade devido a pandemia.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,2	6,4	4,9	-43%	- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação de contratos devido à pandemia. - Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil. - Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia. - Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz. - Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água. - Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos. - A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,4	0,1	0,3	-76%	- O planejamento mês a mês no Draft 16 não está refletindo o real planejamento financeiro do Programa.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	17,6	6,5	-27%	- Orçamento realizado com base na média de dependentes e de valores, podendo haver desvios em relação ao efetivamente realizado.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	14,5	9,8	4,7	-32%	- Barramento Linhares: redução das atividades no período chuvoso (alteamento) e menor demanda de serviços de engenharia. - Análise de risco ecológico e saúde humana: atraso no início das atividades de campo, devido aos embargos da 12ª Vara. - Engenharia e estudos complementares: atraso na contratação das obras dos taludes Ronildo e Nazareno e na mobilização da empresa de bioengenharia Inovesa. - Serviços de auditoria, devido a um descompasso dos pagamentos ocorrido na transição do contrato da FR Samarco (será regularizado em Maio).
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,0	0,1	-94%	- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,6	1,3	2,3	-64%	- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência. - Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente aditamento do contrato atual.
PG28	BIODIVERSIDADE	3,5	1,0	2,5	-71%	- Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados. - 3º Aporte do 2º Termo aditivo do contrato contabilizado em fevereiro, não previsto no orçamento de 2021, devido à rescisão anunciada em 30/09/2020. Contrato continua em vigor, conforme decisão judicial. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	0,2	0,0	0,2	-99%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto. - Desvios caracterizados pela paralisação das atividades, devido à pandemia.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,4	9,1	6,3	-41%	- Menor avanço da Aduadora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	4,3	2,0	2,4	-55%	<b>Postergação:</b> - Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com apenas duas medições realizadas, mas apenas de serviços de coleta, serviços de laudos e mobilização ainda atrasados e pendentes de medição. - Contrato anterior (ALS) com laudos em atraso e ainda não medidos. - Contrato Spot (ALS) com demandas pendentes devido ao take-off e transição de 48 para 49. - Parceira UNESCO com desembolso semestral ainda não medido. Estudos em execução mas ainda não medidos (SRK, RHAMA). Contrato previsto ainda não iniciado (ERG). Parceria com FCO/UFMG/Libanio cancelada após dificuldades de tratativas para formalização da mesma. - Clean ainda sem medição pois está aguardando adequação no pedido para efetuar o pagamento das notas dos equipamentos já entregues. <b>Economia:</b> Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,6	0,0	0,6	-98%	- Desvios caracterizados pela mudança de estratégia do Programa em virtude de alteração de escopo. - Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto. - Adequação de procedimentos para enfrentamento a Pandemia.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,6	17,4	7,2	-29%	- Postergação (R\$ 27,5 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (IUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 2,7 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,6	0,1	0,5	-89%	- Atraso na aquisição dos coletores para ressarcimento ao Ministério da Integração.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
<b>Total Reparatórios</b>		<b>399,7</b>	<b>267,5</b>	<b>132,2</b>	<b>-33%</b>	
<b>Total Programas</b>		<b>458,0</b>	<b>294,0</b>	<b>164,0</b>	<b>-36%</b>	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,04	8,01	6,03	-43%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	2,0	0,3	1,7	-86%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>16,0</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>-48%</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>474,1</b>	<b>302,3</b>	<b>171,8</b>	<b>-36%</b>	
