

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Outubro/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>19</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>25</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>35</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>43</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>51</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>85</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>93</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>108</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>130</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>138</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>143</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>148</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>154</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>162</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>168</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>174</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>184</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>190</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>195</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>202</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>207</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>215</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>220</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>227</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>232</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>239</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>244</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>249</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>255</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>261</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>266</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>272</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>278</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>283</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>292</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>298</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>304</u>
Glossário	<u>300</u>
Gestão Econômica	<u>306</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em outubro de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em outubro houve o protocolo do Relatório QAQC das duas campanhas de amostragem do “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte” - Atendimento à Deliberação CIF nº 310 e do Relatório QA/QC Trimestral do PMQQS de Abril a Junho/21 (PG038, pág. 283).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 207), em outubro houve o protocolo no âmbito do Eixo 2 dos documentos de ARE e ARSH em atendimento às requisições 1 e 2 da Deliberação CIF 524, ocorreu também o início das atividades de campo da Etapa 2 de caracterização ambiental do Plano de Manejo do Trecho 17. O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 108) a qual, até o mês de setembro, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 85), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 449 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.707 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito (PG017, pág. 174).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 220) e de Nascentes (pág. 227).

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até outubro/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de outubro, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 700 indenizações, o que representa 97% do total das 724 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 202), atualmente existem 15.407 pessoas assistidas, com um total de 7.191 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 25) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 35). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.349 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 170 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 104 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 43) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 154) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a assinatura de acordo com o município de Governador Valadares para implementação dos Plano de Reparação em Proteção Social, com os seguintes objetivos: fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município, capacitação aos operadores de proteção social do município de Mariana com o tema: "Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – e suas transversalidades”.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 51; PG035, pág. 272 e PG036, pág. 278), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 249), em outubro de 2021 foram repassados R\$ 1.085.994 para ações dos municípios de Alpercata, Córrego Novo, Ipatinga, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata e São José do Goiabal.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 130), em outubro ocorreu a execução de dreno do piso de areia da arena do parque, início das atividades de base e sub-base de pavimentação interna do parque e realização de visita técnica com as proponentes para reconstrução das pontes.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 93) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de outubro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em outubro, ocorreu o início das atividades da empresa Cardan nos ID's 24 e 150.

Paracatu de Baixo — em outubro, houve a mobilização do canteiro de obras da empresa Hexágono.

Gesteira — em outubro, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em outubro, houve a conclusão e entrega da reforma do ID 307 e ID 31.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
- julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 98.713 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Avanço no Cadastro de Mariana
conforme dados abaixo:
Total de Cadastros Liberados: 1.355
Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2019 (UNiverso de 79): 89
pesquisas realizadas
Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2020 (UNiverso de 177):
158 pesquisas realizadas

Indicadores

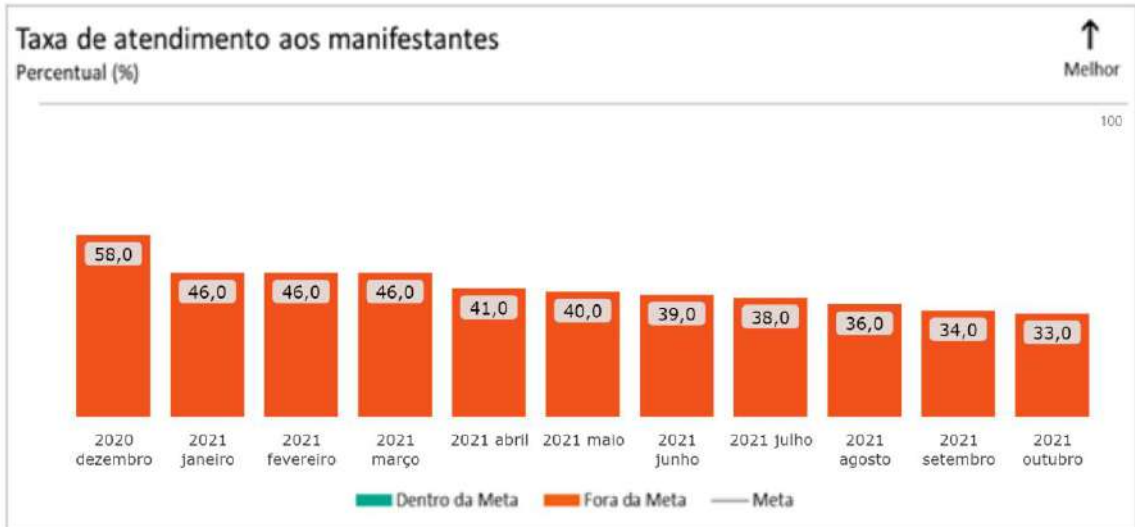


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

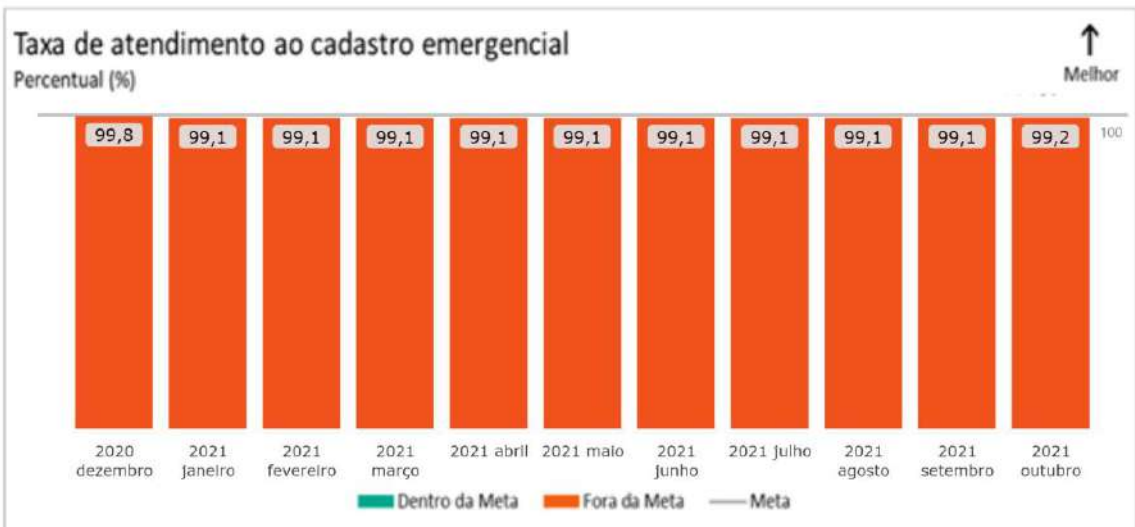


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

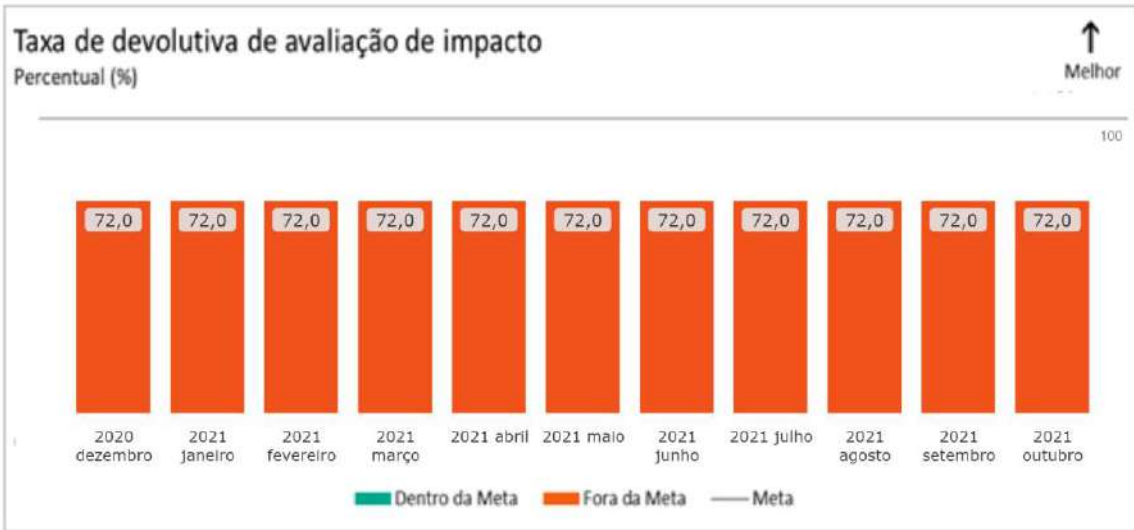


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.



Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.



Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

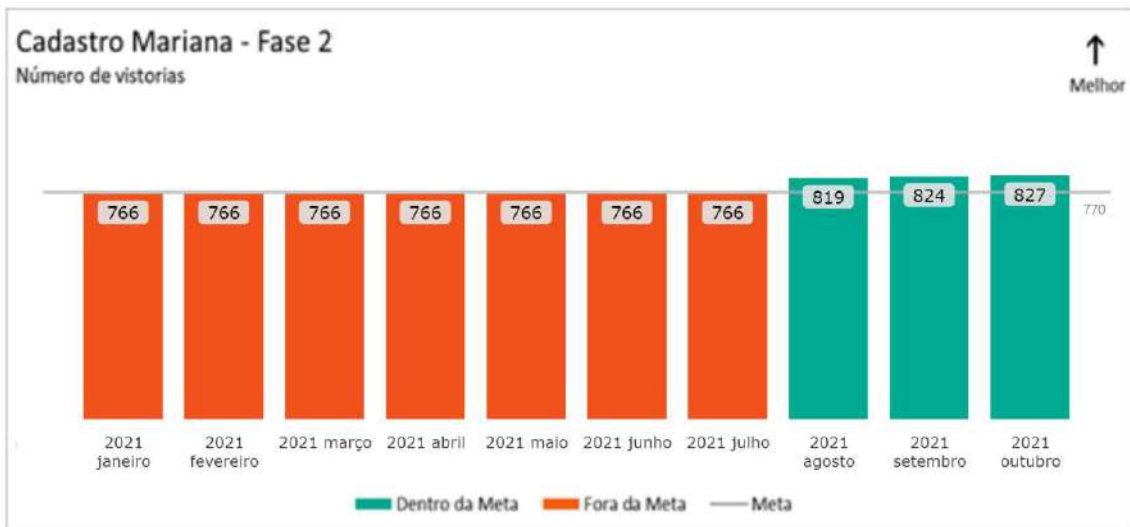


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

Ajuste no indicador Cadastro Mariana – Fase 2 : Feita a alteração no valor deste indicador, nos meses de Fevereiro, Julho, Agosto e Setembro porque no filtro realizado no arquivo de "Controle Unificado" para calcular o número de vistorias realizadas não foram desprezados os dados referentes a localidade de Rio Doce (Campo Origem). Este indicador refere-se somente a localidade de Mariana.

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320,179 pessoas, sendo que 270,371 aceitaram propostas. Destas, 264,996 propostas já foram pagas (98.0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 302.15M** .
- **Para Danos Gerais**, 10,603 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,580 já foram pagos (99.8% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1,215.20M** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 700 indenizações, o que representa 97% do total das 724 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 47.352 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 700 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97% do total das 724 propostas aceitas. Foram 12 indenizações pagas no mês.

Indicadores

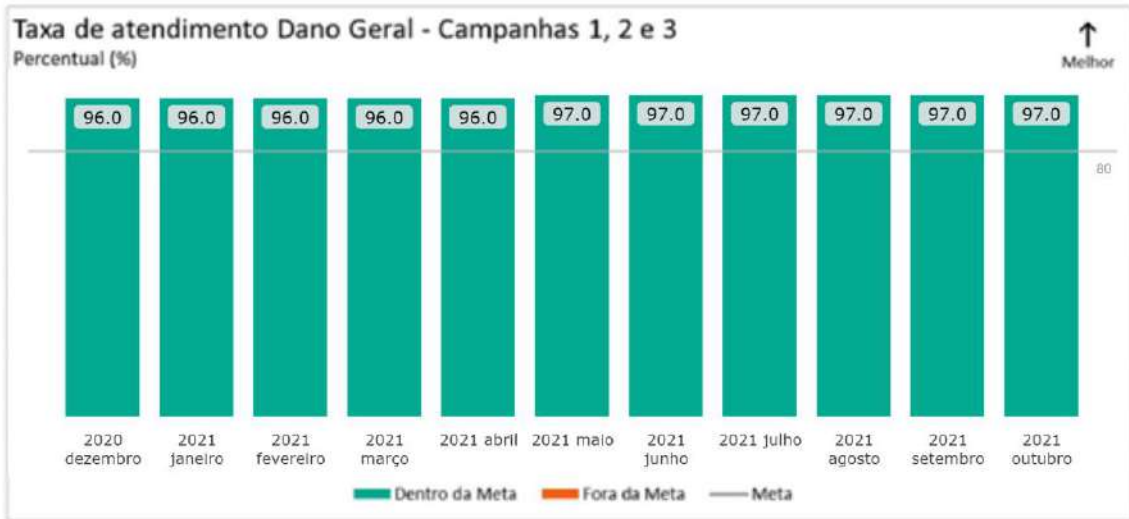


Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).








Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021  Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021  Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021  Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021  Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021  Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.284 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.720 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.029.247,35 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.029.247,35 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 26.320 litros distribuídos nos dias 23 e 30 de setembro, 7 e 14 de outubro (total de 1316 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/09/2021 até 20/10/2021. no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/09/2021 até 20/10/2021

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2021 até 20/10/2021

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	356	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	493	2	Judicializado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado
Deliberação	501	2	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado
Deliberação	534	3	Encerrado
Deliberação	534	4	Em Andamento

Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	545	2	Em Andamento
Deliberação	546	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

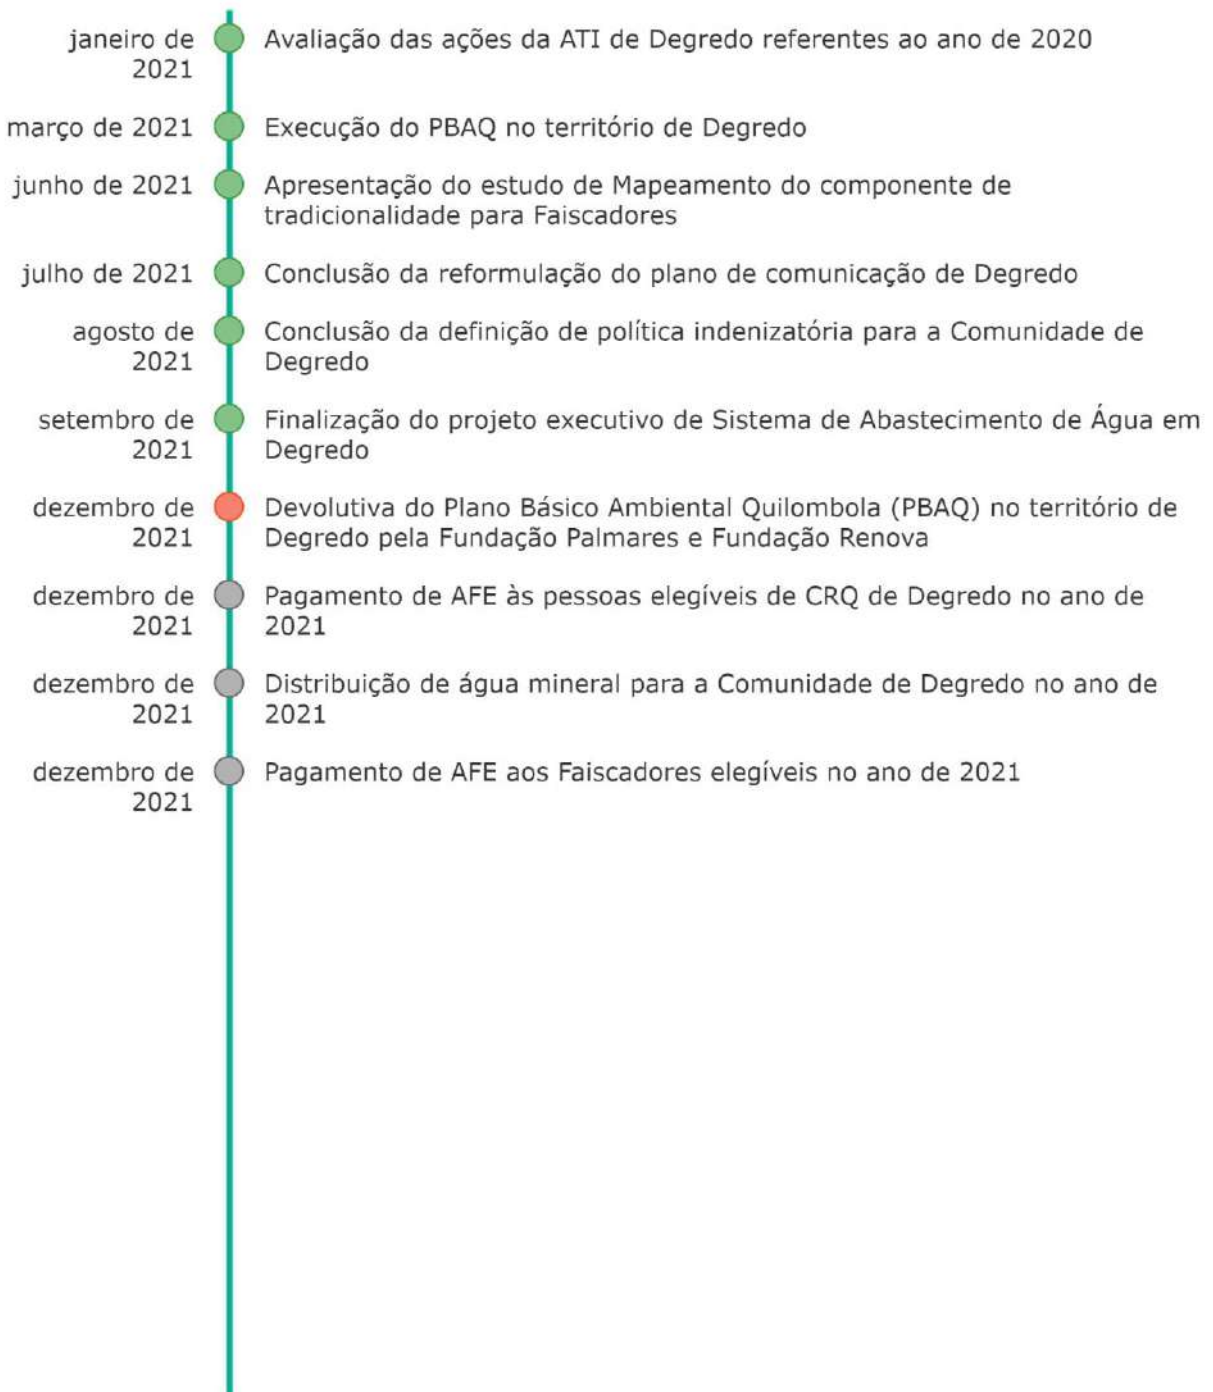

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 274 **titulares** (170 quilombolas, 12 faiscadores de Rio Doce e 92 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização das oficinas de cartografia social e início da pesquisa etnográfica, etapas do Programa 01-Documentação de Referências Culturais do PBAQ

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Reprogramado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Reprogramado

Entregas do ano de 2021

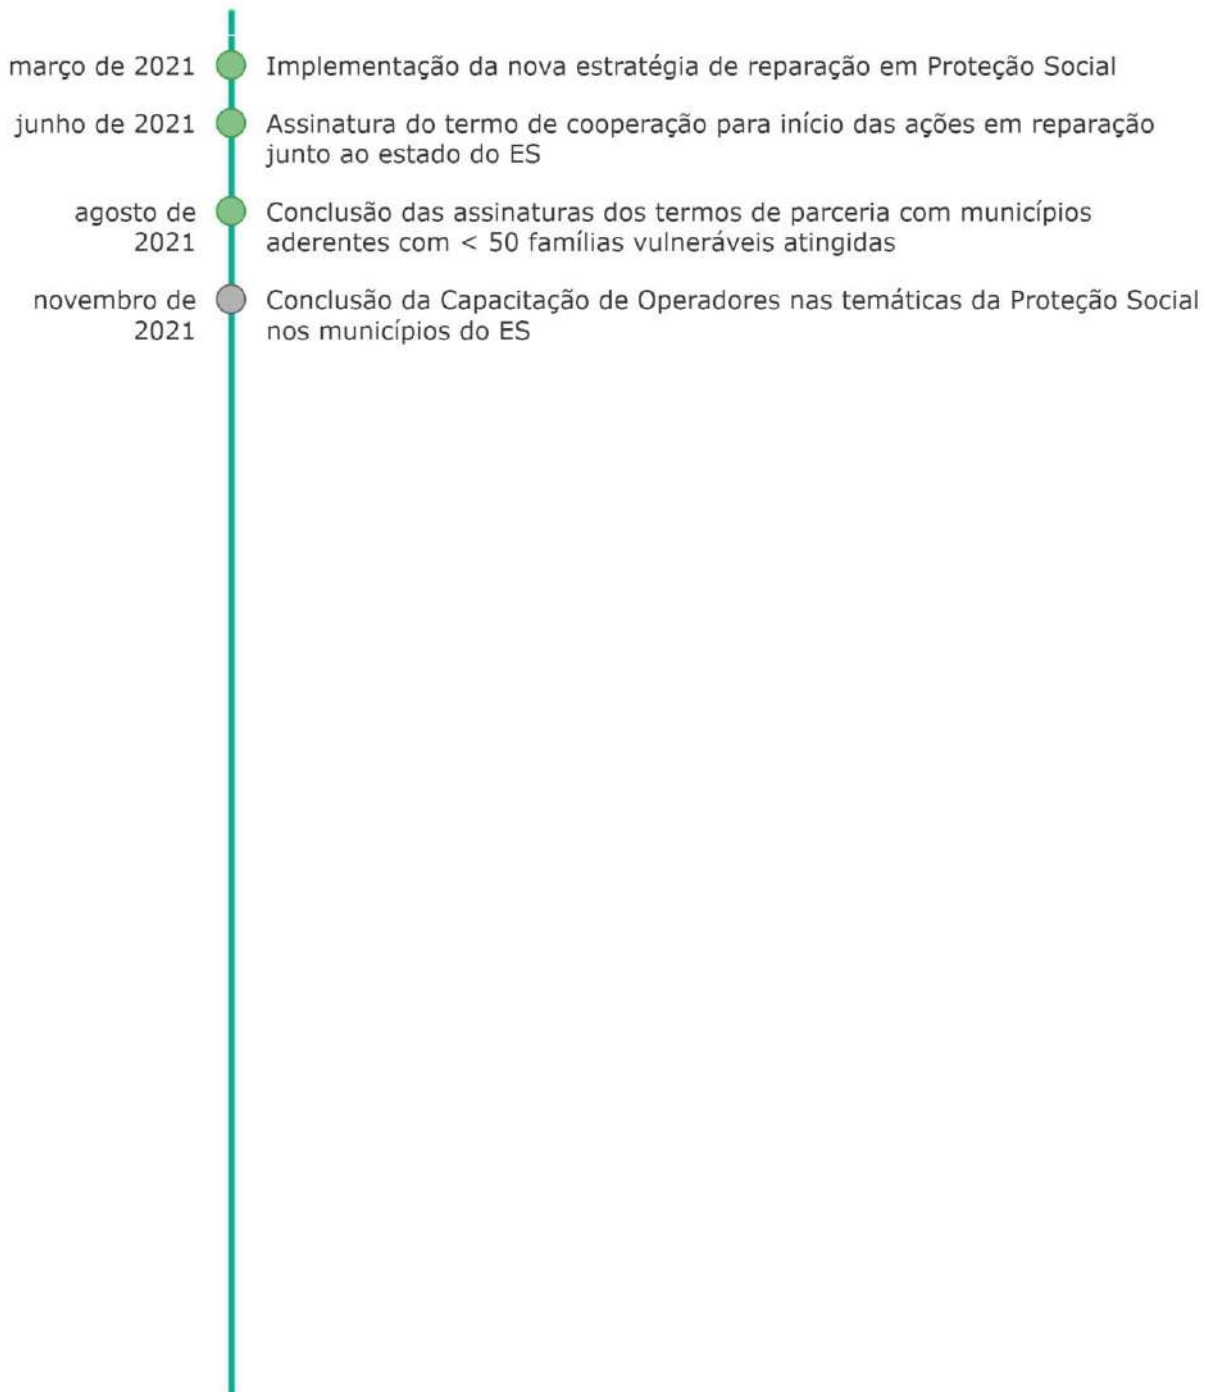

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 71 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/MG** e outros **11 municípios atingidos** para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 8 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 18 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- **14247 famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Reunião de prestação de contas (Resulta) em parceria com Diálogo nos municípios: Bugre, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália, Timóteo, Conselheiro Pena e Naque.

Capacitação aos operadores de proteção social do município de Mariana com o tema: "Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – e suas transversalidades”.

Assinatura de acordo com o município de Governador Valadares para implementação dos Plano de Reparação em Proteção Social, com os seguintes objetivos: fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município.

Apresentação dos planos de trabalho das entidades selecionadas no edital para fazerem a reparação na rede socioassistencial dos municípios São José do Goiabal, Tumiritinga, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Sooretama.

Indicadores



Gráfico 1. % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social. Frequência Anual.



Gráfico 2. % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.



Gráfico 3. % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos. Freqüência Semestral.



Gráfico 4. % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos. Freqüência Semestral.

Nota referente aos indicadores I02, I03 e I04:

1. As capacitações dependem de adesão dos municípios e estados ao plano de reparação em proteção social, bem como da contratação de RH e disponibilização dos profissionais para participarem dos cursos.
2. Foram ofertadas vagas aos municípios do ES, pois o plano estadual de MG e a capacitação aos municípios de MG estavam em negociação.




Gráfico 5. % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito. Frequência Semestral.

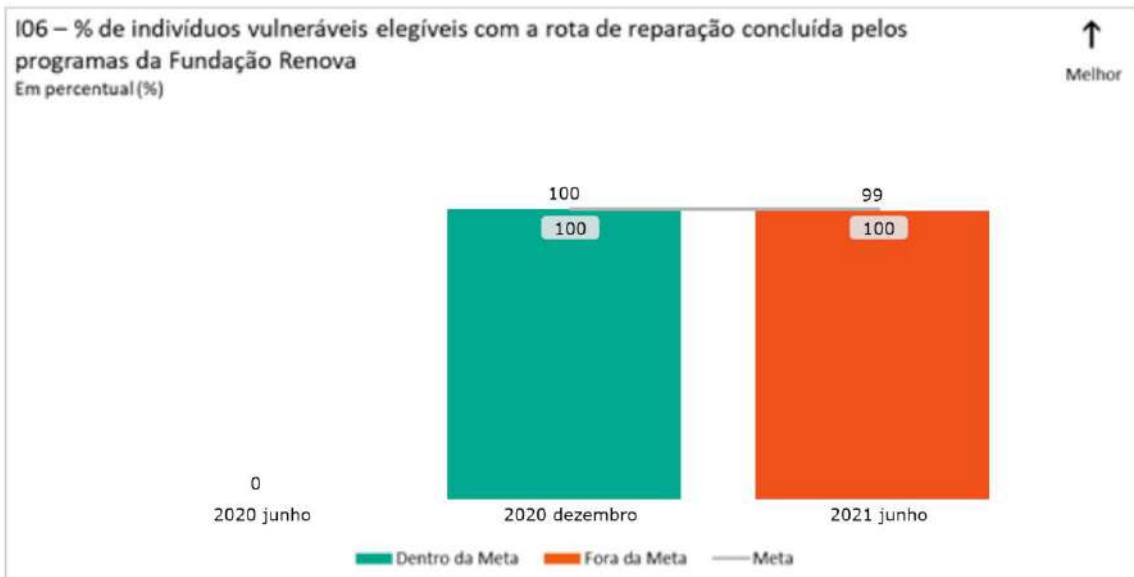


Gráfico 6. % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova. Frequência Semestral.



Gráfico 7. % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares). Frequência Semestral.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Reprogramado
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Em Andamento
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021		Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021		Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021		Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021		Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021		Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021		Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021		Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021		Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021		Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021		Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021		Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	setembro	outubro	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	15	7	122.745
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	29	20	3.641
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	1.053
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	11

Fatos relevantes do mês

Realização de reuniões com moradores da avenida Beira Rio (Linhares – ES) e da comunidade de Patrimônio da Lagoa (Sooretama – ES) para esclarecimentos sobre a decisão judicial que define o atendimento e reparação das famílias cujos imóveis foram atingidos pelo barramento do rio Pequeno.

Realização de 19 Seminários Participativos de Ações Territoriais, envolvendo 297 pessoas, entre população atingida e demais públicos interessados, ao longo dos meses de agosto e outubro, com o objetivo de apresentar e discutir o planejamento do Programa de Comunicação, Diálogo, Participação e Controle Social (PG06), validar o entendimento sobre os focos de atuação e agendas prioritárias e obter insumos para complementação e aperfeiçoamento do planejamento.

Planejamento, treinamento dos aplicadores e realização da pesquisa de Avaliação de Diálogo e Comunicação, que busca: 1) identificar a percepção da população atingida acerca das estratégias de Diálogo e Comunicação desenvolvidas até o momento pela Fundação Renova; 2) identificar o atendimento Fundação Renova a seus propósitos de transparência, participação e controle social; e 3) produzir indicadores de resultado do programa, acordados com a CT-PDCS, baseados em pesquisa de opinião junto à população atingida.

Em Mariana (MG), foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação. Ainda no município, destaque para a realização de reunião com a Comunidade de Ponte do Gama referente à reparação de bens coletivos e discussão do planejamento de ações do PG06.

Continuidade dos Fóruns de Prestação de Contas, encontros voltados à apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova nos territórios: nos microterritórios do Vale do Aço, Parque Estadual do Rio Doce e Rio Casca e Adjacências, foram realizadas agendas para apresentação dos resultados dos Acordos de Cooperação Técnica, firmado entre os municípios e o Programa de Proteção Social da Fundação Renova e apresentação das ações realizadas para Coleta e Tratamento de Esgoto; em Santana do Paraíso (MG), São José do Goiabal (MG) e Bom Jesus do Galho (MG), foram realizados encontros para apresentação dos avanços do Sistema Indenizatório Simplificado; em Naque (MG) e Conselheiro Pena (MG), foram realizadas agendas para apresentação dos resultados das ações de Retomada das Atividades Agropecuárias, Coleta e Tratamento de Esgoto, Proteção Social e avanço do Sistema Indenizatório Simplificado.

Consolidação e entrega à Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) dos Planos de Ação Territoriais (PATs), documento que objetiva sistematizar o planejamento das ações do PG06 nos seus territórios de atuação, direcionadas à promoção de informação, transparência, participação e controle social em focos temáticos e agendas prioritárias da reparação e compensação.

Fatos relevantes do mês

Sobre o tema de Economia e Inovação: em Povoação (Linhares – ES), foi realizada agenda com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação sobre a inauguração de feira comunitária; em Barra do Riacho (Aracruz – ES), para apresentação do projeto Recoloca Rio Doce; no Médio Rio Doce, foi realizada reunião com comunidades para apresentação do projeto "O Impulso" voltado à capacitação, assessoria e acompanhamento para o desenvolvimento de empreendimentos rentáveis e eficientes.

Indicadores

Resposta	set/21	out/21	Acumulado
I.8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	9,23	8,61	8,95
I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	48,6	39	39
I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	7,31	5,79	6,67
I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	8,37	8,16	8,05
I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	8,96	8,55	8,84
I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	75	Indicador em fase de apuração ¹	4257 ²
I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	9,31	8,68	9,26

*Os indicadores **I.5** *Apresentação dialógica dos programas nos territórios*; **I.31** *Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova* **I.17 e I.32** *Percepção de efetividade dos espaços de Participação e controle social* são realizados por meio de pesquisa com a população atingida, realizada anualmente, conforme disposto na definição do programa. A pesquisa atualmente está em fase de consolidação dos dados.

1-A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

2-O indicador compreende os encaminhamentos de reuniões entre Janeiro/2019 e Setembro/2021.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
12.940,00	179,72

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	
abril de 2021	157	265,00
maio de 2021	458	
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	289,00
agosto de 2021	465	
setembro de 2021	222	
outubro de 2021	307	307,00

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Setembro	Outubro
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	86%	84%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	55,21	40,32

O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa por se iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Portanto, o processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	setembro de 2021	outubro de 2021
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	197.932	203.551
Canais: Número total de manifestações	849.391	870.208
Canais: Número de manifestações respondidas	788.132	808.938
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	132.589	133.519
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	21.498	24.469
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.366	13.414
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	681.938	698.806
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	7	5
Canais: Número de manifestações em tratamento	61.259	61.270

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Em apoio às atividades relacionada ao Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) e ao Programa de Indenização Mediada (PIM), foram realizados contatos ativos como público elegível para informar sobre o prazo limite para requerimento/ solicitação de atendimento.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

Mobilização de moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama – ES) e da avenida Beira Rio (Linhares – ES) para participação em Oficina Introdutória sobre Educação Financeira e reunião para esclarecimento sobre as tratativas para trincas e rachaduras de moradias impactadas pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã.

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações pendentes de respostas intermediárias ou finais, registradas em todas as unidades CIAs.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos fornecidos por este dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação junto aos públicos: Alinhamento e Planejamento para Retomada da Atuação Presencial nos Territórios - CIA e Dialogo (19/10); Treinamento | Contato Ativo PIM + Fluxo Ágil (22/10 e 28/10); Alinhamento sobre Reabertura CIAs (28/10).

Realização de alinhamentos técnicos com as equipes CIAs para planejamento do retorno dos atendimentos presenciais nas unidades físicas, esforço realizado pela Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento, em consonância com os direcionamentos da Fundação Renova quanto ao retorno estruturado das suas atividades presenciais com reabertura das unidades fixas dos Centros de Informação e Atendimento (CIA) e retomada dos atendimentos por meio das unidades móveis.

Indicadores

INDICADOR	Setembro	Outubro
Taxa de manifestações reincidentes (i.22)	39%	39%
Proporção de manifestações respondidas (i.24.a)	93%	93%
Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado (i.24.b)	72%	72%
Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco (i.2 e i.26.b)	98%	98%
Satisfação com a resolução das solicitações (i.27)	91%	92%
Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco (i.27.b)	98%	98%

*Os indicadores "Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs (i.2 e i.26.a)", "Oferta das informações solicitadas nos CIAs (i.27.a)" e "Satisfação com a estrutura física dos CIAs" não estão sendo medidos porque os espaços físicos dos CIAs encontram-se fechados por causa da pandemia de COVID-19. Assim que os centros forem reabertos para atendimento ao público, as medições serão iniciadas.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	7
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	48
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	3
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	10
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	44
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	21
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	94
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	362
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	89
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	43
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	76
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	562
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	139
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	30
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Total	68	70	139	141	142	134	1.530

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar 2º Semestre de 2021


DADO	jul	ago	set	out	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	2	4	0	6
ÁudioZaps produzidos	8	3	2	0	13
Carros de som produzidos	1	0	0	0	1
Cartilhas produzidos	1	2	1	1	5
E-mails de Marketing produzidos	3	17	5	1	26
Informes do Reassentamento produzidos	2	1	0	2	5
Jornais da Comunidade produzidos	12	12	15	10	49
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	77	18	70	184
Mídias Sociais produzidas	15	40	13	8	76
Newsletter produzidos	4	3	5	3	15
Outros itens produzidos	11	20	8	2	41
Pilulas de whatsapp produzidos	80	76	63	84	303
Rádios produzidos	16	38	25	13	92
Videoreportagens produzidos	0	0	1	0	1
Vídeos produzidos	5	5	4	4	18
VídeoZaps produzidos	1	0	0	0	1
Total	178	296	164	198	

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Rea... ● Jornal da Co... ● Matéria - Boleti... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

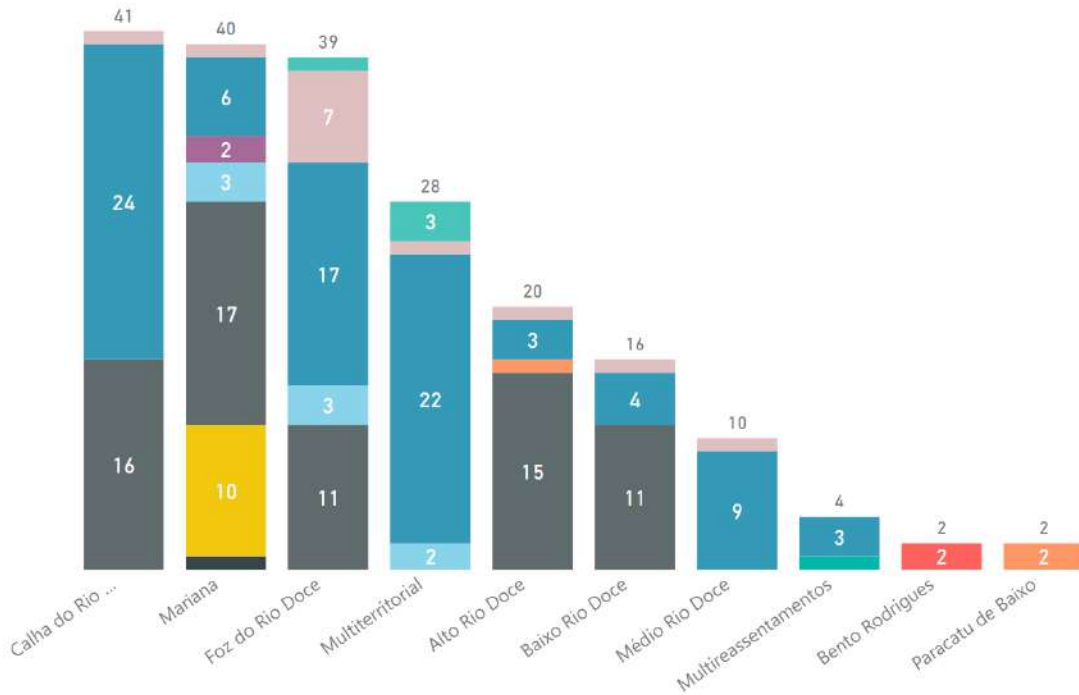


**Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.*

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentam... ● Jornal da Comunidade ● Matéria - Boletim J... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Baixo Rio Doce

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população do território Baixo Rio Doce.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula convidando moradores de Fernandes Tourinho para reunião temática do Diálogo sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 27/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos da região de Rio Casca e adjacências para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 28/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos da região do Vale do Aço para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 19/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de municípios do entorno do Perd para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 27/10.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Bugre para reunião sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Coletiva, no dia 18/10.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando atingidos da região de Rio Casca e adjacências sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de municípios do entorno do Perd para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 14/10.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando atingidos da região do Vale do Aço sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando atingidos de Bom Jesus do Galho, Dionísio e Pingo-d'Água sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando atingidos de municípios do entorno do Perd sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando atingidos de Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros e São Domingos do Prata sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp lembrando moradores de Bugre sobre reunião para falar sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) Coletiva, para ser compartilhada no dia do encontro.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar atingidos de Bugre, Caratinga, Ipaba, Ipatinga, Iapu, Santana do Paraíso, Sobralia e Fernandes Tourinho para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 26/10.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar atingidos de Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros e São Domingos do Prata para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 21/10.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz do Rio Doce

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população de Linhares, Aracruz e Sooretama.

Produção de pílula/convite para reunião com moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama) para esclarecimentos sobre a decisão judicial referente aos danos sofridos nos imóveis em função da instalação do barramento no rio Pequeno.

Produção de pílula, convidando à população de Patrimônio da Lagoa, Sooretama, a participar da oficina sobre educação financeira.

Alteração de convite enviado à comunidade de Regência para participação de reunião sobre abastecimento de água, informando que o encontro será presencial e não on-line.

Comunicação com Territórios

Veiculação de oito programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em outubro com um total de 48 programas, com 144 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Produção de newsletter sobre a pesquisa realizada pela Fundação Renova para saber como os atingidos avaliam as formas de comunicação e relacionamento com os territórios.

Criação de pílula convidando atingidos a enviarem perguntas a serem respondidas na rádio no programa Momento Renova.

Calha do Rio Doce

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população do território Calha do Rio Doce.

Produção de pílula para ser compartilhada no dia da reunião lembrando do encontro do Diálogo sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 27/10, em Fernandes Tourinho.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp para convidar os moradores da avenida Beira Rio, em Linhares, a participarem de reunião on-line para esclarecimento sobre o processo de reparação das casas danificadas em função do barramento.

Produção de pílula, alterando a data da reunião com os moradores para esclarecimentos sobre a questão do abastecimento de água na comunidade.

Produção de pílula, convidando à população de Linhares e a participar da oficina sobre educação financeira.

Mariana

Produção e distribuição digital da 16ª edição do jornal Voz da Comunidade, informativo com as comunidades de Mariana.

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população de Mariana.

Médio Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp para convidar a comunidade de Conselheiro Pena para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 20/10.

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito.

Produção e distribuição digital da edição extra do Boletim Jornada para a população de Governador Valadares.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Atendimento inédito de indenização é realizado com indígenas de Comboios.

Edital de apoio a grupos produtivos de pesca aquicultura é prorrogado até dia 22/10.

Empreendedores de Minas participam de palestra on-line sobre gestão de projetos e contratos.

Empreendedores mineiros participam de palestra on-line sobre gestão de compras.

Jovens recebem apoio para serem protagonistas na revitalização do rio Doce.

Municípios de MG e do ES recebem cerca de R\$ 370 milhões para investimentos em saúde.

Pagamentos de indenizações e auxílios financeiros mais que dobram em um ano e chegam a R\$ 6,5 bilhões.

Plataforma Recoloca Rio Doce é tema de palestra on-line para empreendedores mineiros.

Ronaldo Fraga e artesãos da coleção Minha Casa em Mim participam da 5ª Semana Criativa de Tiradentes.

Segurança do trabalho e qualidade de vida são temas de palestra on-line em Minas.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp com orientações sobre o que a pessoa deve saber sobre a contratação de um advogado para representá-la no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com os números dos pagamentos de indenizações e auxílios financeiros, que totalizaram R\$ 6,5 bilhões, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a identificação de requerente curatelado é obrigatória no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que atingidos de Mariana podem aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que ingressos de Mariana no Sistema Indenizatório tem até dois dias para confirmar seus danos.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo de adesão para atingidos de Senhora da Penha aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 31 de março de 2022.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado atende casos de atingidos falecidos após a data do rompimento.

Produção de pílula de WhatsApp para advogados informando que uma cláusula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi inserida no Portal do Advogado para confirmação de leitura.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção matéria para Rádio Renova para o território Médio Rio Doce sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção matéria para Rádio Renova para o território Foz do Rio Doce sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção matéria para Rádio Renova para o território de Mariana sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção matéria para Rádio Renova para o território Calha do Rio Doce sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção matéria para Rádio Renova para o território Baixo Rio Doce sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp explicando como funciona o rateio de honorários em casos de trocas de advogados no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo que os advogados devem estar atentos ao preenchimento das informações no Sistema Indenizatório Simplificado para que o pagamento não fique comprometido.

Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo que o nome do corpo hídrico deve ser informado na autodeclaração do requerente para a categoria Pesca Informal.

Produção de pílula de WhatsApp com orientações para advogados sobre regras para reingresso no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com orientações para advogados sobre o novo de acesso à aba recursal no Portal do Advogado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção matéria para Rádio Renova para o território Alto Rio Doce sobre o total pago em indenizações e auxílios financeiros, incluindo os R\$ 3,4 bilhões pagos a 35 mil atingidos pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de vídeo sobre prazos, regras e orientações sobre Aba Recursal, termos de aceite e outras informações sobre o Portal do Advogado e Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de vídeo da série Conhecendo o Sistema Indenizatório Simplificado sobre o tema Recursos.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Conceição da Barra que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Colatina que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Caratinga que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Cachoeira Escura que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Bugre que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Baixo Guandu que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Aimorés que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Aracruz que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Baguari que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Galileia que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Ipaba do Paraíso que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Ipaba que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Itueta que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Tumiritinga que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp sobre os laudos para comprovação de dependência direta do Rio Doce, seus afluentes e/ou região estuarina para comprovação de danos em Agricultura no Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Pingo-d'Água que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Ponte Nova que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Resplendor que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Revés do Belém que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Rio Doce que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de São José do Goiabal que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de São Mateus que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Sem-Peixe que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Senhora da Penha que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Elaboração de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre os pagamentos do Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp com informações para advogados sobre o Termo de Ciência de Danos.

Elaboração de pílula de WhatsApp informando que não haverá novos cadastramentos para fins do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de nota para o Momento Renova informando que 31/10 é o prazo final para atingidos de 28 localidades aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Linhares que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Marilândia que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Naque que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Periquito que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Produção de pílula de WhatsApp para informar atingidos de Santa Cruz do Escalvado que o prazo final de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado termina no dia 31/10.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de vídeo educativo sobre o Plano Básico Ambiental de Degredo.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção da 31ª edição do boletim informativo sobre o reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade atingida.

Produção da 32ª edição do boletim informativo sobre o reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade atingida.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira

Criação de newsletter de prestação de contas dos 6 anos do rompimento da barragem de Fundão com o direcionamento para o reassentamento de Gesteira.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção da 29ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção da 31ª edição do boletim informativo sobre o reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade atingida.

Produção da 32ª edição do boletim informativo sobre o reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade atingida.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de vídeo sobre projetos do Edital Doce que beneficiam crianças especiais.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula sobre a prorrogação do prazo das inscrições no Edital de Pesca para Grupos Produtivos.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula para informar a suspensão do edital de pesca para grupos produtivos.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Criação de pílula para divulgação dos acordos da audiência pública sobre alimentação animal.

Produção de pílula de WhatsApp convidando produtores para participarem do curso de Avicultura Caipira, realizado de forma online no dia 07/10, em parceria com a Emater.

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de e-mail marketing sobre a 9ª palestra sobre Gestão de Projetos e Contratos do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando a 8ª palestra sobre Recoloca Rio Doce do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para Linhares.

Publicação de post nas redes sociais sobre a 8ª palestra sobre Recoloca Rio Doce do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para Colatina.

Publicação de post nas redes sociais sobre a 9ª palestra sobre Gestão de Projetos e Contratos do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula de WhatsApp divulgando as inscrições para contratação do Programa Aprendiz.

Produção de pílula-reforço sobre inscrições para contratação do Programa Aprendiz.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Produção de pílula de WhatsApp para lembrar aos inscritos na oficina de associativismo e cooperativismo sobre as datas.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as inscrições para participar da oficina de Associativismo e Cooperativismo promovida pela Economia e Inovação.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Criação de pílula convite para rodada de negócios entre fornecedores do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e construtoras dos reassentamentos.

Produção de pílula convidando os moradores de Degredo a fazerem a pré-inscrição para os cursos de capacitação profissional.

Produção de pílula para divulgar vagas de emprego disponível na plataforma Recoloca Rio Doce para Governador Valadares e Aimorés.

Produção de pílula para pesquisar, entre os pré-inscritos nos cursos de capacitação profissional de Povoação, quem já está vacinado contra a Covid.

Produção de programa de rádio sobre o lançamento do novo ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores ES (Linhares e Colatina).

Publicação de post nas redes sociais sobre as inscrições nos cursos de capacitação profissional de Degredo.

Indicadores

O Programa 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar de Comunicação dependem da realização de pesquisas. Nesse sentido, as áreas responsáveis dentro do programa já deram início aos processos necessários para realização das pesquisas.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1180 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 157 adoções, 359 restituições, 173 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 449 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 339 bovinos, 58 equinos, 31 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1707 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Entrega de três animais que foram adotados nas ações virtuais do Programa (2 cães e 1 bovino).

Indicadores



Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno de 2021. O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/21 está previsto para o relatório de dezembro de 2021 (ref. novembro/21).

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

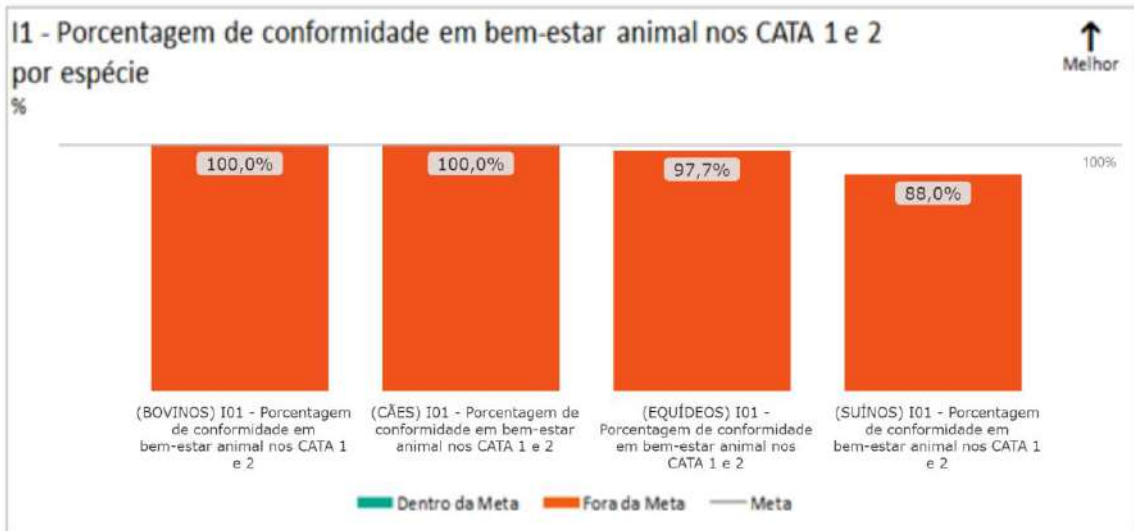


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o bimestre referente aos meses de setembro e outubro de 2021, não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção, mantendo-se o valor reportado no bimestre anterior.

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de Janeiro de 2022 (referência ao bimestre nov./dez. de 2021).

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 204 **famílias**;

Executivo:

- Em andamento construção de 95 **casas**;
- Conclusão de 10 **casas**;
- Conclusão de 03 **bens públicos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde);
- Total de 02 **contratos assinados** para construção de casas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais** concluídos para 175 casas, 23 lotes e 15 de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 172 casas, 23 lotes e 13 bens públicos;
- **Projetos básicos protocolados na prefeitura** de 157 casas e de 22 lotes vagos.
- Licenças simplificadas para 12 **lotes**;
- **Alvarás Emitidos:** Para 151 edificações, 21 lotes vagos e 4 bens Coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Início das atividades da empresa Cardan nos ID's 24 e 150.

Errata referente ao CIF de Setembro_21:

Início de 2 casas do novo aditivo da HTB (IDs 135-1 e 135-2);

Errata referente ao CIF de Setembro_21:

Início de 10 casas do contrato da Cardan (ID's 61, CC137A1, 75, 81, 110, 210, 120A, 223, 225 e 182);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 78 **famílias.**

Executivo:

- Em construção 06 **casas.**

Engenharia:

- **Projetos conceituais** concluídos para 65 **casas**, 5 **lotes** e 12 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** concluídos para 60 **casas**, 04 **lotes** e 10 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** protocolados na prefeitura para 48 **casas**, 9 **bens públicos** e 03 **lotes vagos.**
- **Alvarás Emitidos:** Para 44 edificações, 06 bens coletivos e 03 lotes vagos.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Mobilização do canteiro de obras da empresa Hexágono.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 09 **famílias;**
- Acordos homologados com 28 **famílias;**
- Total de 19 **imóveis** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- Atendimento para 135 **famílias**;
- Aquisição de 74 **imóveis** para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia.
- Em construção 43 **imóveis**.
- Reforma de 23 **imóveis**;
- Entrega de 08 **lotes vagos**;
- Atendimento a 09 **famílias** na modalidade de Reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 12 **casas** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 06 **casas** (edificação principal) nas Comunidades Rurais;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia

- Projetos conceituais finalizados para 56 **imóveis**, sendo para 35 **casas novas**, para 18 **reformas de casas** e para 3 **lotes vagos**;
- Projetos básicos para reformas de 15 **imóveis** e para construções de 30 casas e 01 lote vago.
- Licenças, alvarás/dispensa rural protocolados na Prefeitura ou não necessário para 30 **construções de casas novas**.
- Licenças simplificadas protocolados na Prefeitura ou não necessário para reforma de 17 **casas**.
- Licenças ou não protocolados na Prefeitura para 3 **lotes vagos**;
- Dispensas de licença emitidas ou não necessário para 3 **lotes vagos**;
- Licenças emitidas para 20 **casas Novas**;
- Licenças simplificadas emitida para reforma de 13 **casas**.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Conclusão e entrega do ID 31;

Conclusão e entrega da reforma do ID 307.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores

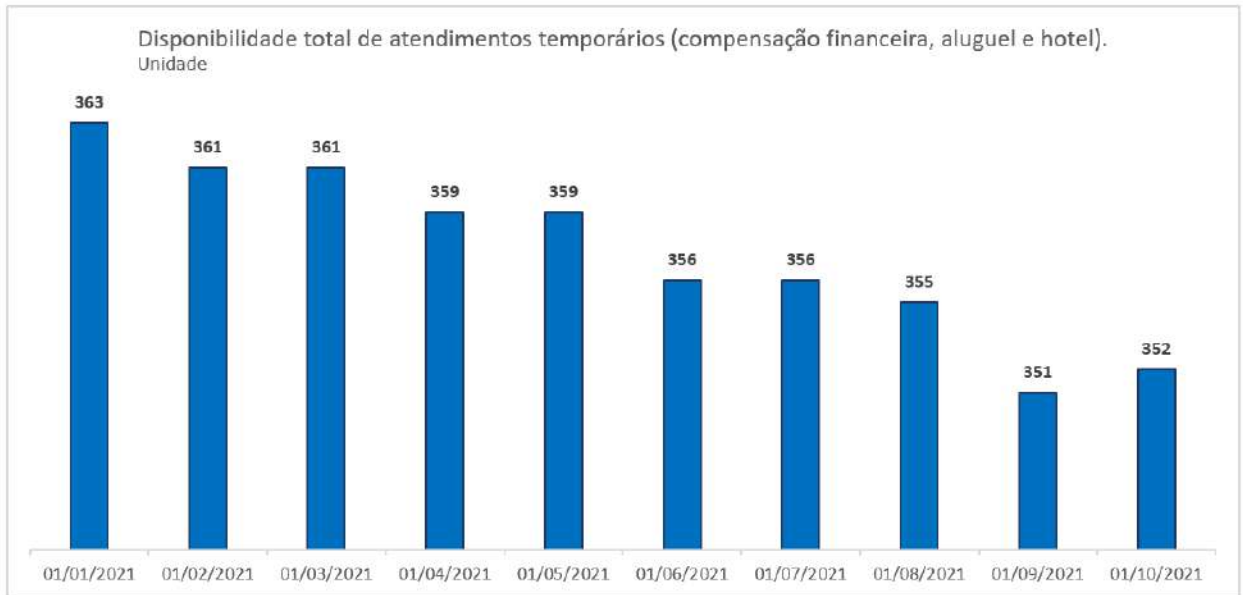


Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Cumprido internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Cumprido parcialmente
Deliberação	30	N/A	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.1	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.2	Cumprida internamente
Deliberação	225	2	Cumprido internamente
Deliberação	286	3	Cumprida internamente

Entregas do programa

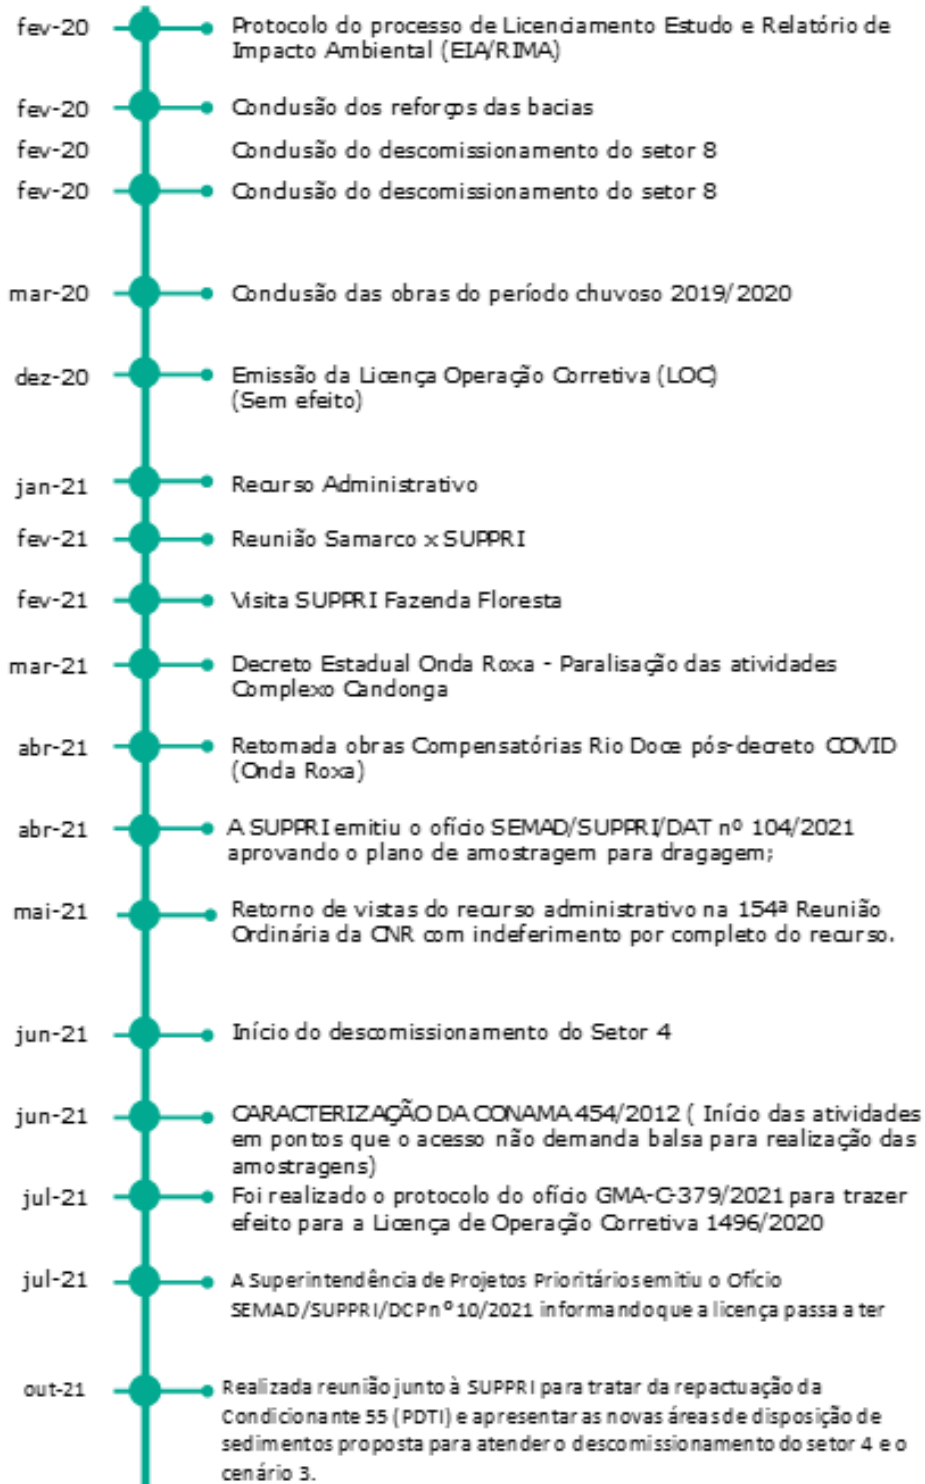

Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Fatos relevantes do mês

➤ Descomissionamento do setor 4

✓ Volume executado até 24/10:

- Remoção de sedimentos: 262.940 m³
- Disposição de sedimentos: 80.420 m³



Figura 1- Vista à jusante do Dique Setor 4



Figura 2 - Vista do Dique Setor 4

Fatos relevantes do mês

✓ Áreas de disposição de sedimentos:

✓ Setor 11



Figura 3 – Setor 11

✓ Bacia 2A



Figura 4 – Bacia 2A

Fatos relevantes do mês

Remoção de Sedimentos Região dos 400m

➤ Execução de Ponto de Apoio (Status:29/10/2021)

Atividades	Quantidade				
	Total Previsto	Total Revisado	Previsto até a data	Realizado até a data	Saldo
Cravação de estacas	124 und	124 und	124 und	54 und	70 und



Figura 7 - Execução de cravação de estacas

➤ **Recuperação dos pontos de margens**

✓ Execução de recuperação do ponto de margem 23

- Remoção do terramesh
 - Volume executado: 9.187 m³
 - Concluído em: 28/10/2021
- ✓ Próximos passos (execução em 2022):
 - Cortina atirantada

Fatos relevantes do mês



Figura 8 - Vista aérea Ponto 23



Figura 9 - Remoção de terramesh

✓ Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Total Previsto	Concluído até a data	A Executar
MARGEM ESQUERDA	56 und	35 und	21und
MARGEM DIREITA	23 und	15 und	8 und
TOTAL			29 und

Fatos relevantes do mês

✓ Plano de Chuvas 2021/2022

- Setor 1: Em execução o levantamento topográfico atualizado da região para verificação da necessidade de adequação para o período;
- Setor 5 e Setor 11: Drenagem superficial em dimensionamento (método racional e TR de 25 anos para as estruturas provisórias);
- Elevação considerada do Rio Doce no período chuvoso: El. ~318,00

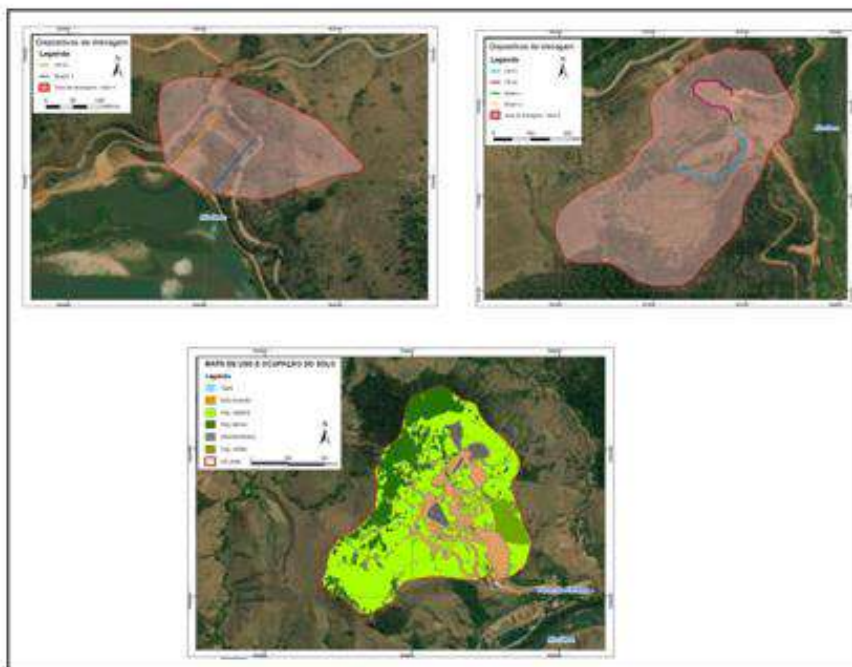


Figura 10 - Setores 1, 5 e 11


Fatos relevantes do mês

- Reabilitação da UHE - Risoleta Neves
- ✓ Avanço por frente de serviço

Atividades	Status	Avanço Físico
Projeto total	☹️	49,3%
Canteiro	😊	100%
Engenharia e Suprimentos	😊	98%
Materiais de Fornecimento	😊	100%
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	☹️	80%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	☹️	71%
Comporta vagão Tomada d'água	☹️	83%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água	☹️	9%
UG1- Atividades na Casa de Força	☹️	68%
UG2- Atividades na Casa de Força	☹️	63%
UG3- Atividades na Casa de Força	☹️	0%
Transformador Elevador	☹️	63%
Vertedouro	☹️	29%
Comissionamento sem água	☹️	0%
Comissionamento com água	☹️	0%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹️	0%

Figura 11 - Avanço Físico Reabilitação das UG's


Reabilitação das UG's
Avanço Físico 06/10/21

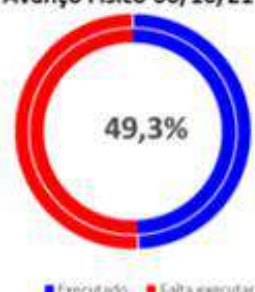

Atividade de Limpeza	UG#1	UG#2	UG#3	Avanço Físico
Projeto Total	☹️			63,6%
Limpeza das Galerias dos Stop Log	😊	😊	😊	100%
Desobstrução das ranhuras	😊	😊	😊	100%
Limpeza da pista de contato da comporta	😊	😊	😊	100%
Descida do Stop Log	😊	😊	😊	100%
Drenagem das Máquinas	😊	😊	😊	100%
Limpeza da Caixa espiral	😊	😊	😊	100%
Limpeza do tubo de sucção	😊	😊	😊	100%
Retirada das grades de Montante	☹️	☹️	☹️	0,0%
Limpeza final da sucção	☹️	☹️	☹️	0,0%
Limpeza dos drenos	☹️	☹️	☹️	0,0%
Dragagem do Canal de fuga	☹️			0,0%

Figura 12 - Avanço Físico Limpeza das UG's

Limpeza das UG's
Avanço Físico 06/10/21



Nota: Atividades de responsabilidade do Consórcio Candonga.

Fatos relevantes do mês

✓ Atividades executadas no período:

Reparo das Ogivas das unidades UG1 e UG2, montagem da UG1, recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG2, recuperação do lado jusante do vertedouro VT1, Sistema de resfriamento, Recuperação das comportas da tomada d'água, Fabricação das talas do vertedouro, reabilitação do STP – Sistema de Transposição de Peixes, limpeza entre as comportas e a descida do conduto forçado, limpeza da sucção.

✓ Fatos relevantes:

Não foi possível deslocar as grades em dois dos vãos, portanto a atividade de mergulho para retirada de tomada d'água foi suspensa. Será necessário cortar e fabricar novas grades e por essa razão as atividades de mergulho serão retomadas somente em abril/2022.



Figura 13 - Limpeza Entre a Comporta e a Descida do Conduto e recuperação do braço do vertedouro VT1

Fatos relevantes do mês



Figura 14 - Reabilitação do STP – Sistema de Transposição de peixes



Figura 15 - Montagem da UG1

Fatos relevantes do mês



Figura 16 - Pintura Caixa Espiral



Figura 17 - Sistema de resfriamento

Fatos relevantes do mês

MONITORAMENTO

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

✓ Destaques:

- Os sensores SAT instalados nos barramentos metálicos não indicaram deslocamentos significativos.
- As leituras nos tilt meters instalados nos três barramentos registraram deslocamentos dentro do nível normal de operação.
- A retirada da ADME OE está em andamento, com cerca de 90% do material destinado para a ADME 1. Os extensômetros 1, 2 e 4 foram descomissionados devido ao avanço das obras.
- O monitoramento dos marcos superficiais da Pedreira Corsini não indica tendência de deslocamento.
- Constatações:

Após o lançamento de enrocamento a jusante do Barramento A, as cotas dos perfis obtidos nos levantamentos de GPR encontram-se acima da referência estabelecida pela SPEC;

Os deslocamentos registrados nos barramentos metálicos se encontram dentro dos níveis normais de operação.

Fatos relevantes do mês

- Recomendações:
 - Aprimorar o monitoramento da Pedreira Corsini e margem esquerda do Córrego Micaela;
 - Finalizar a instalação dos instrumentos na Pedreira Corsini;
 - Finalizar a instalação das bases dos prismas na ADME OD para monitoramento dos deslocamentos na estrutura;
 - Aprimorar o monitoramento da ombreira direita do córrego Micaela;
 - Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações referentes ao período da campanha, o qual não necessariamente coincide com o mês de referência do reporte.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- ✓ Entrada e saída: Síntese Conclusiva: Sem desvios no período_ Monitoramento: Ponto seco, não houve efluente sendo bombeado para a bacia 1;
- ✓ Lançamentos de Montante e Jusante: Síntese Conclusiva: Sem desvios no período _ não houve efluente bombeado para as Bacias 2A e 2B ou para a Bacia 1 no período. Monitoramento: Desvio de ferro dissolvido no ponto *de jusante* da Bacia 1 no rio Doce;
- ✓ Realizado monitoramento para linha de base do rio Doce;

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 1:



Figura 18 - Setor 1

Síntese conclusiva:

- ✓ Montante e jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco;
- Executado dreno do tubo de direcionamento do efluente do Setor 1, visando filtragem de eventuais sedimentos advindos do local, direcionando-os para jusante na tubulação que desagua no rio Doce (excluindo contribuições da obra).



Figura 19 - Dreno do tubo de direcionamento de efluente do setor 1

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento e controle: Descomissionamento Setor 4



Figura 20 - Montante Córrego dos Borges



Figura 21 - Montante Barramento Setor 4 - Entrada



Figura 22 - Jusante do Dique Setor 4

- Melhorias implementadas/em implementação - outubro/21:

Fatos relevantes do mês



Figura 23 - Melhorias Descomissionamento Setor 4

- Executado dreno filtrante para filtragem de sedimentos advindos do local onde havia o Dique do Setor 4, retirado no descomissionamento.
- **Monitoramento de Efluentes – Córrego dos Borges**



Figura 24 - Montante Córrego dos Borges

Síntese conclusiva:

Montante: Sem desvios para o período

- ✓ Jusante: Desvios pontuais nos parâmetros turbidez nos dias 04/09.

Fatos relevantes do mês

Nota: O desvio identificado no mês de Set/21 está sendo reportado neste relatório (out/21) em razão dos prazos necessários para cada um dos métodos analíticos de análise laboratorial dos parâmetros.

▪ Monitoramento de Efluentes – Setor 4

- ✓ Montante e jusante Setor 4: Síntese conclusiva: Ponto Seco
- ✓ Entrada Setor 4: Efluente bruto sem desvios em turbidez no período;
- ✓ Saída Setor 4: Não houve desvios para o período.

Monitoramento à montante do barramento:

- ✓ Entrada: Desvio pontual de manganês dissolvido à montante do barramento (13/09);
- ✓ Saída: Sem desvios para o período.

Nota: O desvio identificado no mês de Set/21 está sendo reportado neste relatório (out/21) em razão dos prazos necessários para cada um dos métodos analíticos de análise laboratorial dos parâmetros.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5A:



Figura 25 - Setor 5A

Síntese conclusiva: Montante e jusante: Pontos Secos

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5B



Figura 26 - Setor 5B

➤ Síntese conclusiva: Montante e jusante: Pontos Secos

✓ Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

- Monitoramento Hídrico Superficial realizado no curso d'água no Córrego dos Borges no período identificou parâmetros atendendo à normativa;
- Monitoramento Hídrico Superficial realizado no Rio do Peixe e no córrego Micaela, e foram identificados no período desvios nos parâmetros Manganês e/ou Ferro Dissolvido associados a elementos naturais (background) da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.
- Não houve desvios nos monitoramentos diários para o período de reporte.

✓ Monitoramento Atmosférico

Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

Fatos relevantes do mês

- ✓ Gestão Ambiental
- Desmobilização da Baía de Resíduos Allonda



ANTES



DEPOIS

especs
 Certificado de Destinação Final CPF Nº 8377342021

Página 1 de 2

Período: 21/07/2021 até 27/09/2021

Empresa: ME Soluções Ambientais - 20193, CPF/CNPJ: 07.204.890/0001-40 certifica que recebeu, em sua unidade de destino (362), do Gerador indicado e recipiente relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos sólidos abaixo:

Identificação do Gerador				
Nome Gerador: Alameda Indústria S.A. - ILSAUL	CPF/CNPJ: 14.040.779/0001-91			
Endereço: Av. Tancredo Neves	Município: Barão	UF: SP		

Identificação dos Resíduos				
Resíduo	Classif.	Quantidade	Unidade	Remessa
1.171201 - Óleo lubrificante separado de motor, óleo de cozinha, óleo e materiais sintéticos e outros resíduos orgânicos	Class 1	44000	Tonelada	Ano 2020 - I

CPF - RESÍDUOS

✓ Figura 27 - Antes e depois área de locação baía de resíduos

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

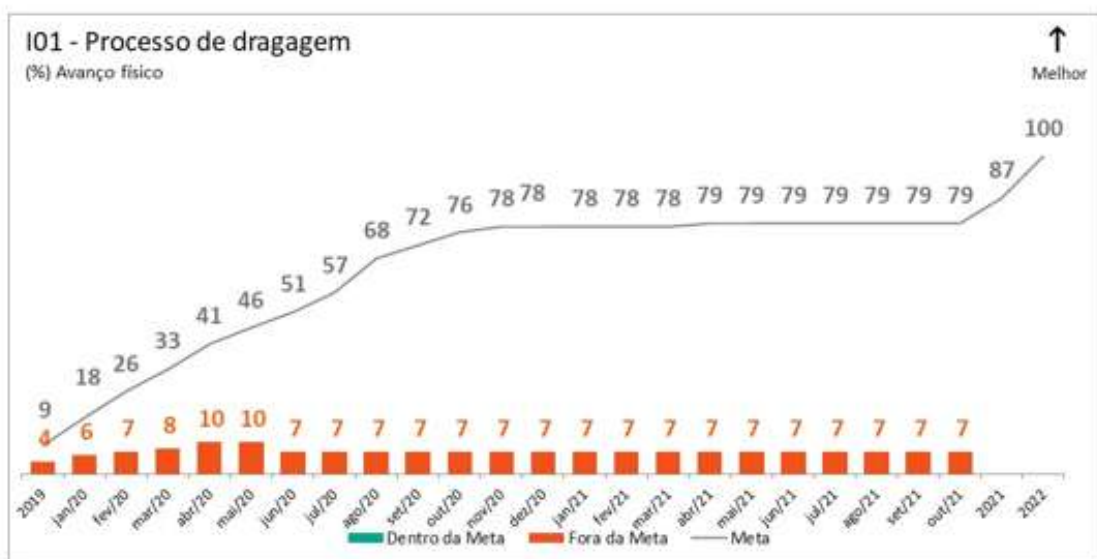


Gráfico 1. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

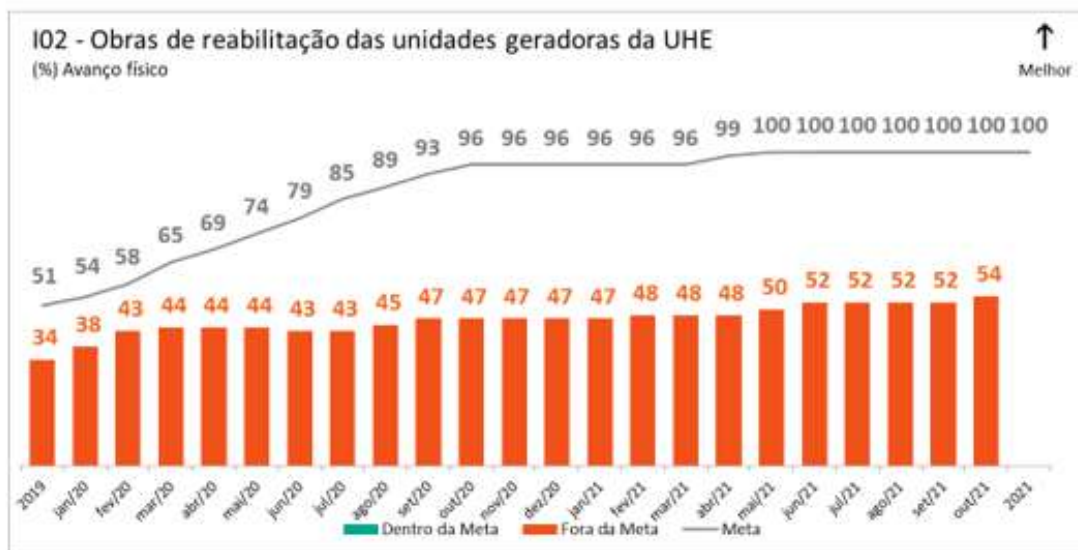


Gráfico 2. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

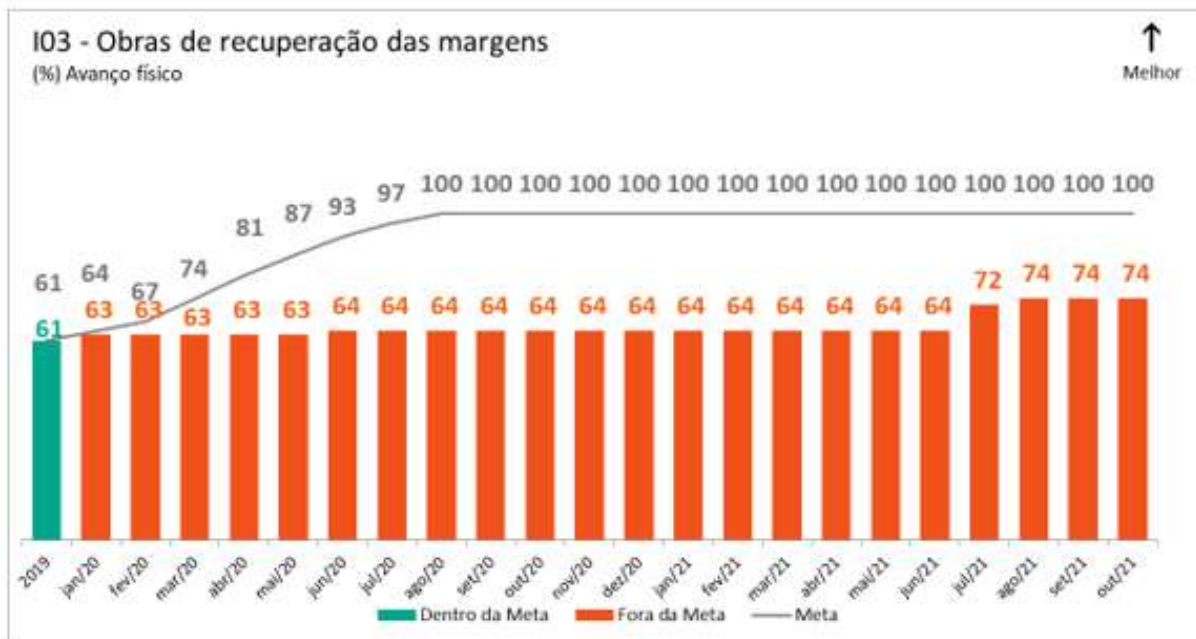


Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

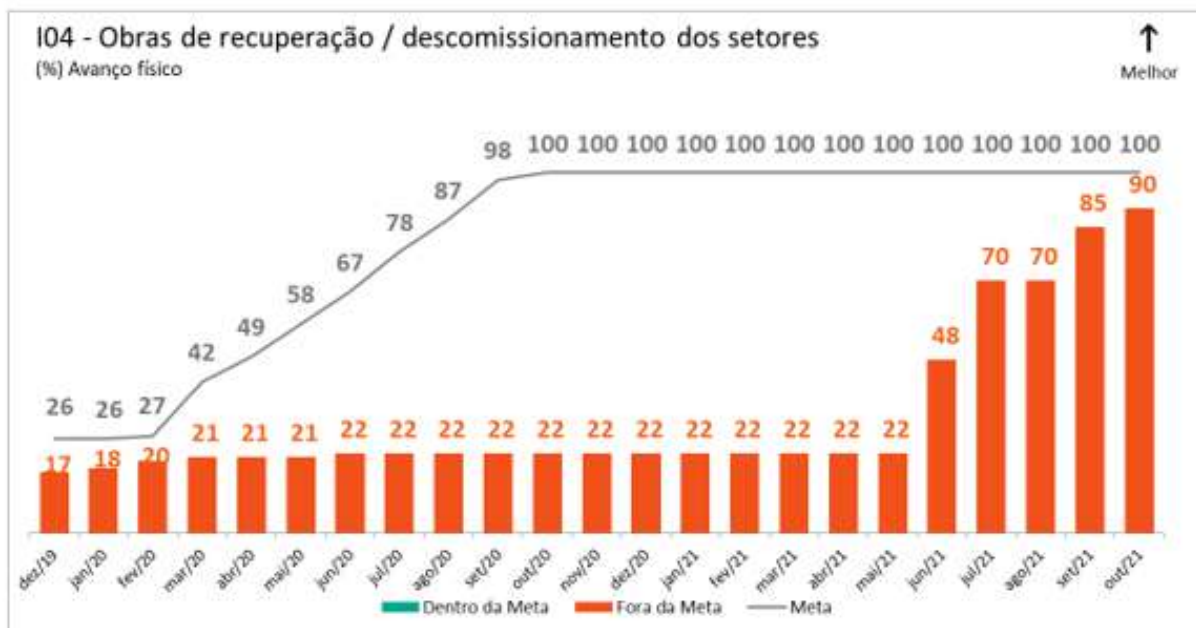


Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

Nota: A Samarco está empenhada em apresentar dados mais significativos, à luz dos desdobramentos de estudos e atividades imprescindíveis que se encontram em desenvolvimento e que serão concluídos num futuro próximo.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.694 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 936 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.785 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 81
- Concluído sem termo: 8
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

Fornecedor atual apresentando baixa performance (RGL);
Nova contratação em andamento para substituição do mesmo;

Execução de dreno do piso de areia da arena do parque;
Início das atividades de base e sub-base de pavimentação interna do parque;
Abertura de SR para nova contratação de obras civis (Barra Longa e Mariana);
Realização de visita técnica com as proponentes para reconstrução das pontes.

Indicadores

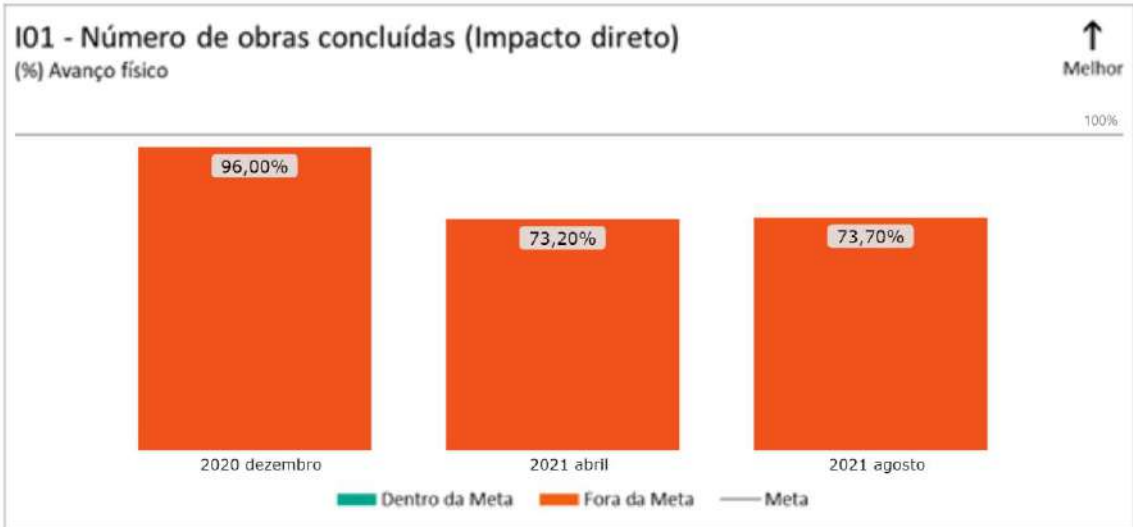


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

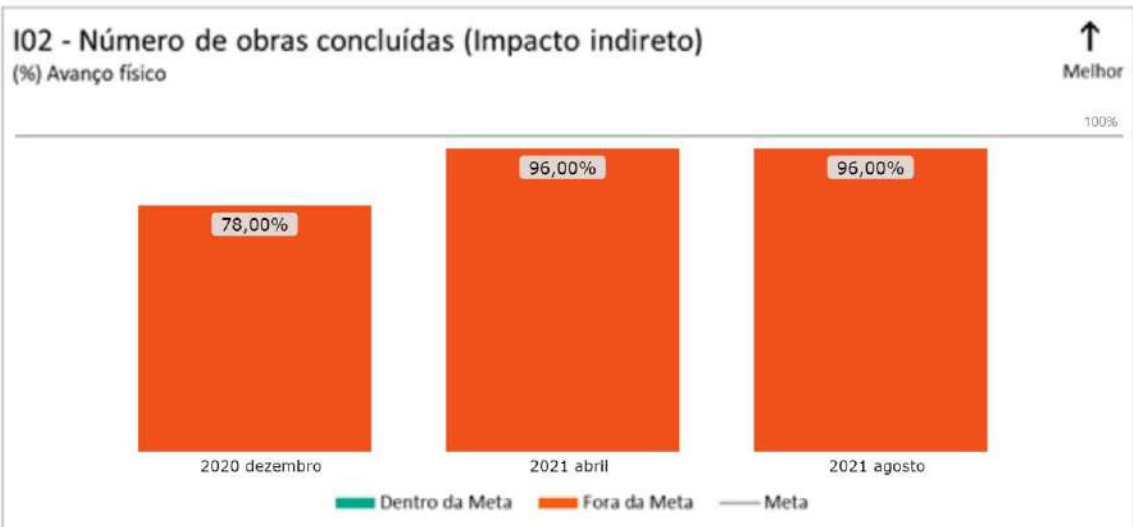


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

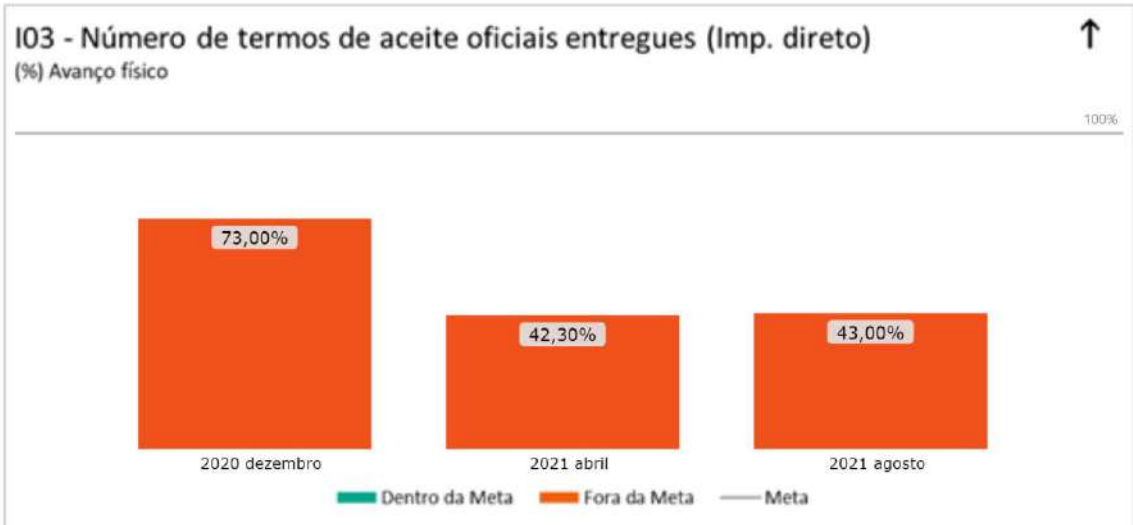


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

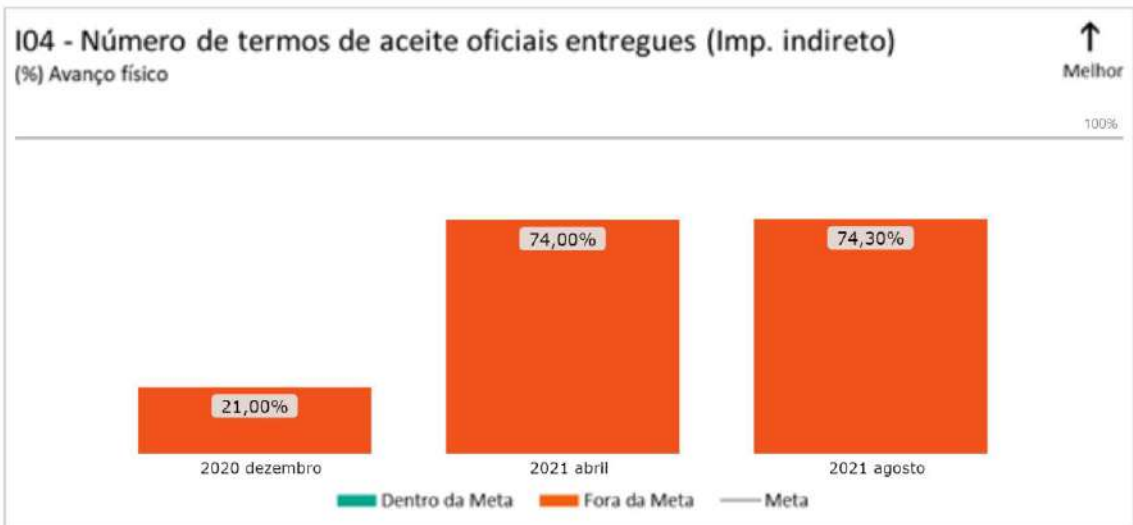


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Apoio Psicopedagógico: Realizado 1º Encontro de Formação de Professores/2021 – Escola Municipal Bento Rodrigues.

Finalização dos reparos estruturais para o retorno das aulas presenciais na escola municipal José Vasconcelos Lanna, Barra Longa.

Apoio Pedagógico: Mobilização dos colegiados das escolas municipais de Mariana para finalização dos Projetos Políticos Pedagógicos.

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
junho de 2021	●	Início das ações de reparação das Referências Culturais
agosto de 2021	●	Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
outubro de 2021	●	Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
dezembro de 2021	●	Oficinas sobre Educação Patrimonial
dezembro de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
dezembro de 2021	●	Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
dezembro de 2021	●	Conclusão do calendário 2021 de apoio as manifestações culturais
dezembro de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Visitas técnicas da equipe da UNESCO nas comunidades de Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, para estruturação de ações do Plano de Reparação junto as comunidades.

Retomada das atividades de formação na casa dos Saberes para as comunidades deslocadas com início de turma de curso de Corte e Costura no dia 16/10/2021.

Reparação de equipamentos de som para a arquidiocese e comunidade de Gesteira para a realização das manifestações culturais.

Apoio a quatro manifestações culturais locais (Festas de Nossa Senhora Aparecida em Bento Rodrigues, Campinas e Ponte do Gama; Manhã de Lazer em Barra Longa

Indicadores




Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

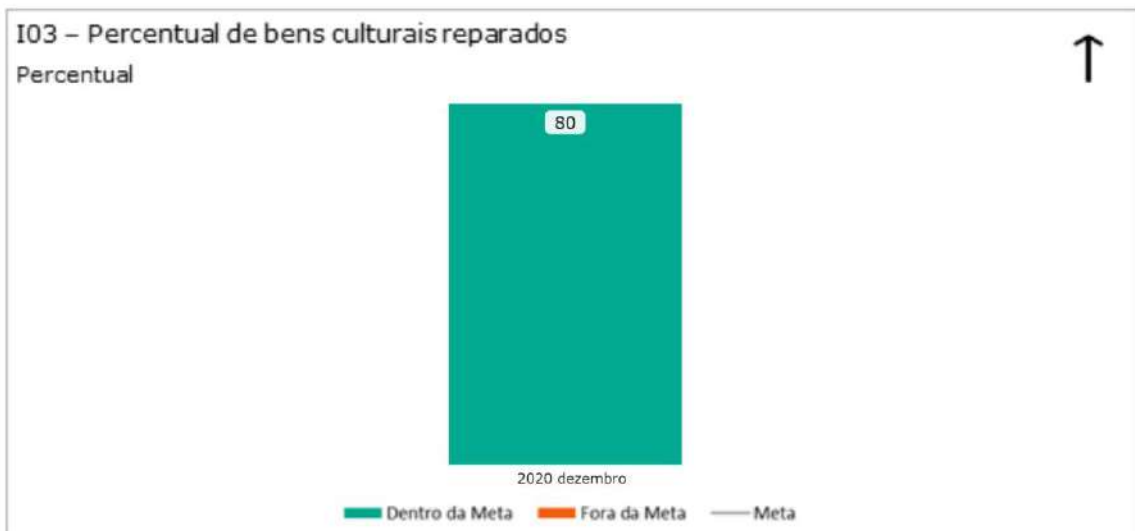


Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades





Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021  Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- agosto de 2021  Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidades
- dezembro de 2021  Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- dezembro de 2021  Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização do terceiro encontro do processo formativo do projeto de incentivo à leitura, com a participação de 111 funcionários das bibliotecas públicas municipais de 37 municípios da área de abrangência socioeconômica.

Realização de workshops e oficinas para definição e realização de ações estruturantes para os Arranjos Produtivos Locais. Início da capacitação de 25 empreendedores dos polos turísticos em turismo de experiências e de base comunitária, empreendedorismo e marketing digital.

Início do processo formativo do Projeto de Fortalecimento Institucional da Cultura e do Esporte – FICE, com 114 funcionários e gestores públicos inscritos de 34 municípios da área de abrangência socioeconômica (meta da gerência, 78 funcionários e gestores públicos das temáticas de cultura e esporte capacitados).

Disponibilização de apoio técnico para elaboração dos planos participativos de turismo dos municípios complementares ao polo turístico de Marliéria. Realização de oficinas de construção participativa dos planos de turismo de Timóteo e Ipatinga em Minas Gerais (cláusula 104b).

Certificação de 169 organizações locais que concluíram o processo formativo do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais - FOL (meta da gerência de 150 organizações capacitadas).

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13) aprovado pelo CIF (Deliberação CIF nº 532, de 15 de setembro de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Concluído Internamente
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

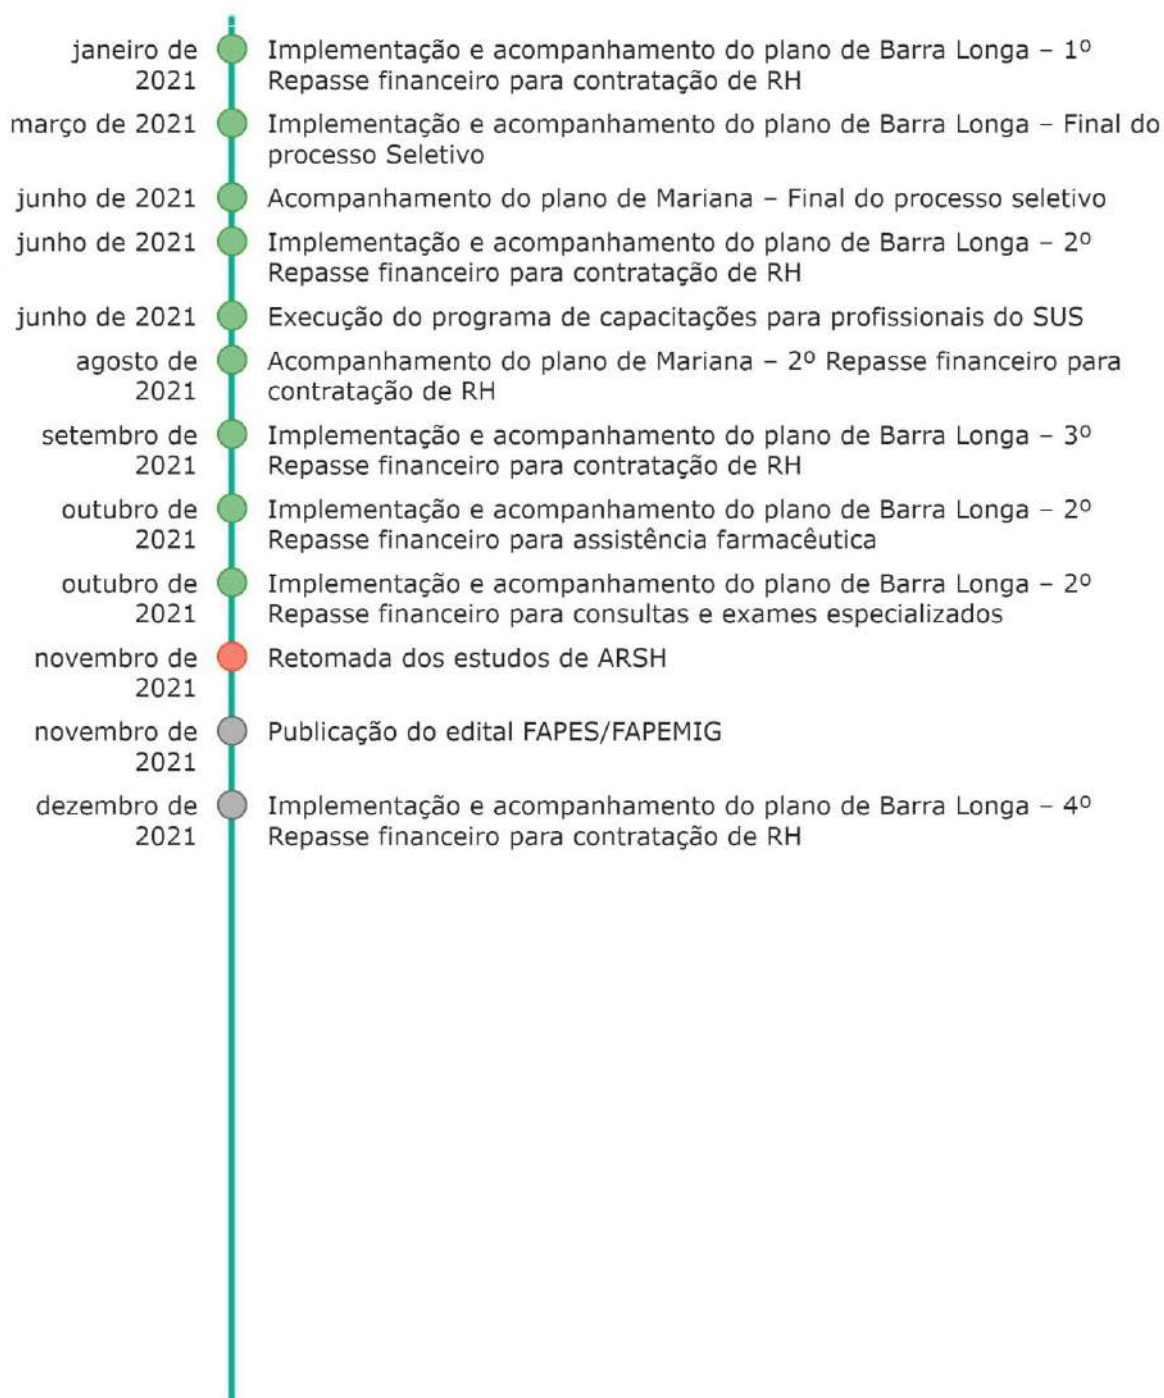

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 24 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (8 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Aguarda-se a atualização deste número de consultas no período de abril a setembro/21. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

2º repasse financeiro no valor de R\$150.000,00 para assistência farmacêutica.

2º repasse financeiro no valor de R\$25.000,00 para complementação de exames e consultas especializadas nas áreas de cardiologia, dermatologia e pneumologia pela CISAMAPI.

Realização da segunda Reunião de Trabalho referente à avaliação do cumprimento das Cláusulas do Acordo Judicial.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 08 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante vem sendo substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a homologação de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (08 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de outubro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação






Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021  Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
- novembro de 2021  Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural
- novembro de 2021  Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
- dezembro de 2021  Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
- dezembro de 2021  Início do Projeto Empreende Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Divulgação do resultado do Edital do Programa Mariana Labs em 07/10 e início da Rodada de Aceleração em 14/10.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras





Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021  Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
- setembro de 2021  Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
- outubro de 2021  Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
- dezembro de 2021  Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

Nota: entrega do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Relatórios Territoriais Foz do Rio Doce – Litoral, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Alto do Rio Doce, foram reprogramados para 2022.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (200 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (145 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 187 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 10/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 162 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 4311 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 876 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Suspensão do edital de Apoio aos Grupos Produtivo mediante deliberação CIF 542/21

Entrega do primeiro relatório semestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os pescadores e aquicultores em atividades alternativas nos projetos Cultivando para Pescar, Associativismo e Cooperativismo e, de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela Fundação Renova.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Os cursos da EMATER programados para término em outubro/2021 foram reprogramados para término em 2022, mediante aditivo que cobre o prazo paralisado devido COVID, em seu novo formato on-line.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, sendo 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 192 são do PASEA planejados sendo que 189 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 10 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 154 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 31 não aderiram e 4 estão em análise pelo produtor;
- 52.613,7 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 228,7 toneladas no mês;
- 10.983,5 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades;
- 458 barraginhas realizadas;
- 896 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 188 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.966 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 4.771 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 7.768 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 37.509 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 4.580 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 4.080 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 482 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 10 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

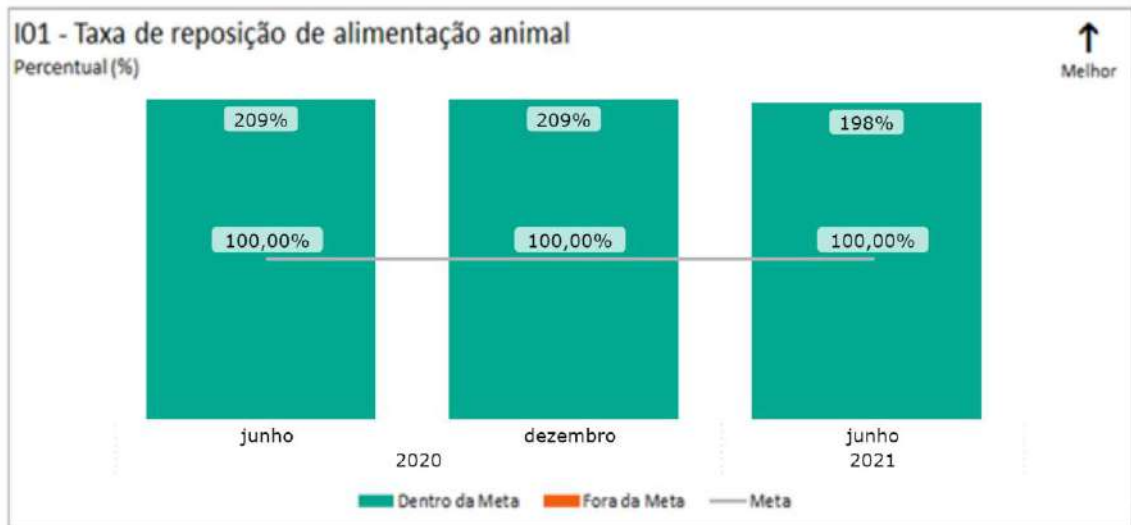


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	N° de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / n° de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	N° de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- janeiro de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
- junho de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 59,05 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 48 milhões foram **desembolsados** para 1475 contratos e 1146 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 424 contratos e 403 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Setembro/2021

Fatos relevantes do mês

- Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (ES) - Emitida Carta de Anuência pela Prefeitura de Conceição da Barra para andamento do processo de licenciamento obra no Assentamento Valdício Barbosa.
- Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (MG) – Foram realizados seminários nas comunidades de Águas da Prata I, Águas da Prata II e 1 de Junho.

Indicadores

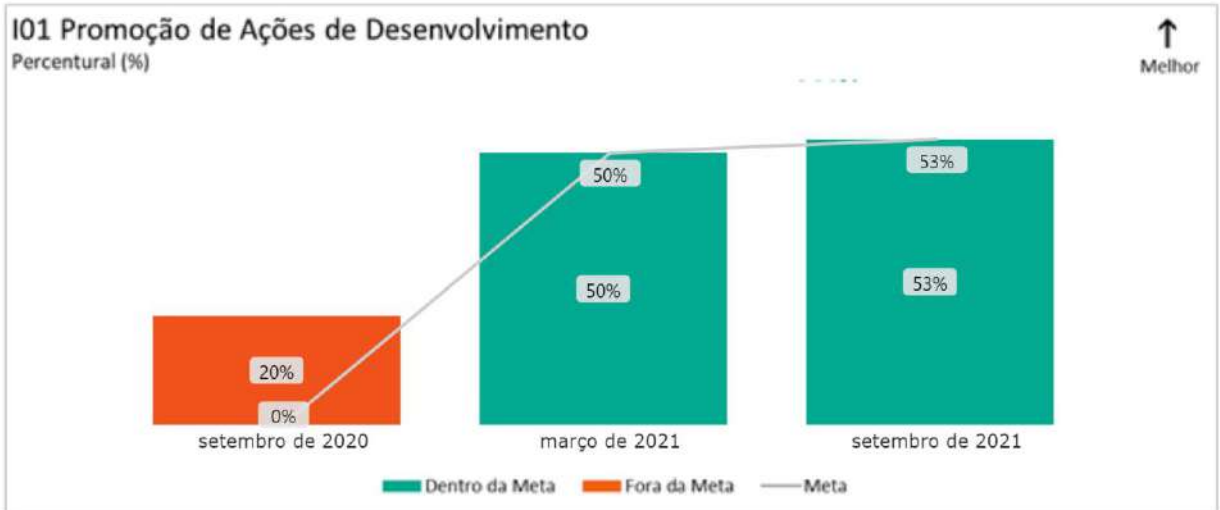


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

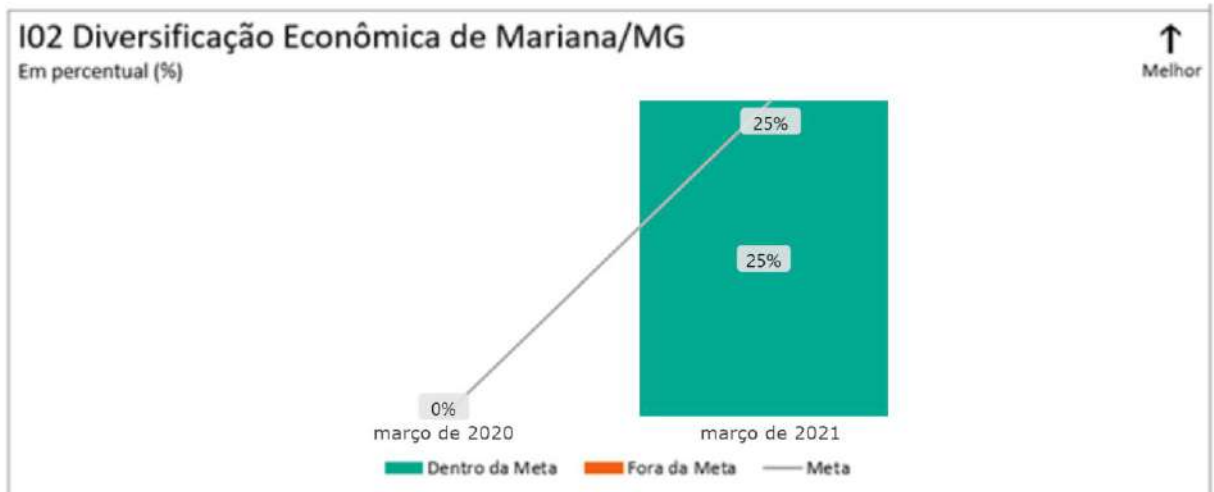


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- novembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

353 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 395 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 188 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 1 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (600) ultrapassa a quantidade total de atendidos (353). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Participação da Coleção Minha Casa em Mim na Semana Criativa de Tiradentes/MG.

Finalização de diagnósticos - situação atual dos negócios considerando aspectos financeiros, de mercado, jurídicos, organizacionais, de produção, entre outros e definição de estratégias de 73 negócios de Linhares (Regência e Povoação). *Dados acumulados até outubro 2021.

Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 29 negócios atingidos. *Dados acumulados até outubro 2021.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em dezembro/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em dezembro/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

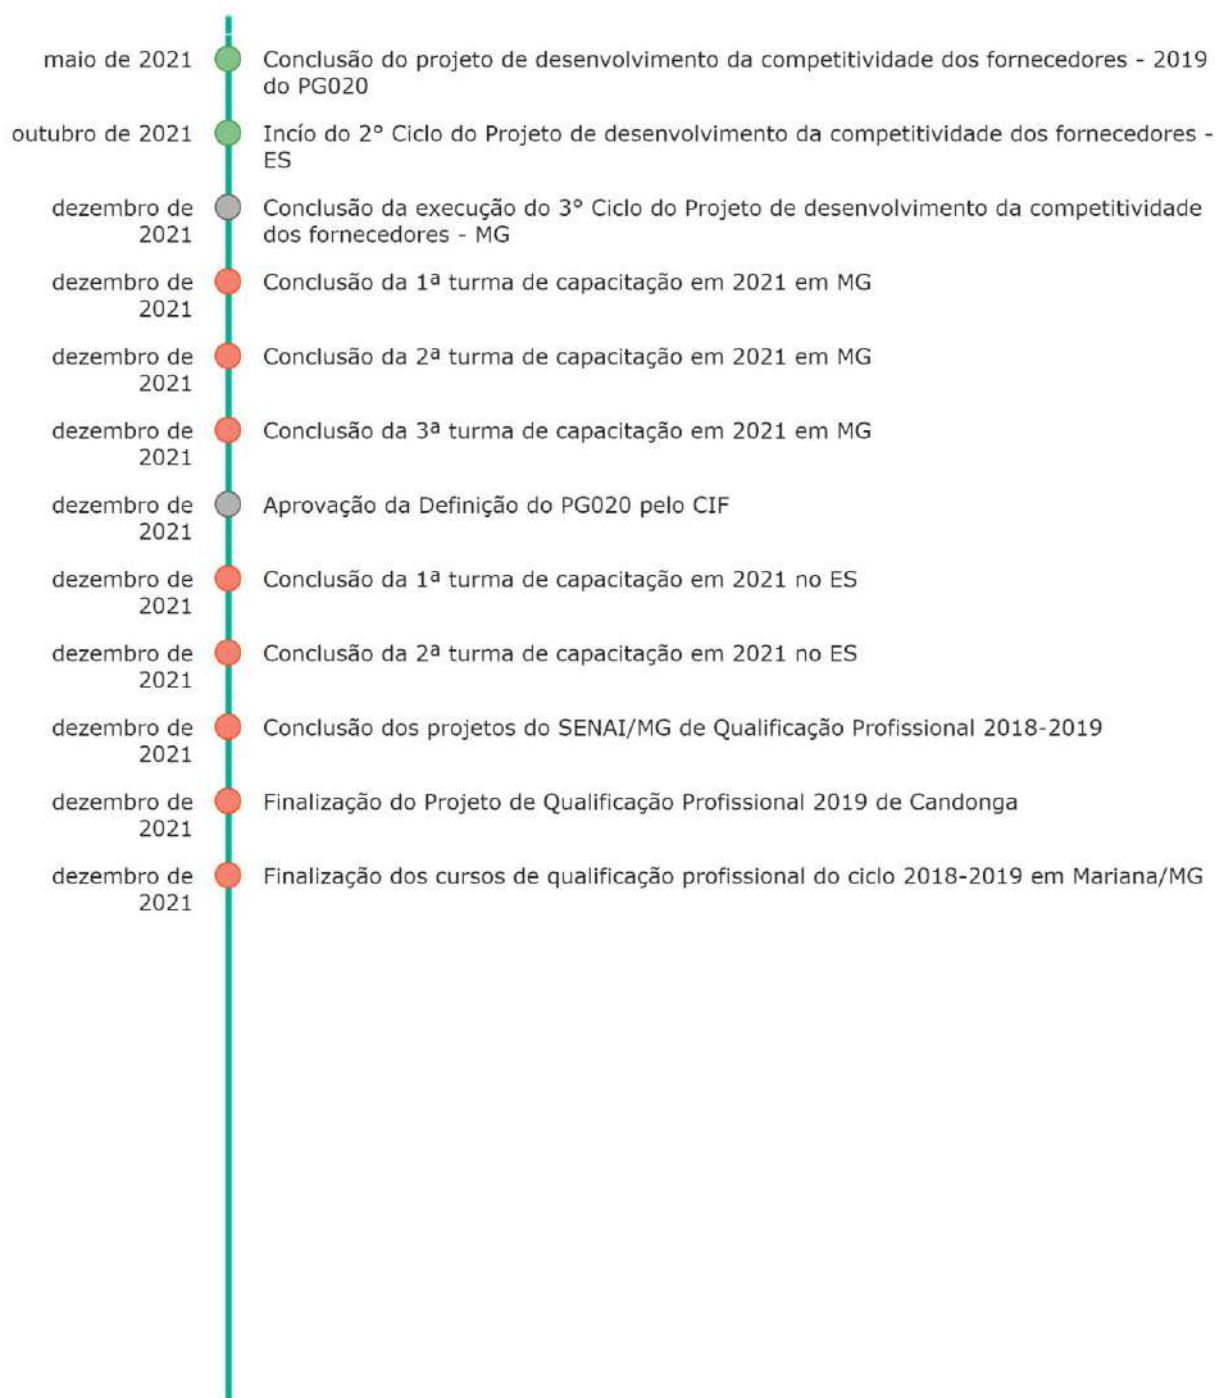

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 131 turmas ofertadas, abertura de 14 Mil vagas, 11 Mil pessoas matriculadas nos cursos presenciais e online, 3.372 concluintes, 1.510 reprovados e 3.676 evadidos.
- **R\$ 1.771.418** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Por meio do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 291 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em outubro/21, sendo 193 contratações locais e 98 não locais, 222 profissionais de Minas Gerais, 27 do Espírito Santo e 42 de outros estados da federação.

O PG20 realizou no dia 27/10/21, nas comunidades de Linhares (ES) e Sooretama (ES), para as famílias que estão cadastradas no fluxo ágil, oficinas de Educação Financeira, abordado também o empreendedorismo como sendo uma forma de retomada das atividades produtivas.

O 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, em outubro/21 realizou palestras abertas ao público, capacitações e assistências técnicas, que são direcionados exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos tratados.

- Palestra on-line no dia 05/10/21 cujo tema foi "Gestão de Compras e Estoque", com 52 inscritos, 98 participantes e 155 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021.

- Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Compras e Estoque" de 07/10/21 a 15/10/21.

- Palestra on-line no dia 19/10/21 cujo tema foi "Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida", com 20 inscritos, 59 participantes e 90 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021.

- Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Saúde e Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida" de 20/10/21 a 21/10/21.

- Palestra on-line no dia 26/10/21 cujo tema foi "Recoloca Rio Doce", com 14 inscritos, 27 participantes e 40 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021.

- Realizada a primeira "Rodada de Negócios" do 3º Ciclo do PDF MG. Evento que promove o encontro entre potenciais compradores e empresas locais participantes do projeto, criando um ambiente propício para realização de negócios.

Lançamento do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.

Início da pré-inscrição para diversos cursos de capacitação profissional para moradores de Degredo, comunidade localizada em Linhares (ES) e que foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) e, inicialmente, as oportunidades são para dez cursos.

Indicadores

I01- Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor

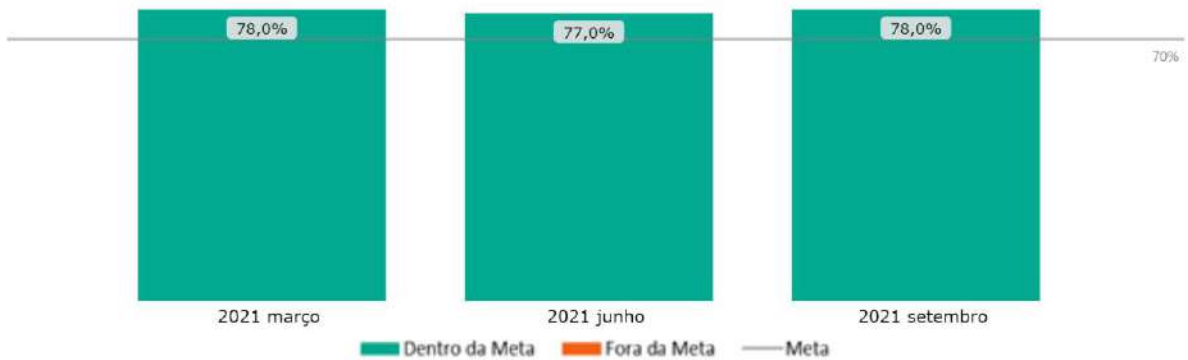


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

I02- Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor



Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

I03- Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor

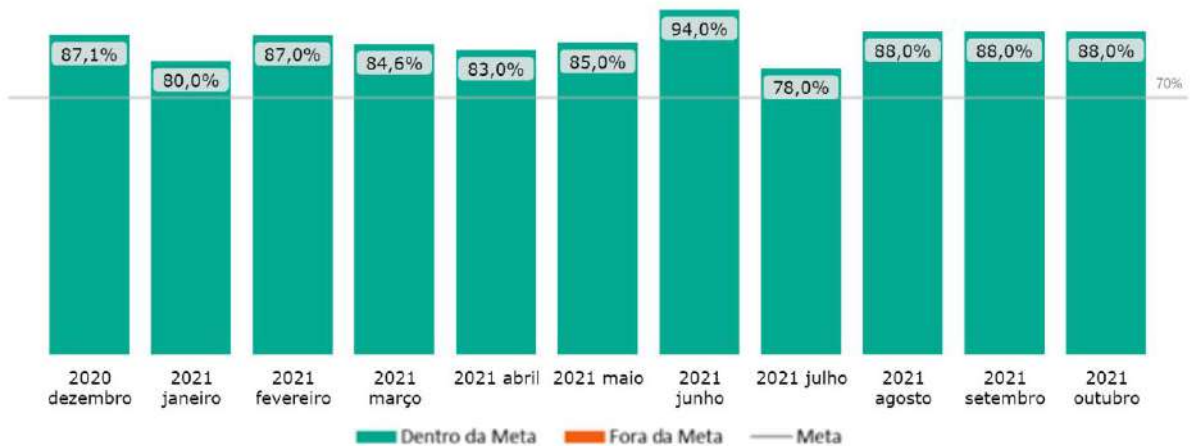


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I04- Relação de profissionais admitidos em cada região – 39

Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor

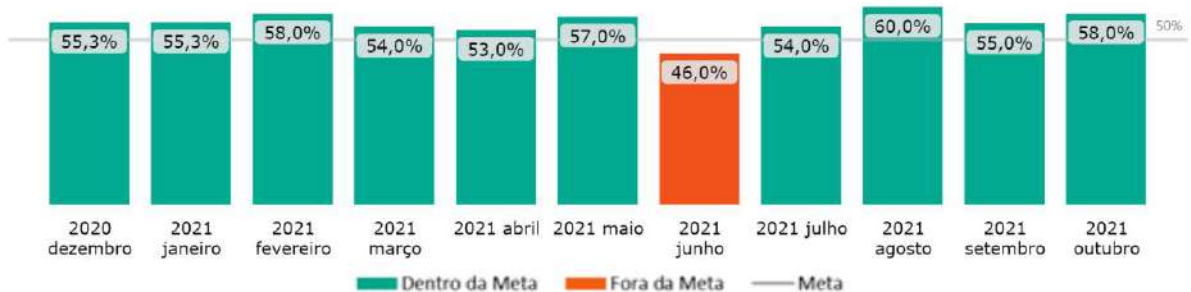


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidades

↑
Melhor

2.000

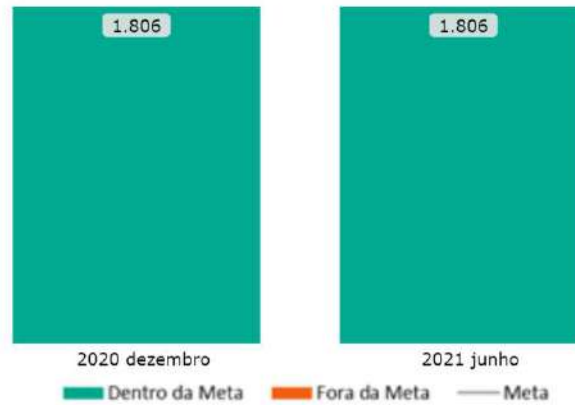


Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova

Percentual (%)

↑
Melhor

50%

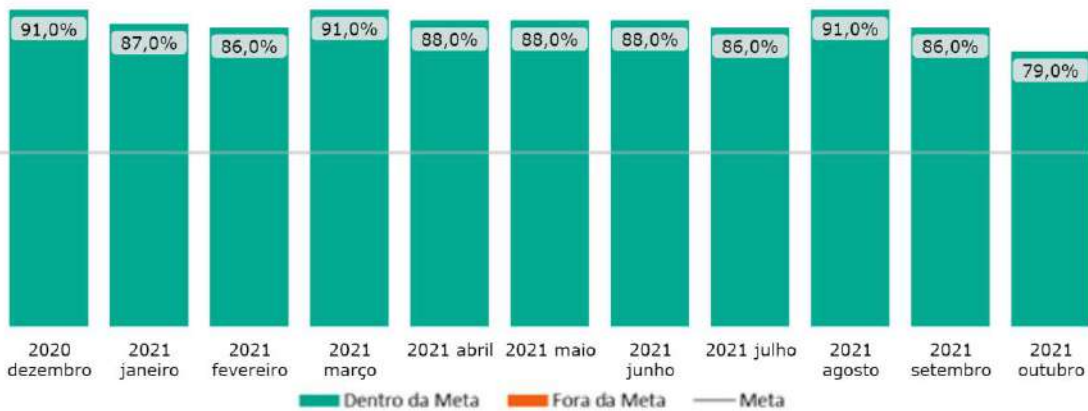


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente

Deliberação	307	2b	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

Nota: A informação relativa a este item não foi enviada pelo programa para o referido período.

Fatos relevantes do mês

Nota: A informação relativa a este item não foi enviada pelo programa para o referido período.

Indicadores

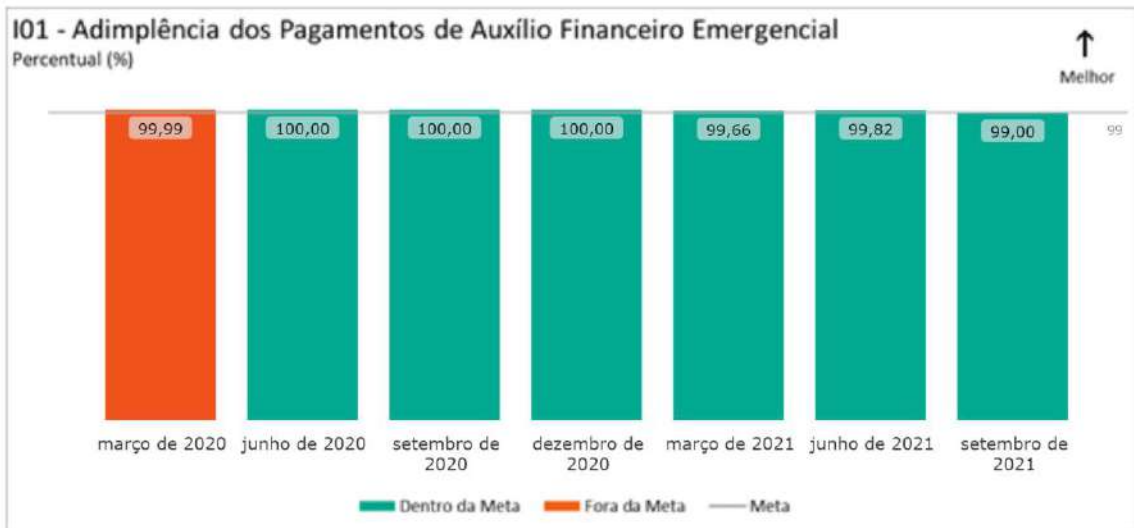


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento


Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	464	2	Reprogramado
Deliberação	488	4	Concluído Internamente


Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Em Andamento
Deliberação	544	3	Em Andamento
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Protocolos no âmbito do Eixo 2 dos documentos de ARE e ARSH em atendimento às requisições #1 e 2 da Deliberação CIF 524.	outubro	20
Protocolo do Relatório de resultados da Fase 1 do estudo de Fingerprint.	outubro	31
Protocolo da etapa 01 e 02 do projeto de expansão da renaturalização.	outubro	31
Início das atividades de campo da Etapa 2 de caracterização ambiental do Plano de Manejo do Trecho 17	outubro	31

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	●	Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
setembro de 2021	●	Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

início do novo contrato de monitoramento aéreo

as atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	●	Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021	●	Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
abril de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Assentamentos/MST - CFFV - 19/21
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 2021/2022
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas e Águia Branca - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22
novembro de 2021	●	Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Assentamentos/MST - CFFV - 19/21
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 2021/2022
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Pancas e Águia Branca - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
- dezembro de 2021 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 981 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 213 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	Concluído Internamente
Deliberação	5	Concluído Internamente
Deliberação	1	Concluído Internamente
Deliberação	2	Concluído Internamente
Deliberação	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1037 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 446 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente

| Deliberação

79

n/a

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| janeiro de 2021 | ● | Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 3 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio |
| janeiro de 2021 | ● | Conclusão da Jornada de revisão do TR4 para Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1 (CL.165) |
| março de 2021 | ● | Aprovação da proposta do Plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática pela CT-Bio |
| março de 2021 | ● | Entrega do primeiro relatório parcial de andamento de atividades do monitoramento do rio Doce em MG - SIF/UFV |
| maio de 2021 | ● | Protocolo da proposta do Plano Conceitual para o Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática |
| maio de 2021 | ● | Celebração dos Convênios de parceria do edital em parceria com a FAPEMIG para monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais - conforme Nota Téc. DFAU/IEF/SISEMA nº 007/2017 |
| agosto de 2021 | ● | Protocolo do segundo relatório parcial de andamento de atividades do monitoramento do rio Doce em MG - SIF/UFV |
| setembro de 2021 | ● | Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio |
| setembro de 2021 | ● | Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática |
| outubro de 2021 | ● | Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3 |
| novembro de 2021 | ● | Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática |
| novembro de 2021 | ● | Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática |

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 05/10/21, foi protocolado o terceiro relatório semestral de evolução do monitoramento da biodiversidade aquática da área ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/RRDM-FEST).

Em 01/10/21, foi protocolado o relatório mensal de atividades da Fundação PROTAMAR, referente à cláusula 165 do TTAC.

Em 01/10/21, foi protocolado o relatório final de elaboração do plano de ação para recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do Rio Doce

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

setembro de 2021	● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
dezembro de 2021	● Aprovação do orçamento do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre




Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- fevereiro de 2021  Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
- junho de 2021  Entrega do Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Terrestre
- agosto de 2021  Protocolar na CTBio relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos













Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)
junho de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE
outubro de 2021		Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB14-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do pleito de Resplendor RESRSPM01-Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **10/2021** foram repassados R\$ **1.085.994** para ações dos municípios*;
- No mês **10/2021** foram ofertadas **0** oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **10/2021** a equipe técnica realizou **107** visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

*Repasse para ações dos municípios de Alpercata, Córrego Novo, Ipatinga, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata e São José do Goiabal.

*As evidências de visitas e/ou reuniões com apoio técnico referentes aos meses de Jan/21, Fev/21, Mar/21 e Set/21 foram atualizadas.

Fatos relevantes do mês

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$ 86.000,00, referente a aquisição de terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 88.727,25, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 90.808,19, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 260.523,46, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 37.985,17, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 285.472,69, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 229.985,01, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI.NII.012019.497, em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro/2019, foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020, protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores.

Como Plano de Ação a Fundação Renova informou que iria “agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF.”

Para dar início ao Plano de Ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08 de julho de 2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do PG31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	4	Judicializado

Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes do mês

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)











Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Mobilização e seleção dos participantes da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
março de 2021		Lançamento da Plataforma Virtual do Projeto Lideranças Jovens
abril de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico, definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
julho de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
julho de 2021		Conclusão da 3ª turma de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
julho de 2021		Conclusão da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
novembro de 2021		Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo
novembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais








Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
novembro de 2021		Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Homologação judicial pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte do "Termo de Compromisso de Repasse Financeiro" entre o Município de Mariana/MG e a Fundação Renova referente ao Projeto de melhorias estruturais das instalações dos órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil.

Cumprimento dos § 1º e 2º da Cláusula 173 do TTAC - Deliberação 543

Indicadores

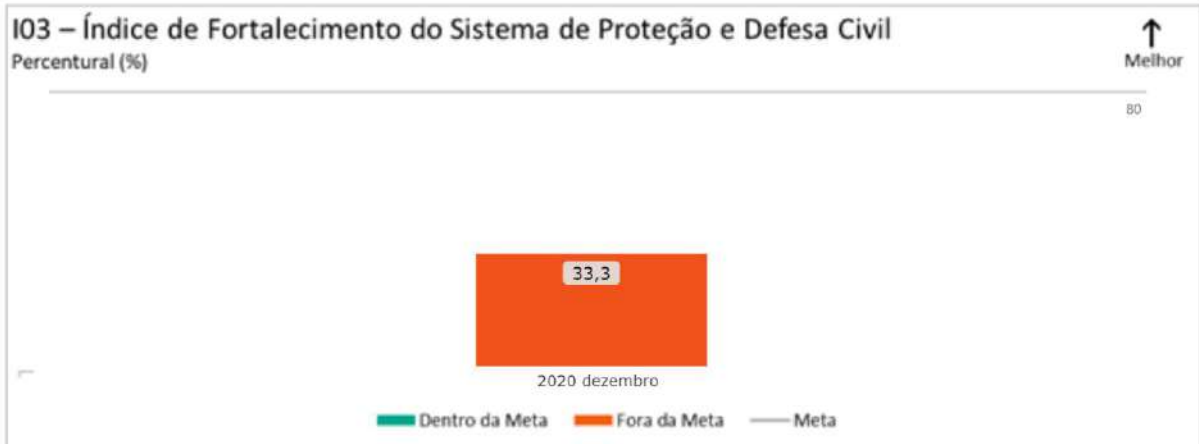


Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.




Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Concluído Internamente
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
- julho de 2021 ● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
- julho de 2021 ● Finalização da Implantação do Repositório Técnico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Realização da 5ª e última Oficina Trilhas de Memórias de 2021.

No dia 06 de outubro de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do ICMBio de regência/ES, durante a qual tratou-se dos seguintes temas: validação da instalação do Ponto de Acesso no Centro Ecológico de Regência/ES, atualizações e formalização do Termo de Parceria. Após a reunião, a Gerência da FR enviou para o ICMBio, um e-mail com o escopo da Minuta do Termo de Parceria para ser avaliada por eles.

No dia 13 de outubro de 2021, a equipe do PG35 realizou uma visita técnica ao Centro Ecológico de Regência/ES para avaliação da instalação do Ponto de Acesso ao CIT com o intuito de observar particularidades do espaço relativas às instalações que serão reformadas para abrir o CIT.

No dia 14 de outubro de 2021 foi realizada a reunião entre a equipe do PG35 e a Prefeitura de Governador Valadares para alinhamentos sobre o Termo de Parceria entre as partes, bem como, para tratar de ajustes no Projeto Conceitual do CIT. |

Envio para a Prefeitura de Governador Valadares da Minuta do Termo de Parceria para instalação do CIT na Praça Getúlio Vargas, s/nº - Lourdes.

No dia 27 de outubro de 2021 foi realizada uma visita técnica ao CIA de Mariana para avaliação da instalação do Ponto de Acesso ao CIT naquela unidade.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Planejado

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	setembro de 2021	outubro de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	222.151	283.047	2.951.447	6.548.473
Documentos no site (mês)	3	9	67	433
Notícias Publicadas (mês)	16	11	127	867
Vídeos (mês)	7	10	104	550

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	setembro de 2021	outubro de 2021
I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	154.459	187.889
I02 – Visualizações de páginas de serviço	30.470	50.764
I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	38.689	45.570
I05 – Alcance Orgânico Facebook	26.562	103.628
I06 – Visualizações no Youtube	14.595	12.087
I03 – Tempo de resposta	8,13 Horas	18,15 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água
















Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente

Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	464	3.2	Reprogramado
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente
Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021		Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021		Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021		Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
outubro de 2021		Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2021

dezembro de
2021

● Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Relatório QAQC das duas campanhas de amostragem do "Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte" - Atendimento à Deliberação CIF nº 310

Protocolo do Relatório QA/QC Trimestral do PMQQS de Abril a Junho/21.

Informe da alteração Estação Automática de Monitoramento RDO2 para RDO02J – Atendimento à Nota Técnica Nº 55 do GTA-PMQQS

Indicadores

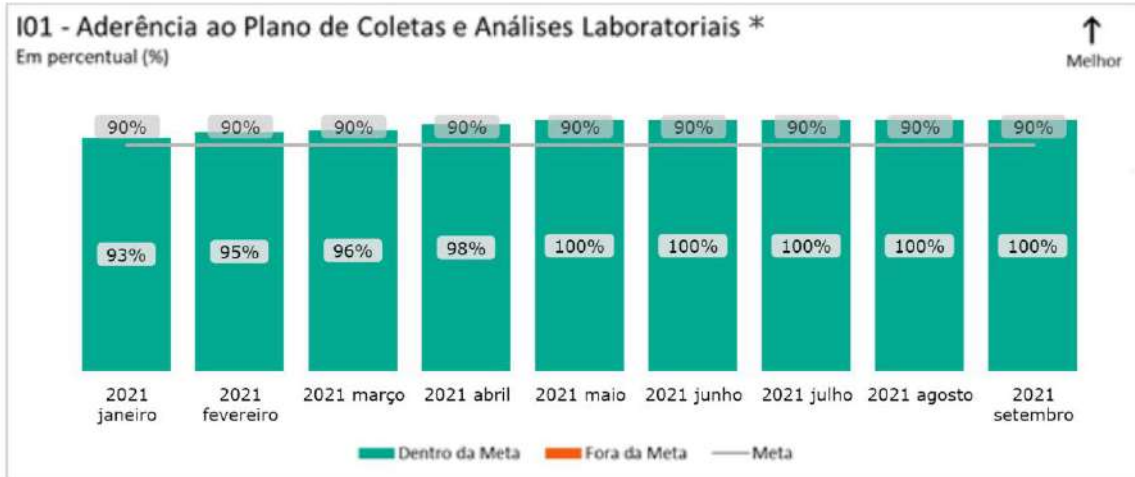


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

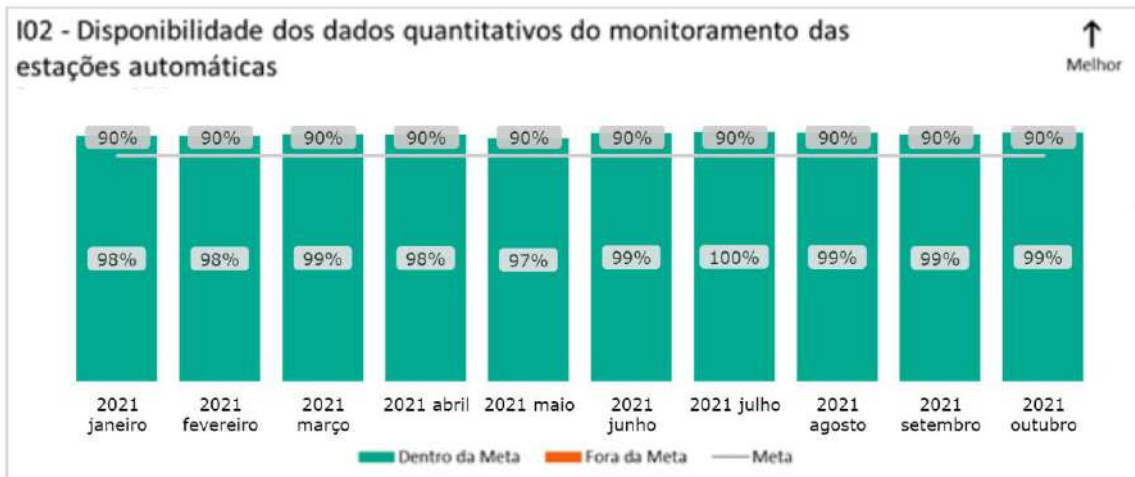


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores

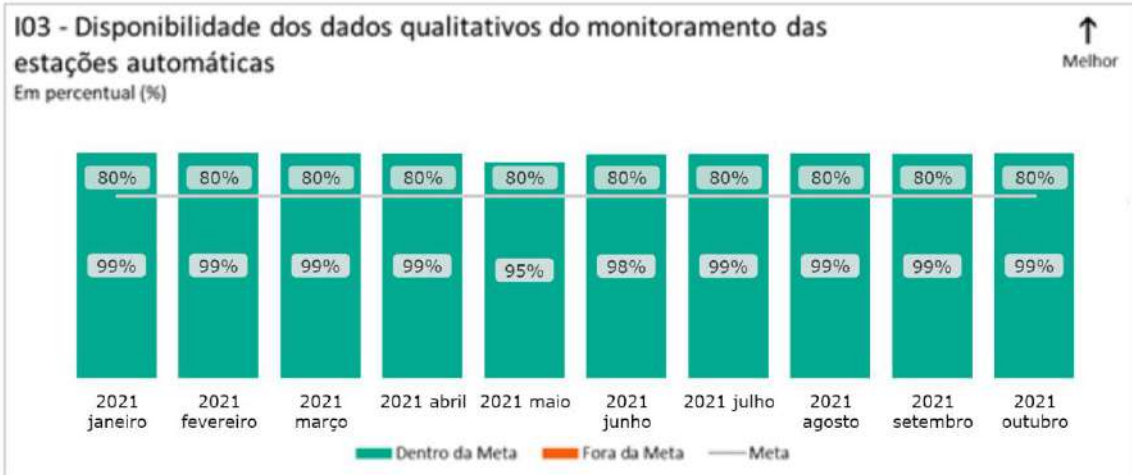


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

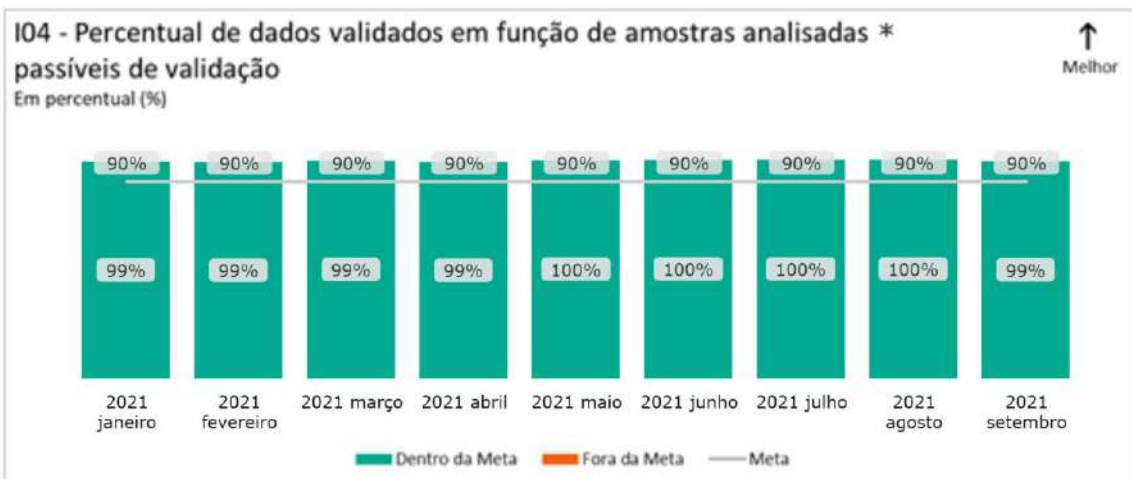


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

* Devido ao arredondamento, segue o detalhamento dos percentuais de Julho/21: 99,98% e Agosto/21: 99,99%

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Reprogramado
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Planejado
Deliberação	535	6	Planejado

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
- abril de 2021 ● Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
- setembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD
- novembro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Final AIA PERD
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 07/10/21, foi encaminhado pelo ICMBio, o termo de referência para contratação da equipe técnica do RVS.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA


Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- novembro de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
 - novembro de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
 - dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

274 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 25 (9,1%) imóveis declinaram e 241 (88,0%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 194 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

- Treinamento para elaboração do PRA em Minas Gerais.

Indicadores

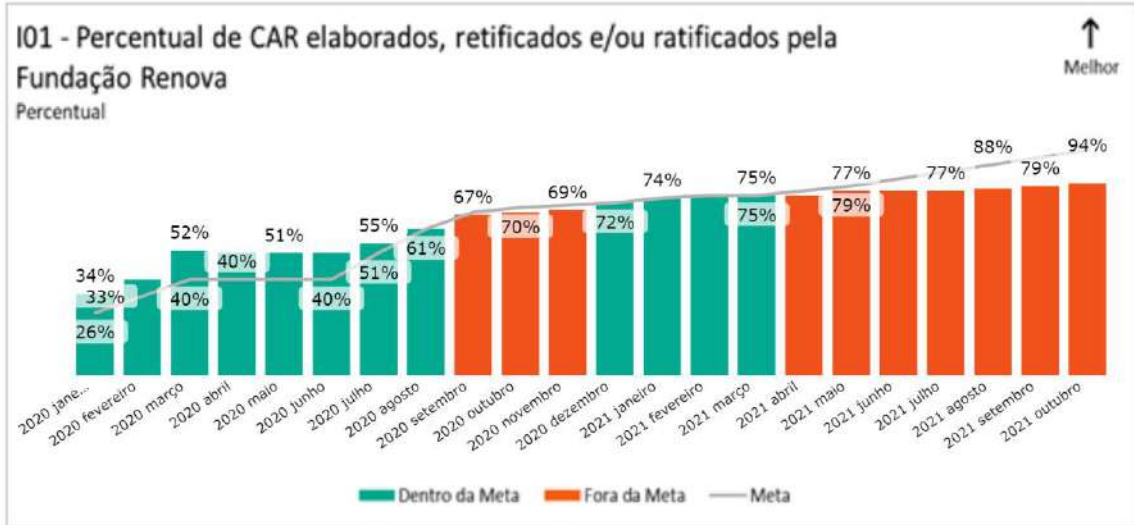


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Reprogramado
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- outubro de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

O marco de entrega de bens para Ministério da Integração foi concluída, com a entrega de 6.971 unidades de coletes, para a Defesa Civil do Brasil e, atendendo à solicitação do órgão, o saldo remanescente foi ressarcido via GRU.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 54,0** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 30,2** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Ressarcimento ao órgão compromitente Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo MI), referente aos gastos extraordinários, com a entrega do último lote contendo 1.868 coletes, totalizando 6.971 unidades, para a Defesa Civil do Brasil, e atendendo à solicitação do MI, o saldo remanescente foi ressarcido via GRU – Guia de recolhimento da União, também em Outubro de 2021, possibilitando a conclusão da cláusula 141.

Foi protocolado na CT-EI, a conclusão da Cláusula 142, que se refere aos ressarcimentos aos 40 municípios elencados no TTAC, em 20 de Outubro de 2021.

Indicadores

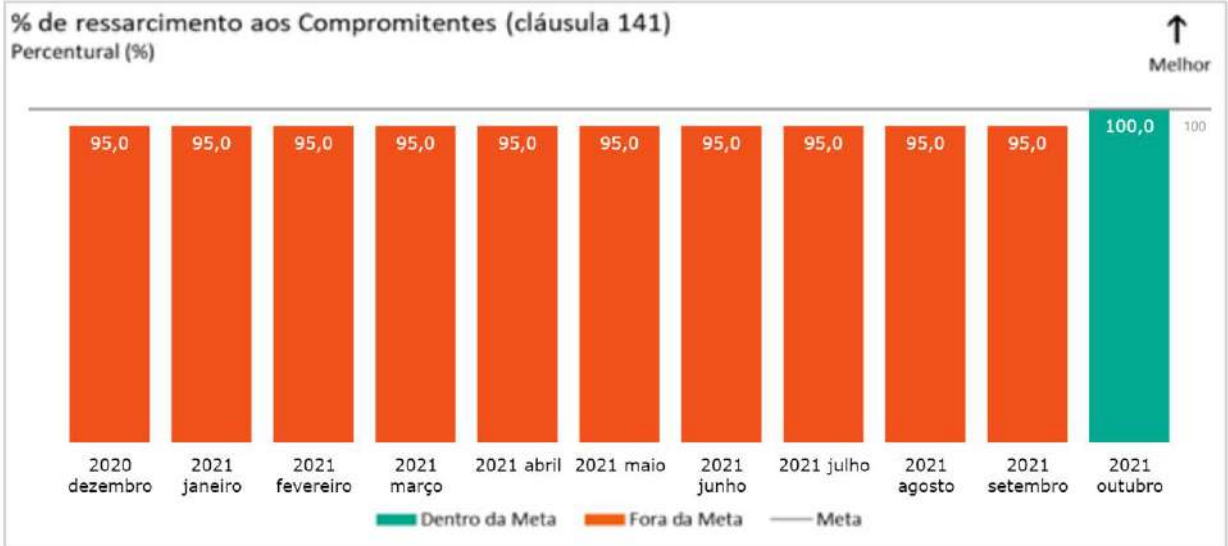


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

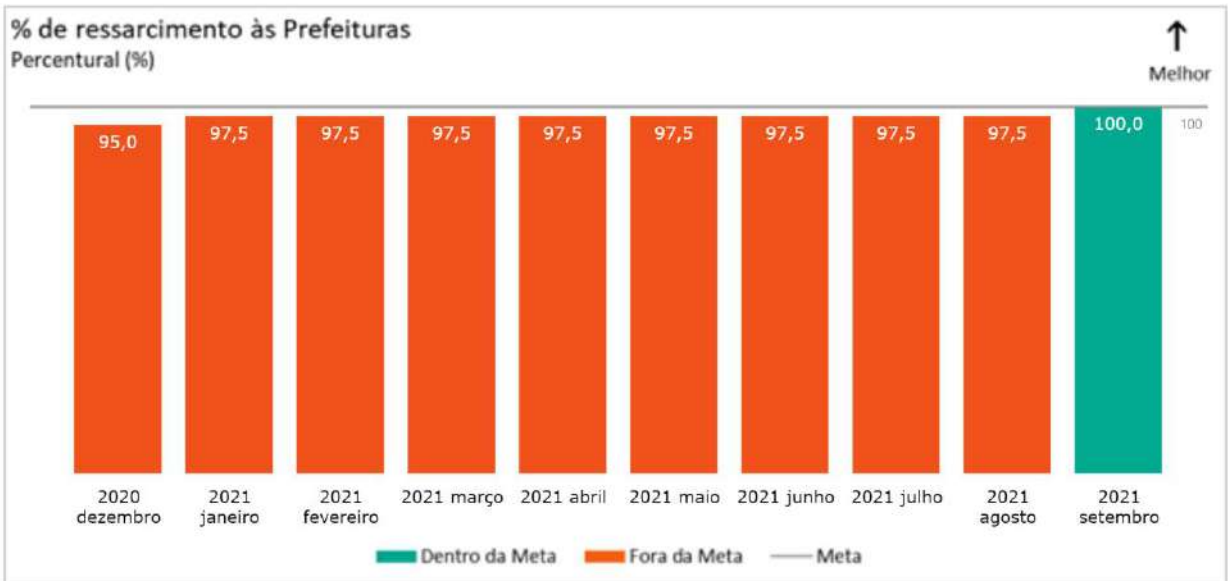


Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

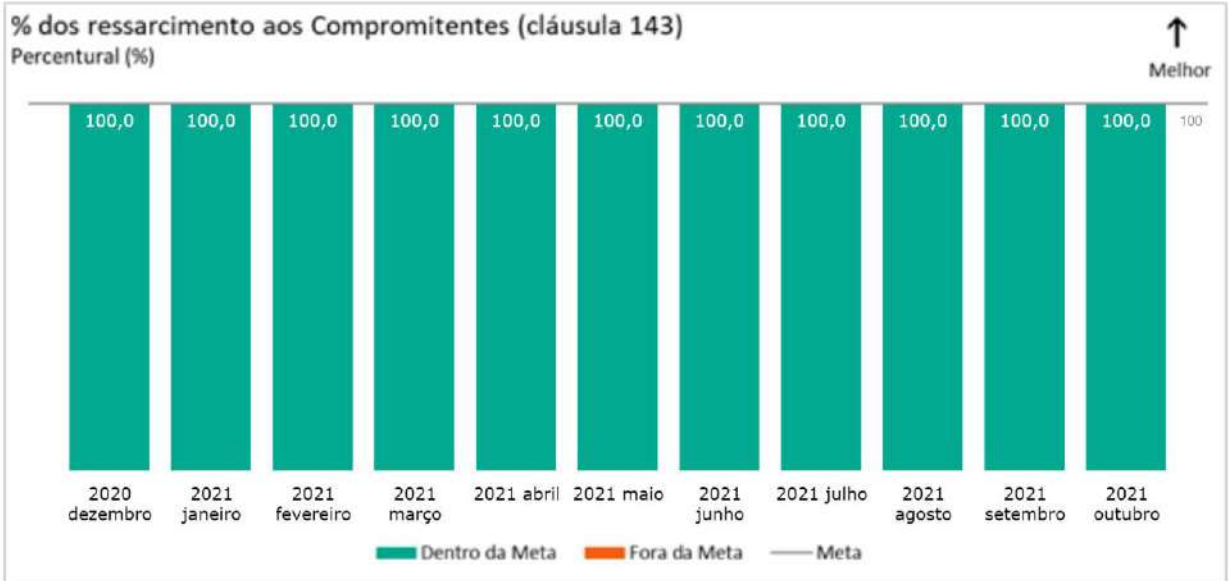


Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até outubro de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

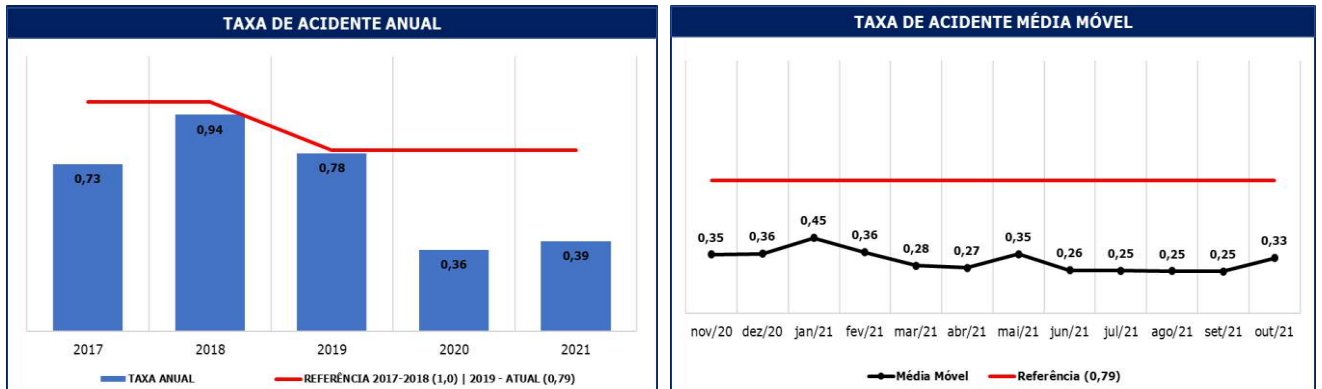

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	4,5	-	10,7	-70%	11,6	4,5	-	7,1	-61%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,7	-	4,2	-85%	4,1	0,7	-	3,4	-82%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,8	-	11,7	-81%	11,9	2,8	-	9,1	-76%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	1,4	-	5,4	-80%	5,4	1,4	-	4,1	-75%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	17,0	-	34,6	-67%	42,5	17,0	-	25,5	-60%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	8,7	-	11,9	-58%	16,6	8,7	-	7,8	-47%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	1,6	-	11,5	-88%	10,5	1,6	-	8,9	-85%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	18,4	-	38,1	-67%	45,3	18,4	-	26,9	-59%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	27,9	-	35,1	-56%	55,6	27,9	-	27,8	-50%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	3,8	-	14,4	-79%	16,8	3,8	-	13,0	-78%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	2,9	-	13,0	-82%	13,3	2,9	-	10,4	-78%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,3	-	6,7	-96%	6,0	0,3	-	5,7	-95%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	1,0	-	1,2	-55%	2,0	1,0	-	1,0	-50%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	19,4	18,2	-	1,2	-6%	4,9	18,2	-	13,2	268%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,5	-	2,1	-81%	1,9	0,5	-	1,4	-74%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	545,3	-	95,3	21%	439,2	545,3	-	106,1	24%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	655,0	-	106,6	-14%	687,6	655,0	-	32,7	-5%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	15,2	-	10,1	-40%	24,5	15,2	-	9,3	-38%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	3.736,7	-	2.310,9	162%	1.275,6	3.736,7	-	2.461,1	193%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	77,6	-	50,2	-39%	105,9	77,6	-	28,4	-27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	6,3	-	39,7	-86%	43,6	6,3	-	37,3	-86%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	4,0	-	12,6	-76%	15,0	4,0	-	11,0	-73%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	53,6	-	72,6	-58%	112,3	53,6	-	58,7	-52%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	6,5	-	0,4	-6%	5,8	6,5	-	0,7	12%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	542,7	-	469,9	-46%	775,0	542,7	-	232,2	-30%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	139,8	-	62,6	-31%	161,2	139,8	-	21,4	-13%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	59,7	-	79,5	-57%	123,9	59,7	-	64,2	-52%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	1,7	-	6,8	-80%	6,6	1,7	-	4,9	-75%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	3,5	-	25,3	-88%	23,5	3,5	-	20,1	-85%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	1,6	-	16,7	-91%	14,8	1,6	-	13,2	-89%
PG14	SAÚDE	19,7	4,1	-	15,6	-79%	17,4	4,1	-	13,2	-76%
PG16	PESCA	53,4	5,0	-	48,4	-91%	45,4	5,0	-	40,4	-89%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	65,9	-	59,7	-48%	109,3	65,9	-	43,4	-40%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	2,4	-	3,0	-55%	4,5	2,4	-	2,1	-46%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	162,7	-	54,0	-25%	214,9	162,7	-	52,2	-24%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	96,6	-	55,5	-36%	129,9	96,6	-	33,3	-26%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	1,1	-	0,3	37%	0,7	1,1	-	0,4	64%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	20,5	-	13,9	-40%	30,4	20,5	-	9,9	-33%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	101,5	-	33,1	48%	62,5	101,5	-	39,0	62%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	1,5	-	10,1	-87%	9,6	1,5	-	8,1	-84%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	81,0	-	96,2	-54%	154,3	81,0	-	73,2	-47%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	24,5	-	23,1	-49%	42,1	24,5	-	17,6	-42%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	3,8	1,8	-	2,0	-53%	3,2	1,8	-	1,4	-44%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	192,2	-	107,1	-36%	253,9	192,2	-	61,7	-24%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	1,2	-	2,7	-69%	3,9	1,2	-	2,7	-69%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	410,1	-	-	410,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	5.410,8	-	514,6	11%	4.179,7	5.410,8	-	1.231,2	29%
Total Programas		5.657,8	6.065,8	-	408,0	7%	4.867,3	6.065,8	-	1.198,5	25%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	103,1	-	71,4	-41%	145,7624	103,094	-	42,6684	-29%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	3,6	-	24,8	-87%	23,1	3,6	-	19,5	-84%
Total Despesas Administrativas		202,9	106,7	-	96,2	-47%	168,9	106,7	-	62,2	-37%
Total Geral		5.860,7	6.172,5	-	311,8	5%	5.036,2	6.172,5	-	1.136,3	23%

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada	
		%	Orçamento	Realizado	Variação		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	-61%	1,6	1,2	0,4	-27%	Edital Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. A previsão feita no orçamento está baseada no repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos projetos apoiados, o que gera o desvio. Valorização das Referências Socioculturais: Projeto em execução, mas estava sendo medido em DR diferente, reclassificação realizada.
PG15	INOVAÇÃO	-82%	0,4	0,1	0,3	-80%	- Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Empreende Rio Doce não iniciado (em processo de contratação). - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17 gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%). - O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado pelo CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21) e seguirá para aprovação interna, após a correção de valor pela Prefeitura de Mariana. - O projeto Fortalecimento do Laticínios Mariana foi cancelado e está sendo reformulado pela equipe técnica.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	-76%	1,2	0,0	1,2	-97%	- Paralisação da obra Casa do Empreendedor por decisão judicial. - Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17 é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%). - Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (editais de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	-75%	0,7	0,2	0,5	-66%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (editais de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	-60%	4,6	2,4	2,2	-48%	- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo. - Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Consultoria Cosntrução CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	-47%	2,0	0,7	1,3	-66%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	-85%	1,3	0,3	0,9	-74%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	-59%	5,0	3,4	1,5	-31%	"- Projeto Formação de Educadores (UFMG/UFOP). Em razão de procedimentos burocráticos das instituições envolvidas na parceria, houve atraso na formalização. Após assinatura do Termo de Parceria foi necessário ajustar as planilhas orçamentárias para o início das atividades. - Projeto Lideranças Jovens. Em razão da pandemia e devido à impossibilidade de realizar atividades em campo (presenciais), as parcerias executaram com atraso custos previstos (necessidade de ajustes para o formato remoto) impactando a liberação de aportes, conforme cronograma de desembolso no contrato.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	-50%	5,0	0,9	4,1	-82%	Postergação: - Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada; - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de atividades presenciais durante o período de Pandemia. Economia: Não se aplica.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-78%	5,1	-	5,1	-100%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que posteriormente solicitou que o CIT fosse instalado em outro imóvel. - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual em andamento e minuta do termo de parceria enviado para avaliação jurídica pelo ente público. - CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/ conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMBio. Aguardando finalização dos projetos para solicitação de orçamentação. Minuta do termo de parceria enviado para avaliação jurídica pelo ente público.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	-78%	1,6	0,3	1,4	-85%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor. Mudança de estratégia - Pagamento da 1 parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020) - Refúgio de Vidas Silvestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	-95%	0,6	0,0	0,5	-96%	Atraso no cronograma em função da postergação do início das atividades de ATER (executores do CAR) devido pandemia. Os Diagramas referentes a medição do CAR estão sendo inseridos por remanejamento nos contratos de ATER, para correta apropriação contábil. Atividades referente ao PRA reprogramadas em função da disponibilidade do órgão ambiental, publicação de decreto, e assinatura de Termo de Cooperação Técnica. As curvas orçamentárias foram revistas conforme repanejamento das atividades nos Drafts 17 e 18. (-R\$26,4MM) Acordos ainda não firmados/homologados novas áreas e não realizado residência em gestão pública MG ES (+R\$11,8MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	-50%	0,1	0,1	0,0	-25%	(-R\$28,7MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas: reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS), manutenção vias públicas Mariana. (+R\$150MM) Realizado repasse R\$ 150 MM Apoio Saúde para os estados de MG, ES e Municípios MG. Valor estava previsto em 2020 e somente realizado neste mês set-21. (-R\$0,7MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	268%	0,4	-	0,4	-100%	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	-74%	0,3	0,0	0,3	-88%	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	24%	6,9	1,5	5,4	-78%	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0%	-	-	-	0%	
Total Compensatórios		-5%	37,0	11,3	25,7	-70%	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	0,5	1,9	1,4	290%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitoria Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é baseado no DRAFT 16 e considerava o cenário previsto no primeiro semestre de 2020. - A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em outubro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	90,5	409,4	319,0	353%	- O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realização a menor em relação ao previsto, com destaque para Pescadores Juparanã, Danos de agropecuária e Dano Moral/Indenizações de Barra Longa. - As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento;
PG03	POVOS INDÍGENAS	11,5	8,5	3,0	-26%	- Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021; - As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI - A execução do PBAI Tupiniquim-Guarani e Comboios está em atraso devido a realização de etapas predecessores ainda em andamento. - As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento;
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,1	0,1	1,2	-107%	- As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução do programa; - As ações de monitoramento social estão em fase de reelaboração estratégica da gerência; - Planejamento Integradores estão em fase de reelaboração estratégica da gerência; - Os pagamentos da Indenização que estavam inicialmente previstos para serem pagos pelo PG04 estão em execução pelo PG02. - Plano de Mariana: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas), prestação de contas não realizada pelo município. - Plano de Barra Longa: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); desembolsos previstos no Draft 16 não realizados e já reprogramados no Draft 17. - Plano dos Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; atualização do cronograma físico e do desembolso financeiro (Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi realizada com metodologia online; não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de repactuação com MG); ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas). - Planos Estaduais: atraso na homologação do acordo com o estado de MG/Sedese. - Revisão contratual das equipes de território em decorrência da Covid-19 (exclusão de veículos e escritórios). - Redução das ações socioassistenciais devido ao avanço nos atendimentos da Renova via Novel. - Demandas judiciais não iniciadas. - Diálogos – Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 7,2MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrência das atividades remotas. - Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 6,7MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAs em decorrência das atividades remotas. Para os escritórios dos CIAs encontra-se em estudo o processo de readequação das estruturas e reabertura dos espaços gradual a partir do próximo período.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,4	0,2	2,2	-93%	- Comunicação - Economia (R\$ 5,3MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Verba de consultoria postergada entre 2º semestre 2021/22 Draft 17, aguardando realização de pesquisa. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,4 MM): não houve desvios significativos no orçamento para o período. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 38,7MM): pagamentos judicializados, aguardando decisão judicial, além de atrasos no envio de documentos por comissões locais e morosidade na inclusão de documentos no SAP. - Vivência de territórios - Postergação (R\$ 0,4 MM) : Houve uma redução das visitas presenciais ao projeto VIM ver em função da pandemia.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	7,6	4,8	2,8	-37%	- Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadoras (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657; e PROGEN - Contrato 4800033410) - Execução acima do previsto no arrendamento de propriedade rural para abrigo temporário de animais (Contrato 4800030166) - Execução de demandas de manutenção de acessos e curvas de nível em propriedade rural voltadas à conservação de pastagens (Contrato 4800030166)
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	1,1	0,5	86%	

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
						<ul style="list-style-type: none"> - Novas Moradias Bento (+50,2): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Adutora ETE/ETA Paracatu (-66,7): Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21. Finalização de Processo de Contratação, em aprovação de APRO - previsão de início de mobilização a partir de 15/11/2021; - Equipamentos Públicos Paracatu (-40,6): Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão mar e abr/2022; - Engenharia (-38,9): A paralisação no desenvolvimento de projetos, ocorrida no primeiro semestre 2021, somada ao atraso na liberação dos ID's interrompidos, ocasionou uma lacuna em toda a programação de atividades de Engenharia, gerando a postergação das atividades subsequentes, como bens coletivos, crosschecks, etc, ocasionando a diferença verificada na programação financeira. - Custos Covid (-29,4): Variação a menor em função da revisão da curva de desembolso no ano. Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Instalações provisórias Bento (-30,1): Revisão da curva de desembolso no ano; - Iluminação pública, Infraestrutura Sítiantes, Benfeitorias, Cemitério, Equip.Públicos Bento e Construção do Trevo MG-129 (-22,2): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Contêntes, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-20,4): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Contêntes Bento (-24,5): Atraso no processo e na formalização do aditivo da Progeo está impedindo medições por parte do fornecedor). - Novas Moradias Familiar (+17,4): Houve aquisições de Imóveis além do previsto para o período, bem como foi apropriado Novas Moradias do Reassentamento Familiar (16 Cartas de Creditos de um total de 28) que eram para ser apropriados em Novas Moradias de Gesteira. - Instalações provisórias Paracatu (-13,1): Variação a menor em função da curva de desembolso no ano. - Infraestrutura Bento (+16,8): Serviços e obras de infraestrutura executados em 2021, o que estava previsto para término em 2020. - Gesteira (-22,2): Valores previstos a 28 Cartas de Créditos homologados dos quais 16 foram adquiridas. Contudo estes valores foram apropriados no Reassentamento Familiar. - Gerenciamento (+11,2): Parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021' - Adutora ETE/ETA Bento (+4,6): Redução no realizado em relação ao previsto, devido ao faturamento direto de vários serviços/materiais para a Fundação Renova;
PG08	REASSENTAMENTO	109,8	37,1	72,7	-66%	
PG09	UHE CANDONGA	20,7	16,6	4,1	-20%	<ul style="list-style-type: none"> - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	10,4	6,6	3,8	-37%	<ul style="list-style-type: none"> - Grande impacto da pandemia nas atividades do programa (paralisações municipais e protocolos rígidos). - Escopo de Reconstrução das casas e Manutenção de edificações paralisado devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias é executado sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Draft 16 (75%)/Draft 17 (42%). Desalinhamento entre o Draft 16 e 17 é de 76%. O restante do desvio (24%) é devido:
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,5	0,6	0,0	9%	<ul style="list-style-type: none"> - Escolas Impactadas de Mariana e Barra Longa (9%): Compra de equipamento sob demanda das escolas (ECONOMIA REAL), a plataforma de Paracatu será paga após a instalação e falta de desfinição de escopo nas escolas de Barra Longa; - Custo Covid (11%): Contratos aditados para modelo remoto. Não será necessário a utilização desse recurso; - Projeto Pedagógico Mariana (4%): Condensação das etapas para finalização dos PPPs em dezembro de 21. - Engenharia de Restauo de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Restauo de Igrejas: parceria para restauo em processo de contratação, aguardando aprovação da APRO. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,7	0,7	1,9	-73%	<ul style="list-style-type: none"> - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes, impedindo o início das atividades. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. Atividades reprogramada para 2022 no draft 17 - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 - Missões e Formações: devido a pandemia teve seu início adiado, por serem essencialmente presenciais. Está sendo realizado no mês de novembro/21.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,9	0,1	1,8	-95%	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais.
PG14	SAÚDE	2,8	0,2	2,6	-94%	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto a listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 10,0 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 9,7 MM).
PG16	PESCA	4,2	0,5	3,8	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 17,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,4 MM).

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
						<p>Reconstrução Estruturas Rurais Complexas: Impacto nos contratos devido a paralisação nas obras de Barra Longa, no prazo de 27/05 a 15/06. Baixa performance da contratada causando atrasos no cronograma e medição. O contrato voltou a performar conforme a demanda, na medida que o uso em vista da necessidade de utilização do mesmo. Devido a baixa performance, esse contrato será substituído, já em concorrência pelas SR's SR286644105 / SR286644161.</p> <p>Implantação das Melhorias Alternativas: Postergação/adequação das atividades devido a pandemia e paralisações devido a decretos municipais. Baixa performance do fornecedor Biokratus devido absenteísmo por COVID. Contrato Garavini postergação do início das atividades em função de ajustes de documentação. Atualmente, as atividades seguem aderentes ao orçamento revisado.</p> <p>Recuperação das Áreas Produtivas Impacta: A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrito comercial e ainda não encerrado formalmente. Contratos que substituíram as atividades com baixa performance. Empresa saiu em janeiro, contratada se negou a assinar a carta de encerramento, aguardando se irá entrar com pleito. O contrato da ERG STCP substituiu a JM, em fase de avanço na curva de maturidade e performance.</p> <p>Recomp. Alimentação Animal Silagem: Redução dos gastos, devido alugueis de pastagens assumidos pelo PG08 e mudança de modalidade de fornecimento de silagem, feno, milho e fubá; bem como, no início deste ano o pagamento pelo fornecimento da alimentação animal vem sendo debitado no DR do PG08 (devido a um acerto de contas). Em andamento plano de redução da silagem.</p> <p>Fornecimento de Silagem Território II: Prorrogação no prazo de fornecimento de silagem, em função do atraso na conclusão do estudo. Ocasionalmente ocorrem atrasos por parte dos produtores na entrega dos documentos, que são pagos na próxima parcela. Alguns produtores assinaram termo de não recebimento pois já tinha silagem estocada. Houve ingresso de novos beneficiários de silagem e aumento no preço da silagem.</p> <p>ATER Territ. II - Candonga a Foz: Segunda Fase da WRI em fase de definição de escopo para contratação e Implantação de Unidades Demonstrativas e Articulação de ATER (vínculo com políticas públicas e feiras); ATER II: Paralisação devido pandemia; baixa performance da contratada, atraso em contratação de efetivo, problema de logística devido extensão do território, falhas na gestão pela contratada, público alvo aquém do esperado.</p>
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	9,7	8,2	1,5	-16%	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,6	0,5	0,2	-26%	- Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,9	9,0	8,1	911%	- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novel Sistema, não previstos no orçamento.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	10,4	11,6	1,3	12%	<p>Aplicação dos Planos de Manejo de Rejeito: Houve atraso na mobilização da empresa Inovesa para início das atividades e consequente postergação de desembolsos previstos; Aguardando homologação do Projeto Executivo pelo juiz. Consequente atraso na contratação da empresa que irá prestar os serviços de recuperação das lagoas. Impacto no fluxo de desembolsos; Houve atraso na contratação da Obra do Talude do Nazareno e os desembolsos previstos foram postergados. Processo concorrential finalizado. Obras previstas para próximo período seco; O projeto renaturalização sofreu atraso e impactos COVID. Algumas campanhas foram postergadas para 2022. No Draft16, o contrato da Rhama 4800012846 estava associado a este DR. Como agora este contrato pertence a outro DR (540000987 0010), o valor medido não está sendo contabilizado nesse DR, ocasionando essa variação.</p> <p>Gestão da Qualidade do Ar: O contrato da Ecosoft tem medições sob demanda que ainda não foram realizadas; O contrato da M Locação prevê a utilização de equipamentos sob demanda, ocorreu a desmobilização de um dos equipamentos considerando a proibição de acesso por parte de uma das prefeituras. Além disso, a execução desta atividade está sujeita a sazonalidade. Houve impacto devido às condições climáticas.</p> <p>Gestão de Áreas Contaminadas: O planejamento das medições foi impactado pela judicialização do Eixo 02, ainda em discussão no âmbito do juízo, para replanejamento dos dispêndios.</p> <p>Estudos Complementares: Contratos sob demanda apresentam variações já esperadas (Golder e NHC). Além disso, o modelo de curva do contrato da Tetra Tech não é linear, sendo específica porque se trata de um contrato sob demanda. A aderência em relação ao valor original de out/21 do Draft16 foi de 6,15%. Entrega somente do relatório mensal da qualidade da água e sedimento das lagoas de Linhares (consultoria Vilma/Ecoconsult); Projeto para usos econômico do rejeito não iniciado. A UFMG declinou do projeto. Aguardando decisão do PG15 em assumir a contratação deste estudo com outra universidade; O modelo de curva do contrato da HidroBR não é linear, sendo específica porque se trata de um contrato sob demanda. A aderência em relação ao valor original de out/21 do Draft16 foi de 23,32%. Entrega do relatório final das manchas de inundação 2D pós Candonga para o CIF e CT-GRSA e entrega do relatório preliminar dos indicadores intracalcha.</p> <p>Custos Gerais: Pagamento de medições retroativas à AECOM devido à definições judiciais. Os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Contratos matriciais sob demanda, os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Gerenciamento matricial MCA previsto maior que o realizado, no Draft 17 os ajustes foram realizados; Atraso na celebração do aditivo da parceria do Convênio com a UFV Tecnossolos (Prof. Carlos Schaefer).</p> <p>Barramento Linhares (17,4) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado.</p>
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	-	0,1	-100%	<p>- Execução acima do previsto com a elaboração dos estudos de alternativa de descomissionamento em atendimento ao termo de referência enviado pela AECOM (avaliação da remoção parcial ou total do dique e recuperação da área alagada a montante).</p> <p>- Previsto contrato com Gessois que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas.</p> <p>- Previsão desembolso ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMB - serviço gestão qualidade do AR.</p> <p>- Cancelamento da contratação dos serviços de levantamento topográfico em virtude da pandemia e consequentemente aditamento do contrato atual</p> <p>- Previsão de Medições referente aos serviços de restauro florestal - Contratada EGIS tinha previsão de desembolso até jul/22 mas foi finalizado em jul/21 / Contratado Consórcio ERG/STCP baixo desempenho e contrato estendido até mar/22; além disso a curva não condiz com a execução por conta do covid-19. Foram adequados os valores mensais na nova curva.</p>
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,4	1,4	1,0	-42%	<p>- Previsão de curva de desembolso até nov/21 do Contrato Construtora Lages Gomes mas finalizou em abr/21 e também com baixa performance e sem consumir todo o saldo do contrato.</p> <p>- Antecipação das atividades de manutenção dos cercamentos, em decorrência das parcerias com os próprios produtores.</p> <p>- Revisão da curva de desembolso (MONITORAMENTO e PSA) em virtude da postergação da contratação devido a pandemia covid-19 e por alterações no cronograma deste monitoramento na definição de escopo dos programas.</p>
PG28	BIODIVERSIDADE	13,7	22,0	8,3	61%	<p>- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial.</p> <p>- Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021, porém aprovado na APRO 232/2020.</p> <p>- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.</p> <p>- Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da Pandemia.</p>
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,2	0,2	1,0	-81%	<p>- Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico.</p> <p>- Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto</p>

		Mensal				
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,5	6,6	6,9	-51%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m ³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,8	2,1	0,6	-22%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização pendente de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o período de take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO sofreu atraso pandemia e mudança de estratégia. Estudo colóides com relatório técnico postergado para 2022. Estudos/Serviços postergados pela pandemia, retornaram porém ainda com baixa execução (ERG, RHAMA). Parceria com FCO/UFGM/Libanio cancelada pelo Professor. Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Contratos encerrados com saldo: ALS PMQQS, Ecology e Século XXI. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17 e Draft18.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,2	0,8	0,5	213%	Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa devido à baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia devido a alteração do escopo
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	23,6	17,1	6,5	-28%	- Postergação (R\$ 55,1 MM): menor medição nos contratos sob demandas de serviços devido à restrição COVID; contrato da Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (Infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 6,6 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	0,5	0,5	#DIV/0!	- Atraso na aquisição dos coletos em ressarcimento ao Ministério da Integração. A diferença é o pagamento do último lote que será realizado em novembro e o saldo da Copasa (já subtraído do programa no Draft 17). - Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Esse montante foi utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		387,3	568,2	180,9	47%	
Total Programas		424,3	579,5	155,2	37%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	15,40	12,84	2,55	-17%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	2,1	0,2	1,9	-89%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		17,5	13,1	4,5	-25%	
Total Geral		441,8	592,6	150,7	34%	
