



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Junho/2023

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><a href="#">5</a></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><a href="#">6</a></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><a href="#">14</a></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><a href="#">21</a></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><a href="#">27</a></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><a href="#">35</a></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><a href="#">45</a></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><a href="#">86</a></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><a href="#">96</a></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><a href="#">112</a></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><a href="#">125</a></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><a href="#">134</a></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><a href="#">144</a></b>
<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><a href="#">150</a></b>

<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><a href="#">159</a></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><a href="#">166</a></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><a href="#">173</a></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><a href="#">181</a></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><a href="#">193</a></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><a href="#">202</a></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><a href="#">209</a></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><a href="#">218</a></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><a href="#">224</a></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><a href="#">233</a></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><a href="#">240</a></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><a href="#">247</a></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><a href="#">257</a></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><a href="#">264</a></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><a href="#">270</a></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><a href="#">276</a></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><a href="#">288</a></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><a href="#">296</a></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><a href="#">302</a></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><a href="#">310</a></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><a href="#">318</a></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><a href="#">326</a></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><a href="#">336</a></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><a href="#">343</a></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><a href="#">350</a></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><a href="#">357</a></b>
<b>Dados de Segurança .....</b>	<b><a href="#">363</a></b>
<b>Gestão Econômica .....</b>	<b><a href="#">365</a></b>

## Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## **PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

## **Entregas do ano de 2023**

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.



## **Grandes números do programa**

- 177.013,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821,00 famílias e 99.552,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## Fatos relevantes do mês

Atendimento a 9.557 solicitantes no mês de Junho/23

## Indicadores

### I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%  
Percentual %

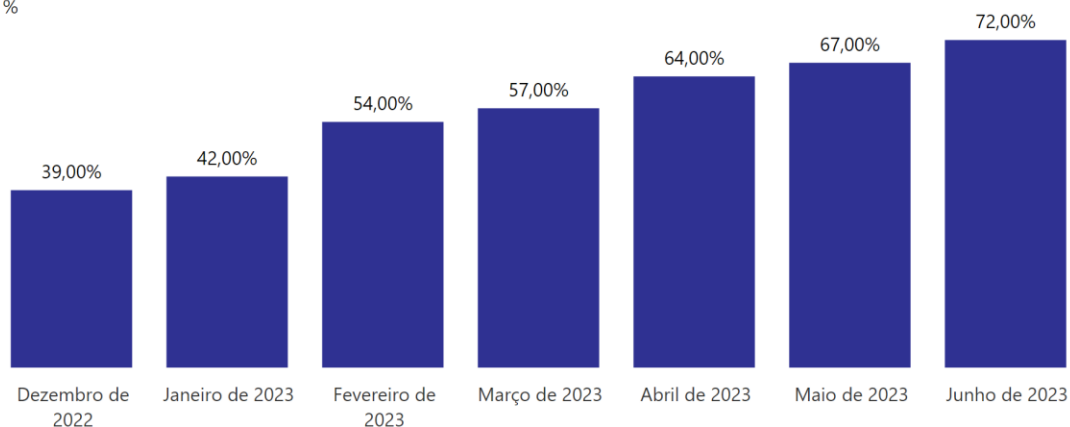


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

### I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%  
Percentual %

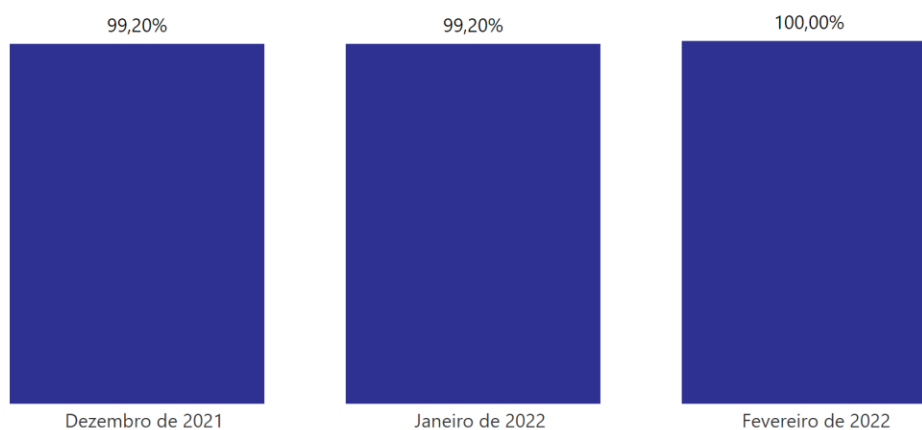


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%

Percentual %

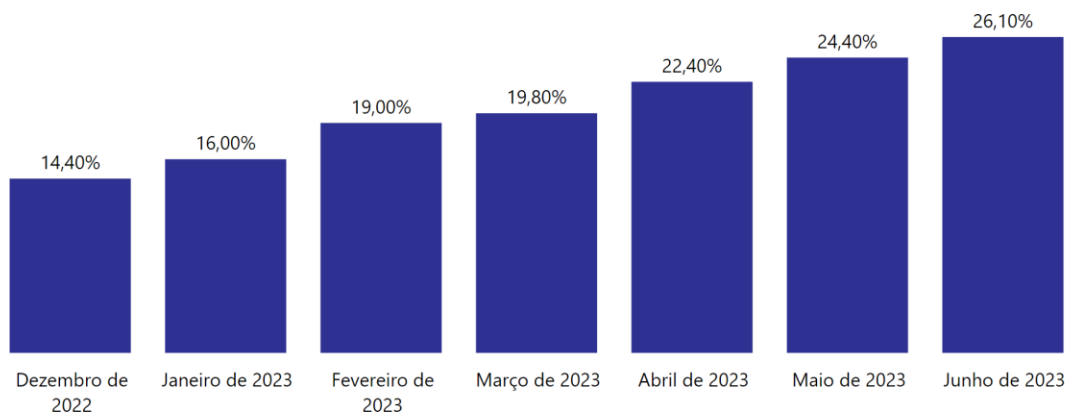


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

## Indicadores de Acompanhamento

### Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas

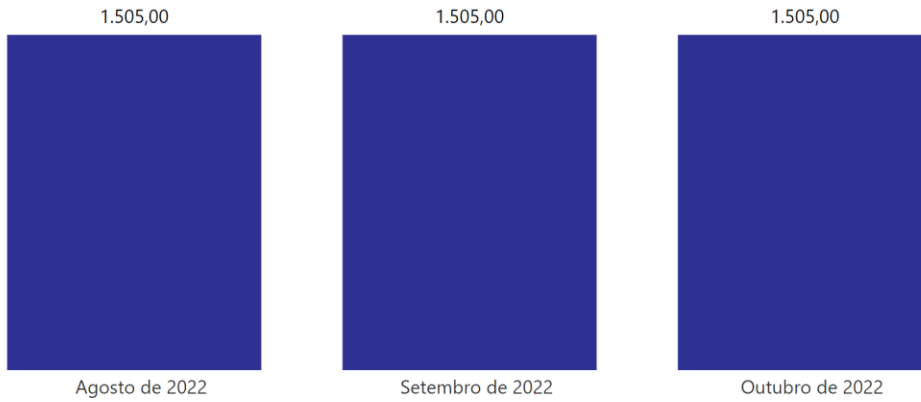


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

### Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias




Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

## **PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

## **Entregas do ano de 2023**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.



## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320,179.00 pessoas, sendo que 270,372.00 aceitaram propostas. Destas, 264,988.00 propostas já foram pagas (98.01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305,457,974.05.

- **Para Dano Gerais**

10.862,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,811.00 já foram pagos ( 99.53% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1,958,436,817.61.

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 824.00 indenizações, o que representa 98.33% do total das 838.00 propostas aceitas.

## Fatos relevantes do mês

Até o momento, 89.623 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 820 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97,96% do total das 837 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

## Indicadores

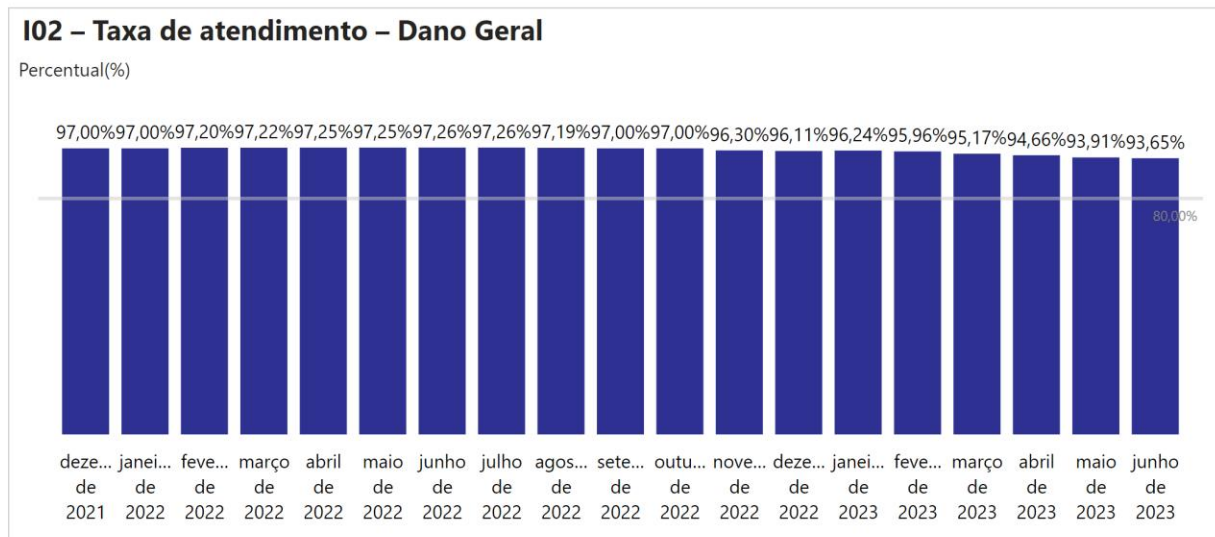


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal




Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

## Indicadores

### I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)




Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

## **PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**







#### **Objetivo**



Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- maio de 2023  Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- agosto de 2023  Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023  Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 4901 m<sup>3</sup>).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1210 m<sup>3</sup>).



## Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.627.560,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.627.560,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias.

## Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

# **PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

### **Objetivo**

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- outubro de 2023 ● Concluir Projetos de Culltura
- dezembro de 2023 ● Protocolo do documento de definição do programa junto ao CIF

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

### **1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo**

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

### **2. PBAQ**

5 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

## Fatos relevantes do mês

### Quilombolas

Visita à comunidade de Degredo para mapeamento de possíveis terrenos que poderão comportar as obras dos Programas de Casa da Tradição de Degredo; Quadra Multiuso; Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo; e Sede administrativa da ASPERQD, previstos no PBAQ, em 20.06.2023

Realização da reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 12.06.23

Apresentação do Plano de Trabalho, pela consultoria contratada para execução do Programa de Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ para o Comitê Gestor.

6ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 22.06.2023 e 23.06.2023



## Fiscadores

6ª oficina com GT/CT-IPCT para elaboração conjunta do documento de definição do PG04, em 22.06.2023 e 23.06.2023

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

## Entregas do ano de 2023




 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Entregas do ano de 2023

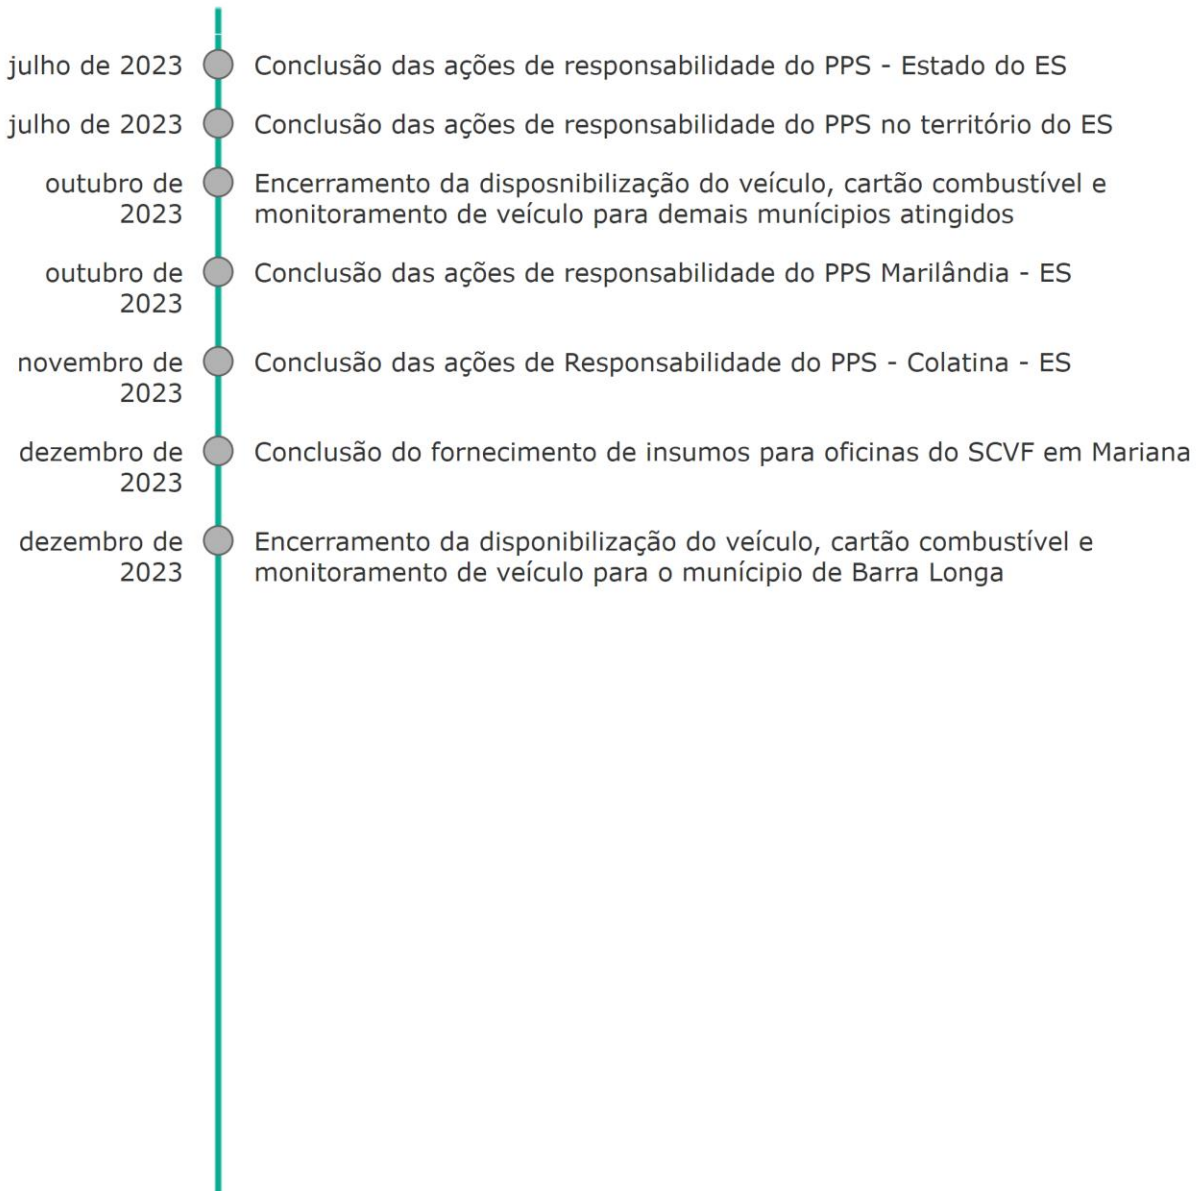

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 146.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 26,127,607.42 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 23.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

## **Fatos relevantes do mês**

Início da capacitação em Trabalho Social com Famílias, ofertada aos municípios: Bugre – MG, Galiléia – MG, Alpercata – MG, Iapu – MG, Marliéria MG, São José do Goiabal – MG, Sem - peixe – MG, Sobrália – MG, Tumiritinga – MG, Colatina – ES, Marilândia – ES, Sooretama – ES, Ipatinga-MG, São Pedro dos Ferros – MG.

Encerramento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira de Linhares

Conclusão da capacitação em Vigilância Socioassistencial, ofertada aos municípios: Galileia – MG, Rio Casca – MG, São José do Goiabal – MG, São Pedro dos Ferros – MG, Sooretama – ES, Colatina – ES, Marilândia – ES, Alpercata – MG, Sobrália – MG, Iapu – MG, Córrego Novo – MG, Marliéria- MG, Tumiritinga – MG.

COMAPPS – Estadual; Governador Valadares; São José do Goiabal, Rio Casca, Periquito (encerramento).



## Indicadores

### I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

### I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

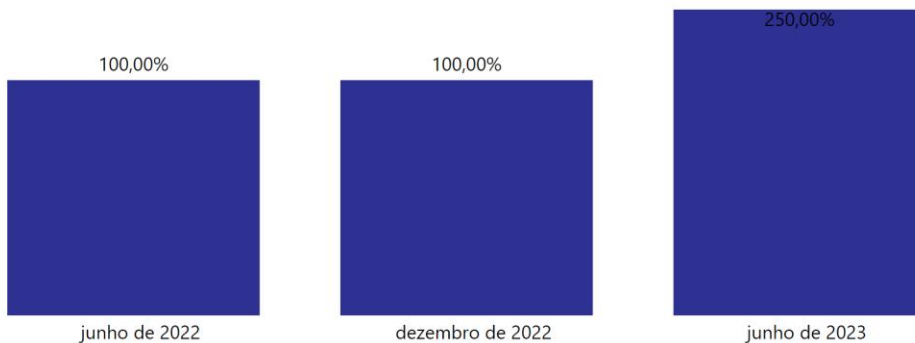


Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)

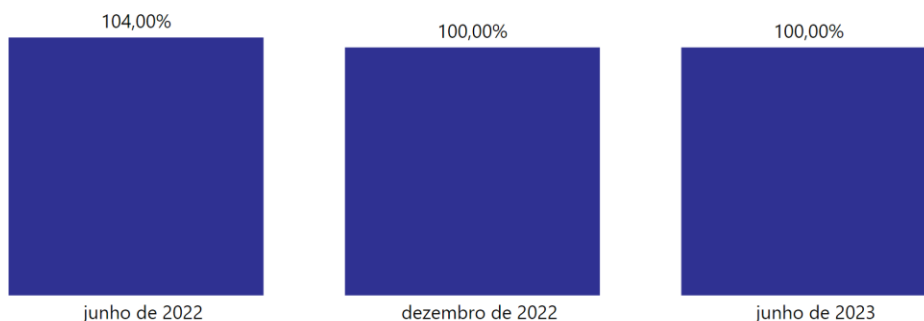


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

### I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)

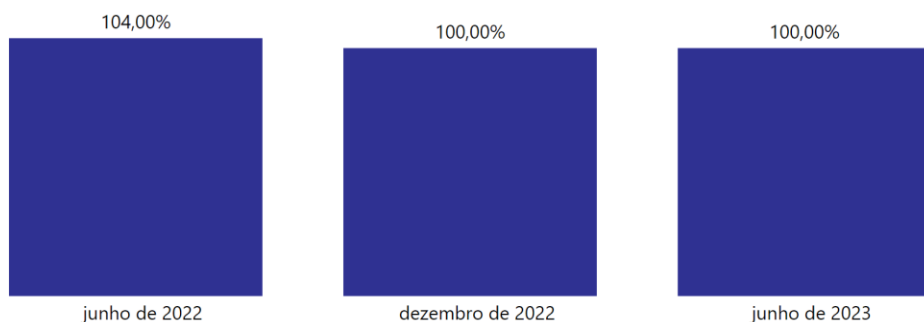


Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

### I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

## Indicadores

**I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)**

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

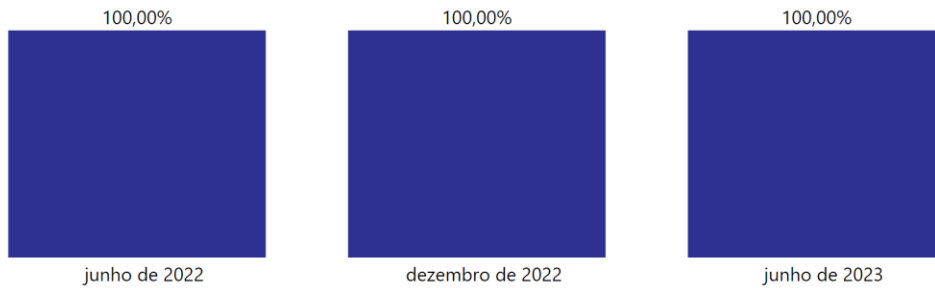


Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	mai/2023	jun/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	16	15	1.298
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	23	27	4.040
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	139.027



## Fatos relevantes do mês

Em Mariana, foram realizados Grupos de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos de reparação. Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para discussão de assuntos da reparação também foi realizada no Reassentamento. Encontro com moradores da comunidade de Ponte do Gama para visita às obras dos bens coletivos. Foi realizada também reunião com membros da Comissão dos Atingidos de Águas Claras para tratativas referentes ao Ofício FR. 2023. 1382.

No Alto Rio Doce, foram realizadas rodas de conversas para apresentação das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais em Barra Longa (MG). Ainda em Barra Longa (MG), Fórum de Prestação de Contas com moradores do município para apresentação das ações dos programas da área de Economia e Inovação e de Contratação e Empreendedorismo Local. Em Santa Cruz do Escalvado (MG) roda de conversa para apresentação do projeto Fortalecendo Redes e Organizações Sociais; roda de conversa com a comunidade dos Vianas, para apresentação das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais; na comunidade de Merengo, roda de conversa para apresentação do Plano de Reparação de Referências Culturais; roda de conversa com Grupo de Comunicação, para construção da próxima edição do jornal Terra da Gente e Fórum de Prestação de Contas com moradores do município, para apresentação das ações dos programas das áreas de Economia e Inovação e de Contratação e Empreendedorismo Local. Em Rio Doce (MG) também foi realizado Fórum de Prestação de Contas para apresentação das ações dos programas da área de Economia e Inovação e de Contratação e Empreendedorismo Local.

No Baixo Rio Doce, em Colatina (ES) apresentação do Projeto Doce Vivo aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Honório Fraga e reunião de apresentação do Edital Doce e ativos sociais do município. Em Aimorés (MG) reunião coletiva com pescadores e pescadoras profissionais para apresentação de ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras. Em Baixo Guandu (ES) foi realizada reunião de apresentação do Edital Doce e ativos sociais e reunião com moradores para divulgação da obra de captação alternativa de água.

No Médio Rio Doce, em Conselheiro Pena (MG) foi realizada reunião com produtores rurais do município para apresentação de ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce. Em Tumiritinga (MG), reunião com moradores de São Tomé do Rio Doce para informações acerca das obras de melhoria no abastecimento de água da comunidade. Em Galileia (MG) encontro com produtores de Galelia para apresentação das novas definições de atuação do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17). Em Governador Valadares (MG) reunião com pescadores e pescadoras da Colônia Z-19 do Leste Mineiro, para repasse de informações das ações do processo de reparação da Fundação Renova.

No território Calha do Rio Doce, ocorreu reunião com lideranças e moradores da comunidade de São Cândido para escuta qualificada e acolhimento de demandas relacionadas ao processo de reparação realizado pela Fundação Renova no município de Caratinga (MG). Ainda em Caratinga (MG) diálogo coletivo com lideranças e atingidos da Ilha do Rio Doce, para apresentação de ações desenvolvidas pela Fundação Renova no município e Resulta – Fórum de Prestação de Contas junto aos atingidos da Ilha do Rio Doce para apresentação de ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólido e para apresentação de informações dos Editais Doce e Redes. Em Córrego Novo (MG) foi realizada reunião com lideranças e moradores do município para escuta qualificada e acolhimento de demandas relacionadas ao processo de reparação realizadas pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

No Espírito Santo, destacam-se agendas Linhares (ES), encontros para apresentação do Projeto Doce Vivo, para estudantes de 1º a 5º ano da EMPEF Patrimônio do Humaitá e EEEF Princesa Isabel. Reunião com Associação Ribeirinha de Povos Tradicionais da Foz do Rio Doce, para discutir sobre o abastecimento de água na comunidade de Entre Rios. Reunião com moradores de Povoação, para apresentação das ações ambientais da Fundação Renova. Encontro com moradores do Município do próprio município para apresentação do Edital Doce 2023 e elucidações de dúvidas referentes ao processo. Agenda com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação, para esclarecimentos finais sobre a Feira Comunitária de Povoação. Reuniões com moradores e associações de Regência e Povoação para apresentação da 3ª Edição do Edital Doce Vivo. Em Sooretama (ES) foi realizada reunião com associação de pescadores de Comendador Rafael – ASPECOR, para início das atividades de consultorias para fomento de grupos produtivos.

## Indicadores

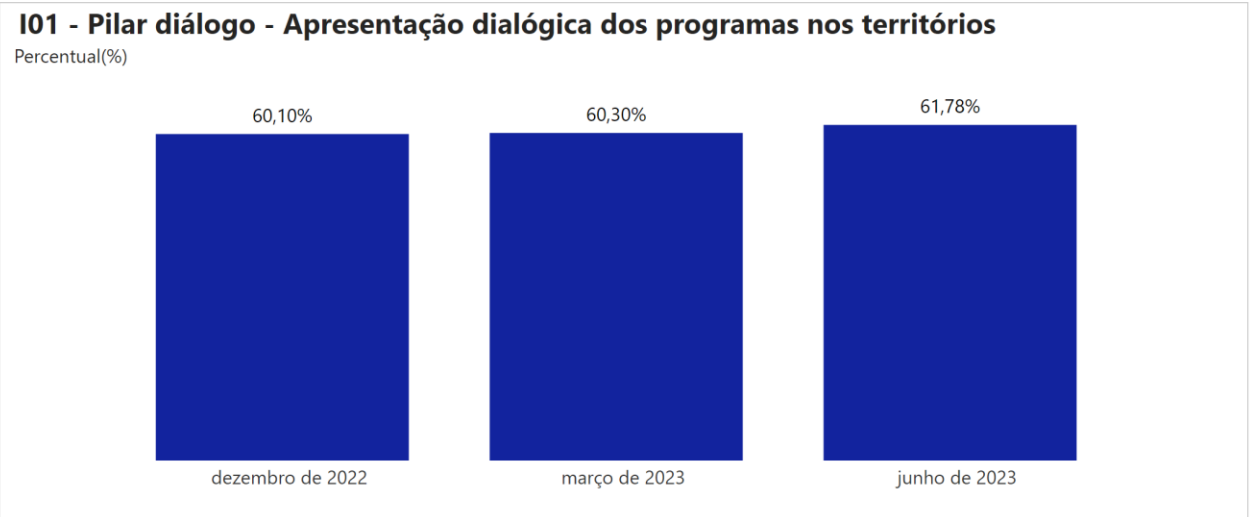


Gráfico 1: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

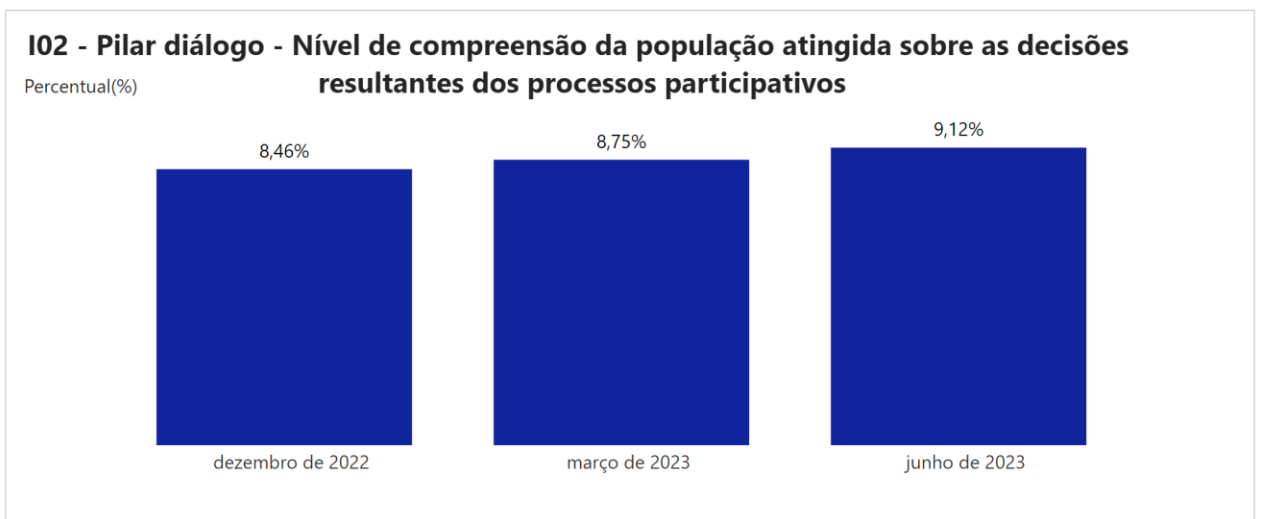


Gráfico 2: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

## Indicadores

### I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)

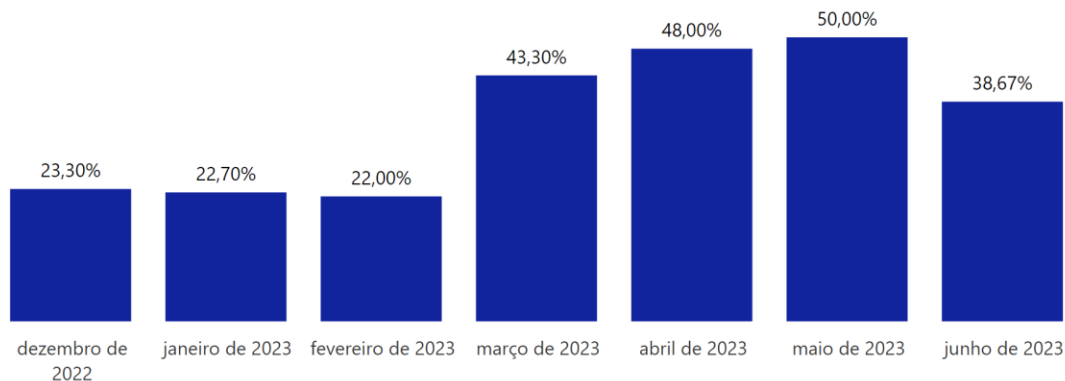


Gráfico 3: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

### I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)

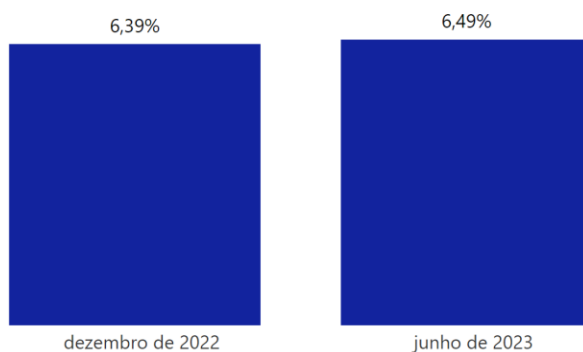


Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos




Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

### I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social

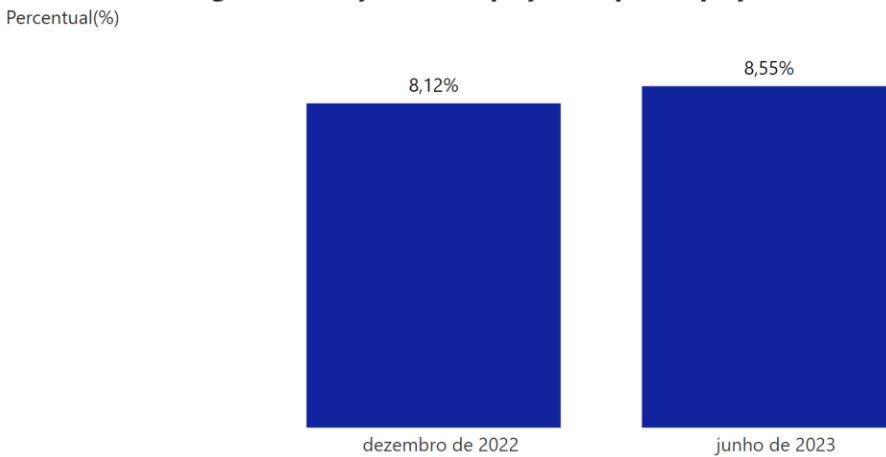


Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

## Indicadores

### I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 7: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

### I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Anual

## Indicadores

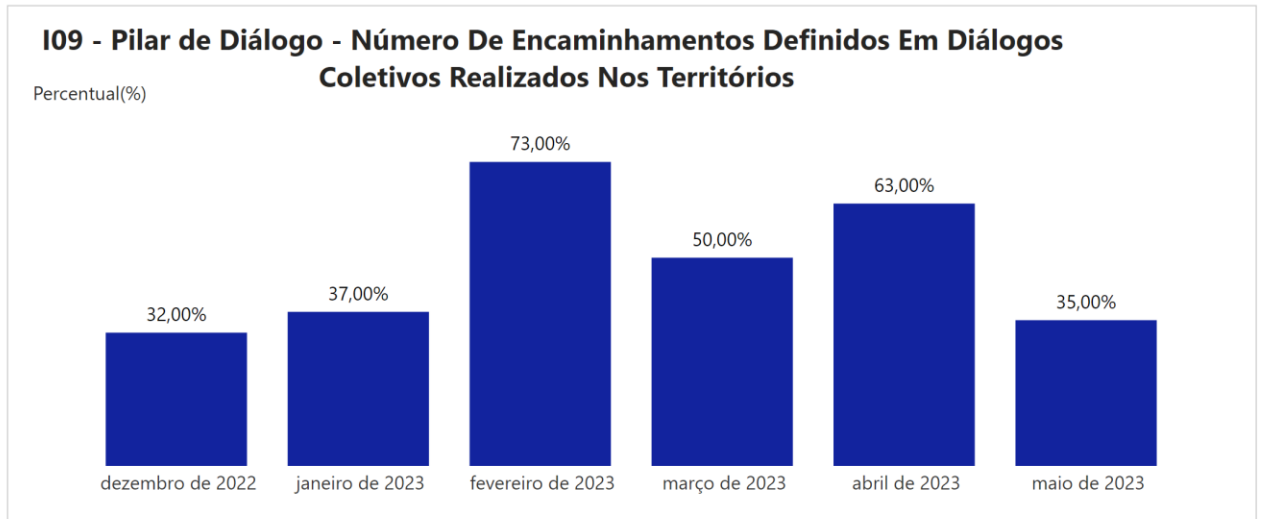


Gráfico 9: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

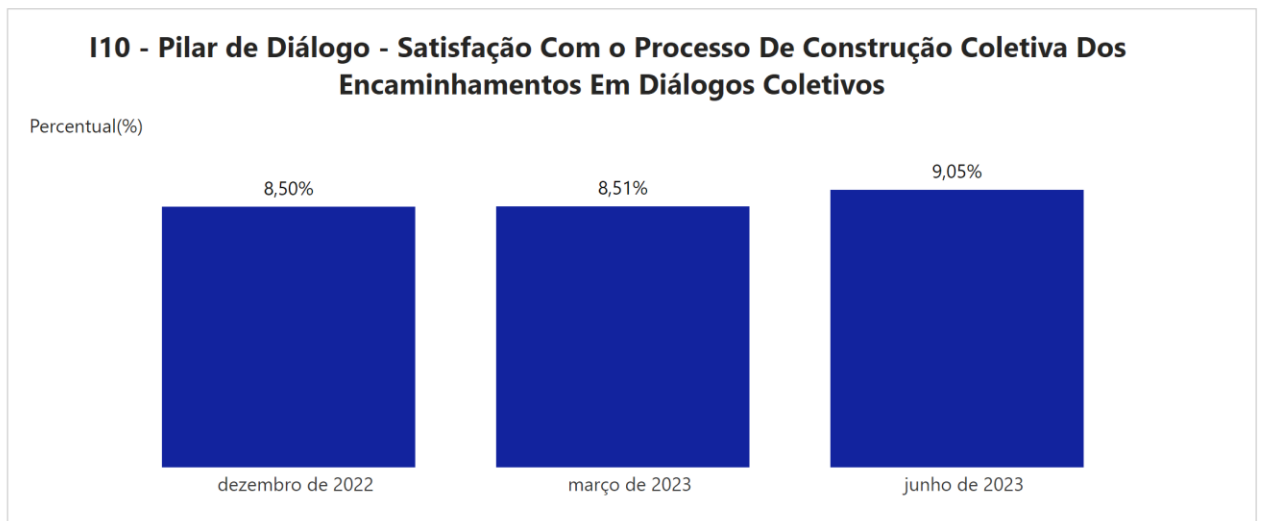


Gráfico 10: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA</b>
17.223,00	187,21

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	232,67
abril de 2023	230	
maio de 2023	204	-
junho de 2023	264	
		-



## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

## Indicadores

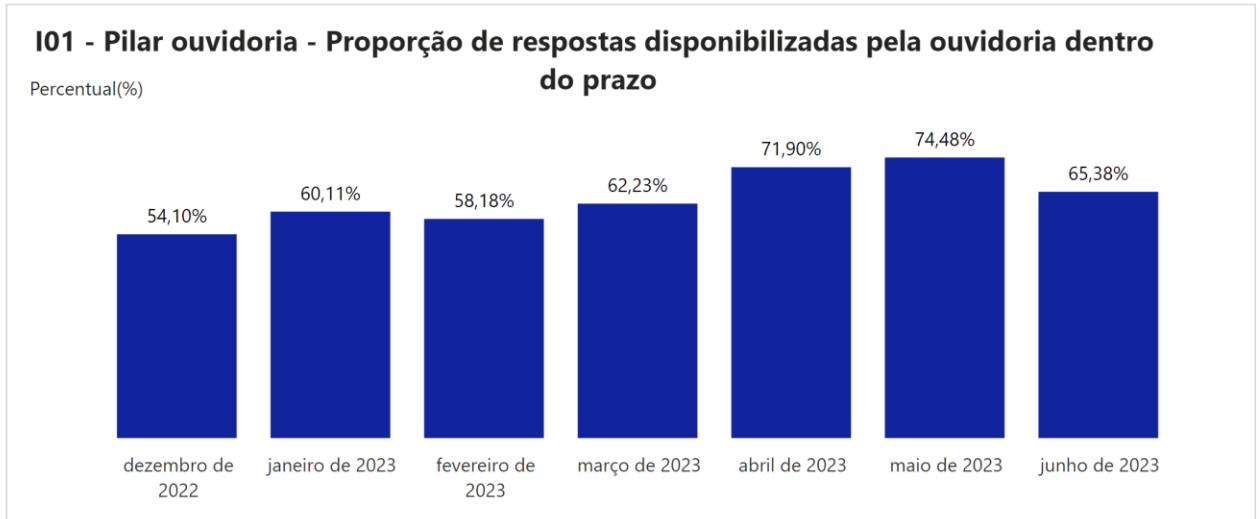


Gráfico 11: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência mensal

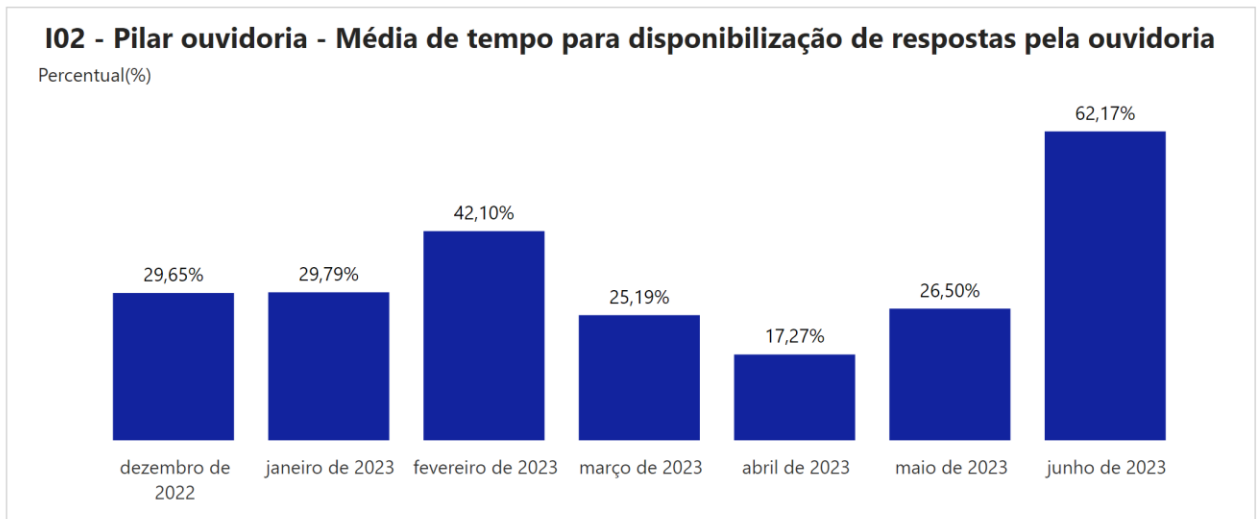


Gráfico 12: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

## Indicadores

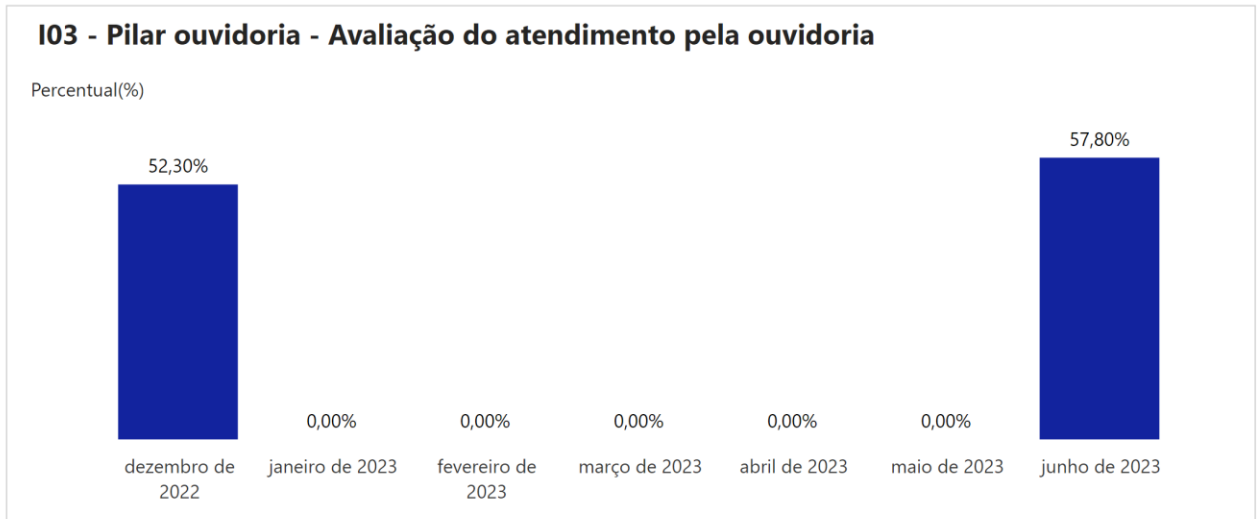


Gráfico 13: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	mai/2023	jun/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	340.691	342.509
Canais: Número total de manifestações	1.458.556	1.484.882
Canais: Número de manifestações respondidas	1.405.937	1.431.541
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	198.152	204.193
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	112.812	116.258
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	15.253	15.329
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.060.601	1.074.637
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	14	16
Canais: Número de manifestações em tratamento	52.619	53.341
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	71.738	74.465

## Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

## Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente





Gráfico 16: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

## Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 17: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● MUITO SATISFEITO ● SATISFEITO ● INDIFERENTE ● MUITO INSATISFEITO ● INSATISFEITO

Gráfico 18: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 19: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço

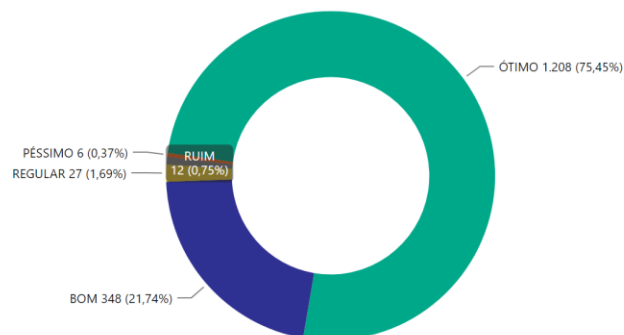

Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO

Gráfico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal



## Fatos relevantes do mês

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Ao longo do mês de junho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis: Em Itapina/Colatiana E Vila Krenak/Resplendor em 01/06. Em 06/06 em Santa Rita/Mariléria, Areal/Linhares e Baguari/Governador Valadares. Em 07/06 Bebedouro/Linhares e Ilha Brava/Governador Valadares. Maria Ortiz/Colatina e Califórnia/Sem Peixe em 13/06. Em 14/06 Mauá/Baixo Guandu e Rochedo/Fazendo Esmeralda/Rio Casca. Mascarenhas/Baixo Guandu e Córrego Preto/Fazendo Esmeralda/Rio Casca em 15/06. Em 20/06 Assentamento Liberdade/Periquito, São José do Goiabal e Povoação/Linhares. Em 21/06 em Periquito e São José do Goiabal. Em 22/06 em Guaxe/Pontal do Ouro/Linhares e São José do Goiabal. Em 26/06 em Barra do Cuieté/Conselheiro Pena e Interlagos/Linhares. Barra do Riacho/Aracruz e Conselheiro Pena em 27/06. Em 28/06 Nova Esperança/Linhares e Dionísio. Em 29/06 Regências/Linhares e Dionísio.

## Indicadores

### I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 21:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

### I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)

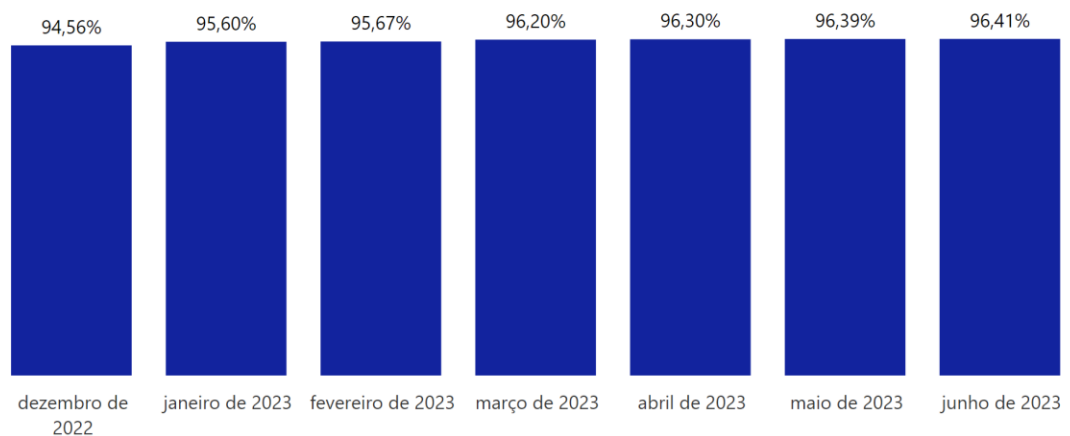


Gráfico 22: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)




Gráfico 23: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

### I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)

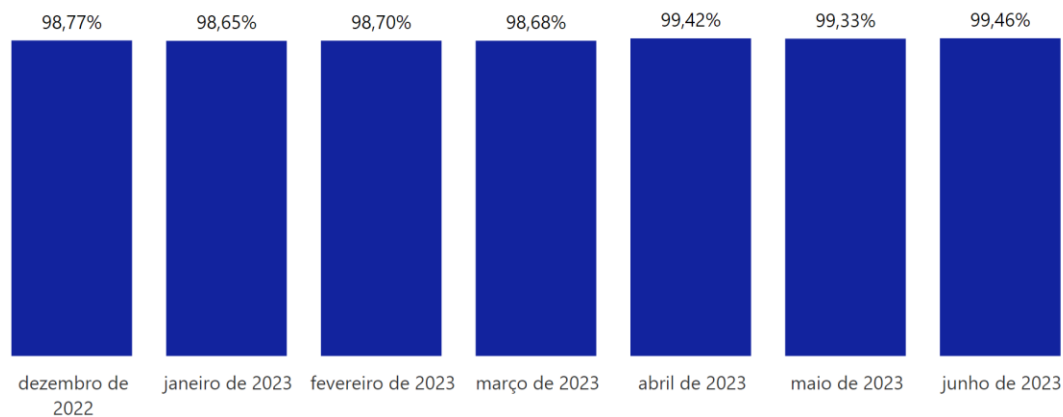


Gráfico 24: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

## Indicadores

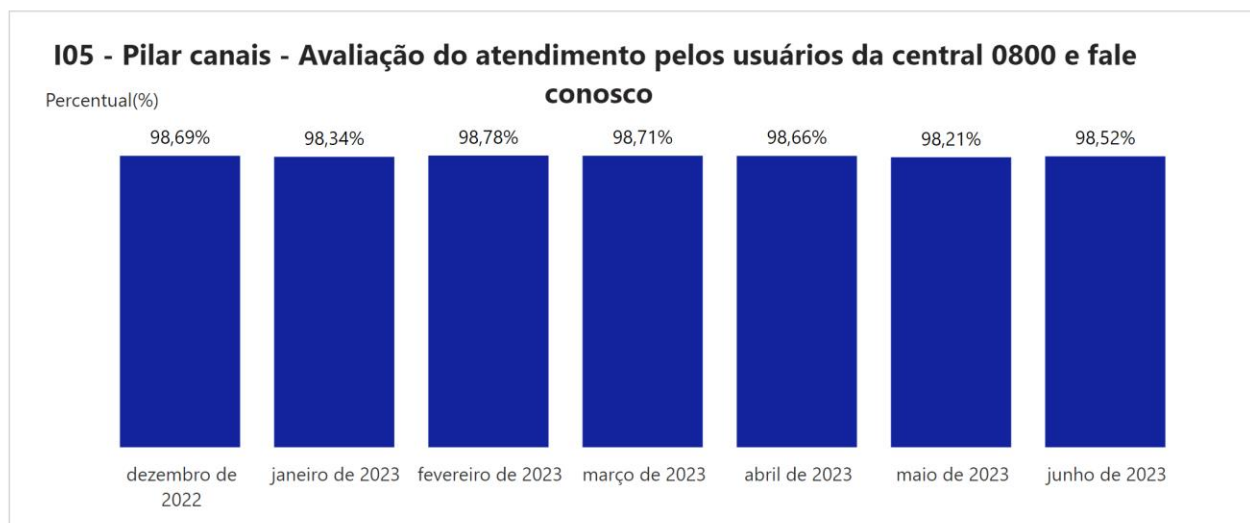


Gráfico 25: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

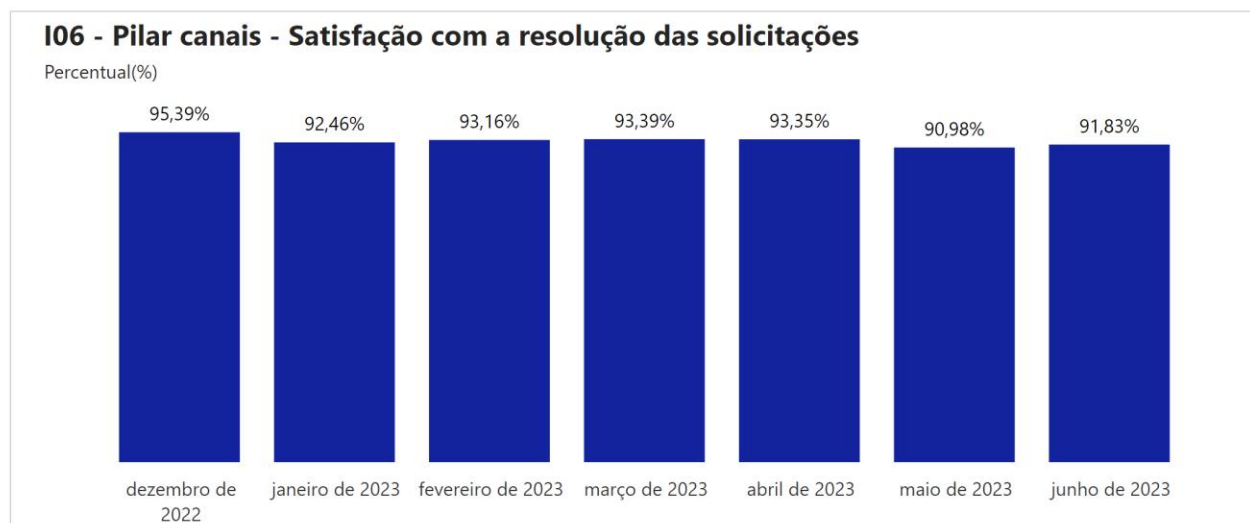


Gráfico 26: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 27: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

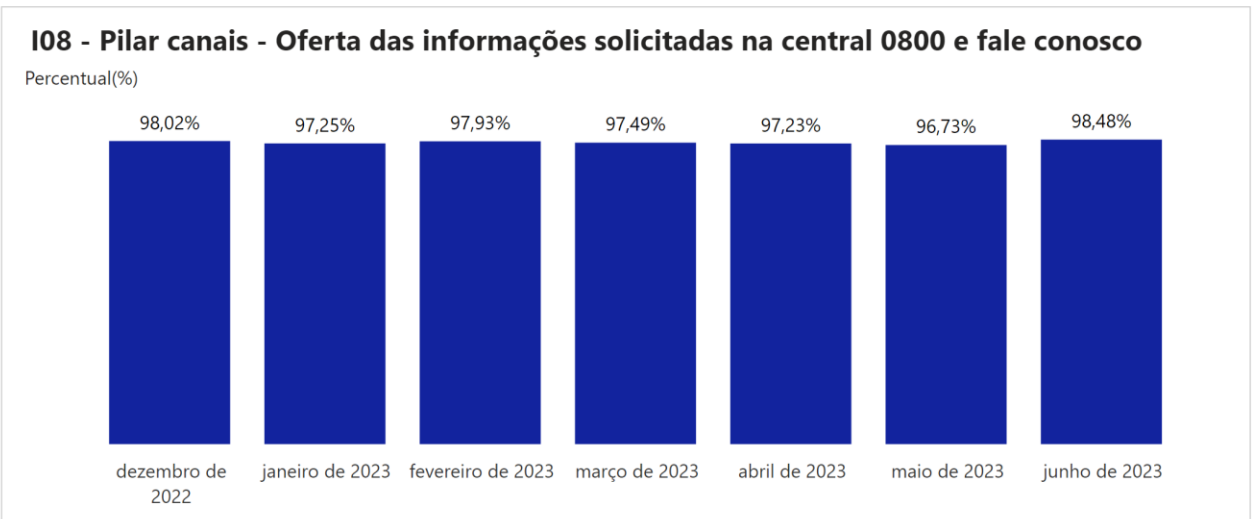


Gráfico 28: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 29: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 1º Semestre de 2023


DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
Áudios produzidos	1	0	1	0	0	3	<b>5</b>
Carros de som produzidos	0	0	1	0	0	1	<b>2</b>
Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1	<b>1</b>
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	1	<b>1</b>
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	0	1	2	<b>9</b>
Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	19	19	21	<b>138</b>
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	9	42	34	<b>197</b>
Mídias Sociais produzidas	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>
Newsletter produzidos	3	1	1	1	5	1	<b>12</b>
Outros itens produzidos	2	3	1	0	1	3	<b>10</b>
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	1	<b>3</b>
Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	9	27	20	<b>127</b>
Rádios produzidos	32	15	35	21	18	17	<b>138</b>
Vídeos produzidos	8	6	5	5	10	8	<b>42</b>

# COMUNICAÇÃO

## Grandes números do pilar

### Publicações por Território


Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartaz ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

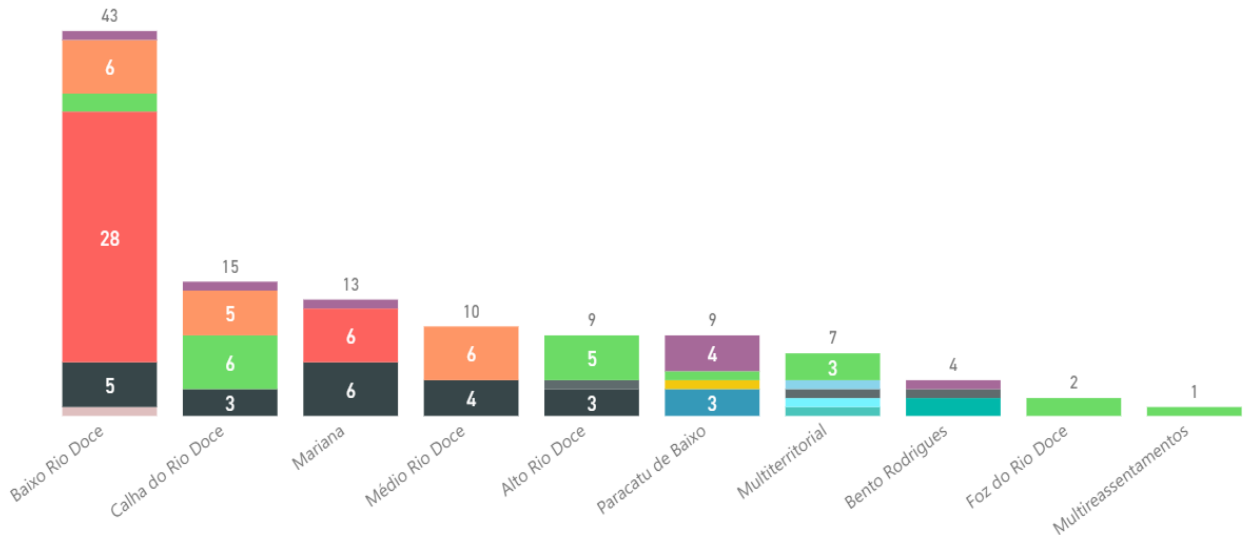

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

### Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● Carro de som ● Cartaz ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural ... ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pílula ● Rádio ● Vídeo





## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores para a realização do Fórum de Prestação de Contas - Resulta em Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores para a realização do Fórum de Prestação de Contas - Resulta em Rio Doce.

#### Baixo Rio Doce

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Repara Cidadão para a editoria Pratas da Casa informando sobre um famoso doce de Colatina chamado Pereveca.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés, na editoria Pratas da Casa, indicando o doce de Colatina chamado Pereveca.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu indicando, na editoria Pratas da Casa, o doce de Colatina chamado Pereveca.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Colatina indicando, na editoria Pratas da Casa, o doce de Colatina chamado Pereveca.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor indicando o doce de Colatina chamado Pereveca como Pratas da Casa

Produção de vídeo com o resumo da 12ª edição do boletim Repara Cidadão.

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Baixo Rio Doce

Produção de pílula para convidar os moradores de Baixo Guandu para uma reunião onde será explicado sobre a obra de captação alternativa de água na cidade.

Produção de programa de rádio convidando para a reunião comunitária em Baixo Guandu para explicar a obra de captação alternativa na cidade.

Produção de programa de rádio informando que o grupo de comunicação do Baixo participou do VimVer em Mariana e as ações de reparação que viram por lá.

Produção de spot para carro de som para convidar os moradores de Baixo Guandu para uma reunião onde será explicado sobre a obra de captação alternativa de água na cidade.

#### Calha do Rio Doce

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre a Ação de Empreendedorismo e Cidadania em Timóteo, no dia 24/06.

Produção de nota para programa de rádio (Momento da Reparação) anunciando a 12ª edição do boletim Vozes do Território.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores da comunidade da Ilha do Rio Doce (Caratinga) para Fórum Resulta no dia 13/06.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores da Ilha do Rio Doce, comunidade de Caratinga, para Oficina de Sensibilização de Projetos, no dia 29/06.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para Fórum Resulta no dia 27/06.

Produção de vídeo com o resumo das matérias publicadas na edição nº 12 (junho) do boletim Vozes do Território.

## Fatos relevantes do mês

### Imprensa

Semana de conscientização ambiental em Mariana e região.

Programa Recoloca Rio Doce tem 117 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Programa Recoloca Rio Doce tem 112 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce.

Programa Recoloca Rio Doce tem 111 vagas de emprego para o Vale do Rio Doce.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 550 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 480 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 450 vagas de emprego para Mariana.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 440 vagas de emprego para Mariana.

Moradores de Rio Doce têm até o dia 3 de julho para aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Mariana se prepara para receber o Circuito da Água Bacia do Rio Doce.

Investimentos em saneamento no Vale do Aço beneficiarão 315 mil pessoas.

Inscrições para dois novos cursos profissionalizantes gratuitos em Ipatinga e região estão abertas até 20/06.

Curso profissionalizante do Senai oferece vagas gratuitas em Colatina.

Ação gratuita reúne atividades de lazer, cidadania e empreendedorismo em Timóteo.

Ação gratuita reúne atividades de lazer, cidadania e empreendedorismo em Santana do Paraíso.

3ª edição do Edital Doce abre inscrições para projetos mineiros e capixabas.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

Produção de pílula de WhatsApp para moradores de São Mateus com esclarecimentos sobre a realização do Cadastro Integrado.

Produção de pílula de WhatsApp para moradores de Conceição da Barra com esclarecimentos sobre a realização do Cadastro Integrado.

#### **Suporte à Relações Institucionais**

Produção de pílula de WhatsApp sobre o Vimver, em Barra Longa, e o prazo das inscrições e a data da vivência.

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Produção de programa de rádio sobre as inscrições para o curso profissionalizante de Risco e Corte ofertado em Colatina.

Produção de pílula para divulgar as inscrições do curso profisisonalizante de Risco e Corte para moradores de Colatina.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre a realização do Encontro de Negócios do projeto +Gestão, em Ipatinga, no dia 27/06.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor sobre vagas disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu sobre vagas disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés sobre vagas disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Repara Cidadão respondendo dúvidas da comunidade e se os moradores do Baixo teriam direito à indenização pelo Novel Infraestrutura.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés respondendo dúvidas da comunidade se os moradores do Baixo teriam direito à indenização pelo Novel Infraestrutura.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu respondendo dúvidas da comunidade se os moradores do Baixo teriam direito à indenização pelo Novel Infraestrutura.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Colatina respondendo dúvidas da comunidade se os moradores do Baixo teriam direito à indenização pelo Novel Infraestrutura.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor respondendo dúvidas da comunidade se os moradores do Baixo teriam direito a indenização pelo Novel Infraestrutura.

Produção de pílula de WhatsApp informando que os valores da matriz de danos passaram a ser pagos com correção monetária.

#### Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés informando que a Ouvidoria da Renova agora também atende pelo whatsapp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu informando que a Ouvidoria da Renova agora também atende pelo whatsapp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Colatina informando que a Ouvidoria da Renova agora também atende pelo whatsapp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor informando que a Ouvidoria da Renova agora também atende pelo whatsapp.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o atendimento da Ouvidoria por meio de WhatsApp, 24 horas por dia.

Produção de nota para programa de rádio (Momento da Reparação) informando que a Ouvidoria passa a contar com atendimento 24h via WhatsApp.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Produção e distribuição da edição 52 do Informe de Bento, versão newsletter, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e processo de habitação do distrito de Bento Rodrigues.

Produção de pílula com informações sobre o funcionamento do Centro de Atendimento ao Morador de Bento Rodrigues para apoiar os moradores do novo distrito.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre aula experimental na nova escola de Bento Rodrigues.

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas**

Produção e distribuição da edição 52 do Informe de Bento, versão vídeo, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre vagas para contratação dos serviços nos distritos.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre atividades de integração e vivência dos futuros moradores nos distritos.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre as etapas para a família se mudar para as residências nos distritos.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Elaboração de pílula com reforço convite e da rota de transporte para o encontro com a comunidade de Paracatu, realizado no dia 03/06.

Elaboração de vídeo com informações sobre as obras do campo de futebol, da quadra poliesportiva e do Centro de Atendimento ao Morador de Paracatu.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre escolha do nome do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas no mês, com as famílias de Paracatu.

Produção e distribuição da edição 52 do Informe de Paracatu, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção e distribuição do vídeo sobre a edição número 52 do Informe de Paracatu, informativo mensal direcionado para as famílias do reassentamento coletivo.

Produção e divulgação do vídeo Repórter por um dia sobre a iluminação pública de Paracatu e o encontro com as famílias, realizado no dia 3 de junho.

Produção e envio de podcast para as famílias de Paracatu com informações sobre o posto de saúde - Parte 1.

Produção e envio de podcast para as famílias de Paracatu com informações sobre o posto de saúde - Parte 2.

Produção e envio de podcast para as famílias de Paracatu com informações sobre o posto de saúde - Parte 3.

#### **Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística**

Produção de matéria para a edição de junho do Jornal Mural de Mariana sobre Sabores de Bento, projeto apoiado pelo Edital Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o projeto Abrindo Espaços, em Barra Longa, e sobre a roda de conversa do Plano de Reparação das Referências Culturais no território.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção da edição 33 do boletim Terra da Gente com informações sobre a terceira edição do Edital Doce.

Produção de banner com informações gerais sobre o 3º Edital Doce.

Produção de cartaz com informações gerais sobre o 3º Edital Doce.

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Aimorés sobre a 3ª edição do Edital Doce, prazos e como se inscrever

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu sobre a 3ª edição do Edital Doce, prazos e como se inscrever.

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Colatina sobre a 3ª edição do Edital Doce, prazos e como se inscrever.

Produção de cartaz para o Jornal Mural do CIA de Resplendor sobre a 3ª edição do Edital Doce, prazos e como se inscrever.

Produção de e-mail marketing com informações gerais sobre o 3º Edital Doce.

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Repara Cidadão com informações sobre o projeto Resgatando Anjos da Melhor Idade, de Aimorés, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Vozes do Território com atualizações sobre as entregas do Projeto de Incentivo à Leitura na Calha do Rio Doce.

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Vozes do Território com informações sobre o projeto Cumbuca, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.

Produção de matéria para a edição 31, de junho, do Voz da Comunidade sobre inscrições abertas para a terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés sobre o projeto Resgatando Anjos da Melhor Idade, de Aimorés, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu sobre o projeto Resgatando Anjos da Melhor Idade, de Aimorés, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Colatina sobre o projeto Resgatando Anjos da Melhor Idade, de Aimorés, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor sobre o projeto Resgatando Anjos da Melhor Idade, de Aimorés, apoiado pelo Edital Doce. A matéria também trouxe informações sobre as inscrições para a terceira edição do Edital.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) informando que estão abertas as inscrições para a terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o lançamento da 3ª Edição do Edital Doce.

Produção de nota para o programa de rádio (Momento da Reparação) informando que as inscrições para o 3º Edital Doce estão abertas.

Produção de panfleto (frente e verso) com informação sobre o 3º Edital Doce.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre as oficinas para esclarecimento de dúvidas sobre o 3º Edital Doce.

Produção de programa de rádio trazendo um balanço do Edital Doce e chamada para as inscrições da terceira edição.

Publicação de matéria sobre o projeto Alpercata + Feliz, apoiado pelo Edital Doce, e sobre a 3ª edição do Edital na 11ª edição do boletim Voz do Rio Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o termo de cooperação para retomada das atividades aquícola para pescadores de Belo Oriente.

#### **Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

Produção da edição 33 do boletim Terra da Gente com informações sobre o status das obras de infraestruturas complexas nas propriedades rurais do território.

Produção de matéria na 12ª edição do boletim Repara Cidadão com informações sobre a doença da Vaca Louca e como produtores rurais podem manter seus animais livres da doença.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Aimorés sobre a doença da Vaca Louca e como produtores podem manter seus animais longe da doença.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Baixo Guandu sobre a doença da Vaca Louca e como produtores podem manter seus animais longe da doença.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Colatina sobre a doença da Vaca Louca e como produtores podem manter seus animais longe da doença.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Resplendor sobre a doença da Vaca Louca e como produtores podem manter seus animais longe da doença.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o curso de qualidade do leite e criação de bezerras para os produtores rurais de Barra Longa.

#### **Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica**

Produção da edição 33 do boletim Terra da Gente com informações sobre cursos profissionalizantes, oficinas e projetos que incentivam a economia local nas comunidades.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local**

Produção de informativo Resulta fazendo um balanço das ações realizadas pelos programas ligados ao fortalecimento econômico das comunidades.

Produção de matéria para a edição de junho do Jornal Mural de Mariana sobre vagas disponíveis no Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de São Domingos do Prata para aula experimental sobre capacitação profissional, a fim de entender os cursos que serão realizados no município.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação das oportunidades de emprego nas obras dos reassentamentos.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgar que estão abertas as inscrições do Curso de Iniciação Profissional em Gestão de Recursos Humanos, em parceria com o Senai, para moradores de Ipatinga e região.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgar que estão abertas as inscrições do Curso de Iniciação Profissional em Programação em Arduino, em parceria com o Senai, para moradores de Ipatinga e região.

Publicação de matéria sobre o Recoloca Rio Doce e vagas abertas na região na 11ª edição do boletim Voz do Rio Doce.

#### **Suporte ao PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

#### **Suporte ao PG028 Conservação da Biodiversidade**

Produção de matéria para o programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o Edital do Projeto Biodiversidade, parceria entre a Fundação Renova e a FunBio.

Produção de programa de rádio sobre o edital aberto para contratar instituições de pesquisa e conservação da biodiversidade.

## Indicadores

### I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Pontos



Gráfico 30: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

### I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 31: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 32: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

### I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 33: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

- 1,388 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 499 restituições, 203 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 481 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 372 bovinos, 66 equinos, 21 caninos, 18 Suínos, 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,911 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%  
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de outono (maio de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

## Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

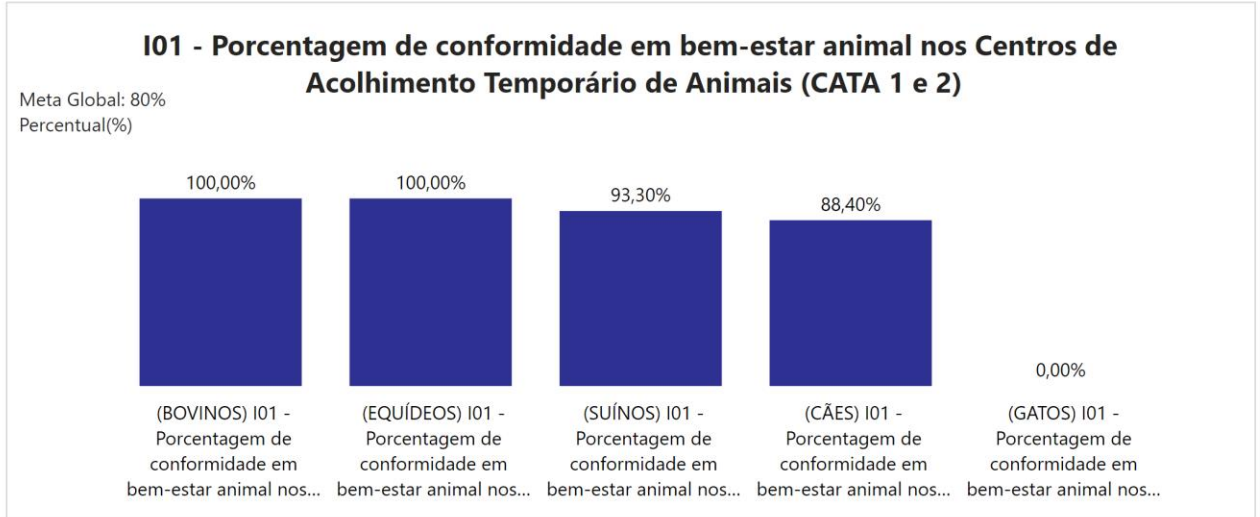


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

## Indicadores

### I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, não houve ocorrência relacionadas ao indicador de processos adotivos finalizados.

## Indicadores

### I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, além das ocorrências relacionadas ao fluxo de rotina de entradas e saídas de animais (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências), ocorreram 17 restituições definitivas de animais de grande porte para famílias que tiveram concluído a reparação do direito à moradia, implicando em atualização do indicador para 15,97%.

## Indicadores

### I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, houve ocorrência de restituição definitiva de 2 cães (Prontuários CATA1\_050 e CATA1\_266), e que estão em processo de acompanhamento pós-restituição conforme previsto na Definição do Programa, e somente comporão os resultados deste indicador após a conclusão desta etapa de monitoramento.

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.



## Projeto Reconstrução de Vilas

### Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Entregas do ano de 2023**

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

187 famílias atendidas (com novos núcleos);

196 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

18 atendimentos para bens de uso coletivo;

200 atendimentos para casas com novos núcleos;

34 atendimentos para lotes vagos;

2 bens coletivos interrompidos;

11 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

5 estruturações de lotes vagos interrompidas.

#### **Pecúnia:**

22 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

#### **Obras:**

35 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

132 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

5 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

3 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;

18 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);

117 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;

3 habite se emitido para bens coletivos.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Grandes números do projeto**

#### **Obras:**

0 estruturação de lote vago com obra com assinatura do TRR;

0 bens coletivos com assinatura do TRR;

20 edificações (casa, comércio emisto) com assinatura do TRR.

## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Fatos relevantes do mês**

Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID156.

Finalização de Obra do IDNI3

Finalização de Obra do ID256.

Finalização de Obra do ID225.

Finalização de Obra do ID210.

Finalização de Obra do ID154-UH2.

Finalização de Obra do ID154-UH1.

Finalização de Obra do ID10.

Finalização da Estruturação do lote ID137B.

Finalização da estruturação do lote ID117.

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Entregas do ano de 2023**

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

71 famílias atendidas (com novos núcleos);

73 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

14 atendimentos para bens de uso coletivo;

63 atendimentos para Edificações (Casa, Comércio e Misto) com novos núcleos;

4 atendimentos para lotes vagos;

0 bens coletivos interrompidos;

6 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

1 estruturações de lotes vagos interrompidos;

0 Sítios interrompidos com novos núcleos;

16 Atendimentos para sítios com novos núcleos.

#### **Pecúnia:**

10 termos de aceite - Pecúnia – assinados;

#### **Obras:**

3 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

50 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

6 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Grandes números do projeto**

- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 40 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;
- 1 Sítios com obra iniciada com novos núcleos;
- 7 Sítios com Obras Concluídas com novos núcleos (Com TERP);
- 4 habite se emitidos para bens coletivos.
- 0 sítios com obras concluídas com assinatura do TRR;
- 0 estruturação de lote vago com assinatura do TRR;
- 0 bens coletivos com assinatura do TRR;
- 2 edificações (casa, comércio e misto) com assinatura do TRR.



## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Pecúnia - Homologação de Pagamento - NN.94.

Pecúnia - Homologação de Pagamento - ID23B.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas do ano de 2023**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## **Projeto de reconstrução de Gesteira**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

37 famílias atendidas;

31 atendimentos com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

7 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel);

0 edificações em aquisição;

5 Número de casas com acordo homologados;

15 Número de bens coletivos com acordo homologados.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Fatos relevantes do mês**

Acordo Homologado - N.A28.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Entregas do ano de 2023**

“Excepcionalmente esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo os dados serão reportados.”

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- 102 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 3 construções casa nova e reforma interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidas;
- 94 imóveis adquiridos;
- 13 famílias atendidas na modalidade reconstrução.

#### **Pecúnia:**

- 138 termos de aceite - Pecúnia – assinados (Pecúnia Geral e Pecúnia Novos Núcleos).

#### **Obras:**

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 16 atendimentos na modalidade reconstrução;
- 13 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas com novos núcleos (com TERP);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 25 habite se para edificações (casa nova e reforma) obtidos;
- 3 estruturação de lote vago com obra com assinatura do TRR;
- 24 edificações casa nova e reforma com assinatura do TRR.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Grandes números do projeto**

#### **Repasse de verba:**

38 Reconstrução: Repasse de Verba (Autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma) .

#### **Moradia Temporaria:**

256 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel) .

## **PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.




## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente



## Timeline de Entregas do Programa

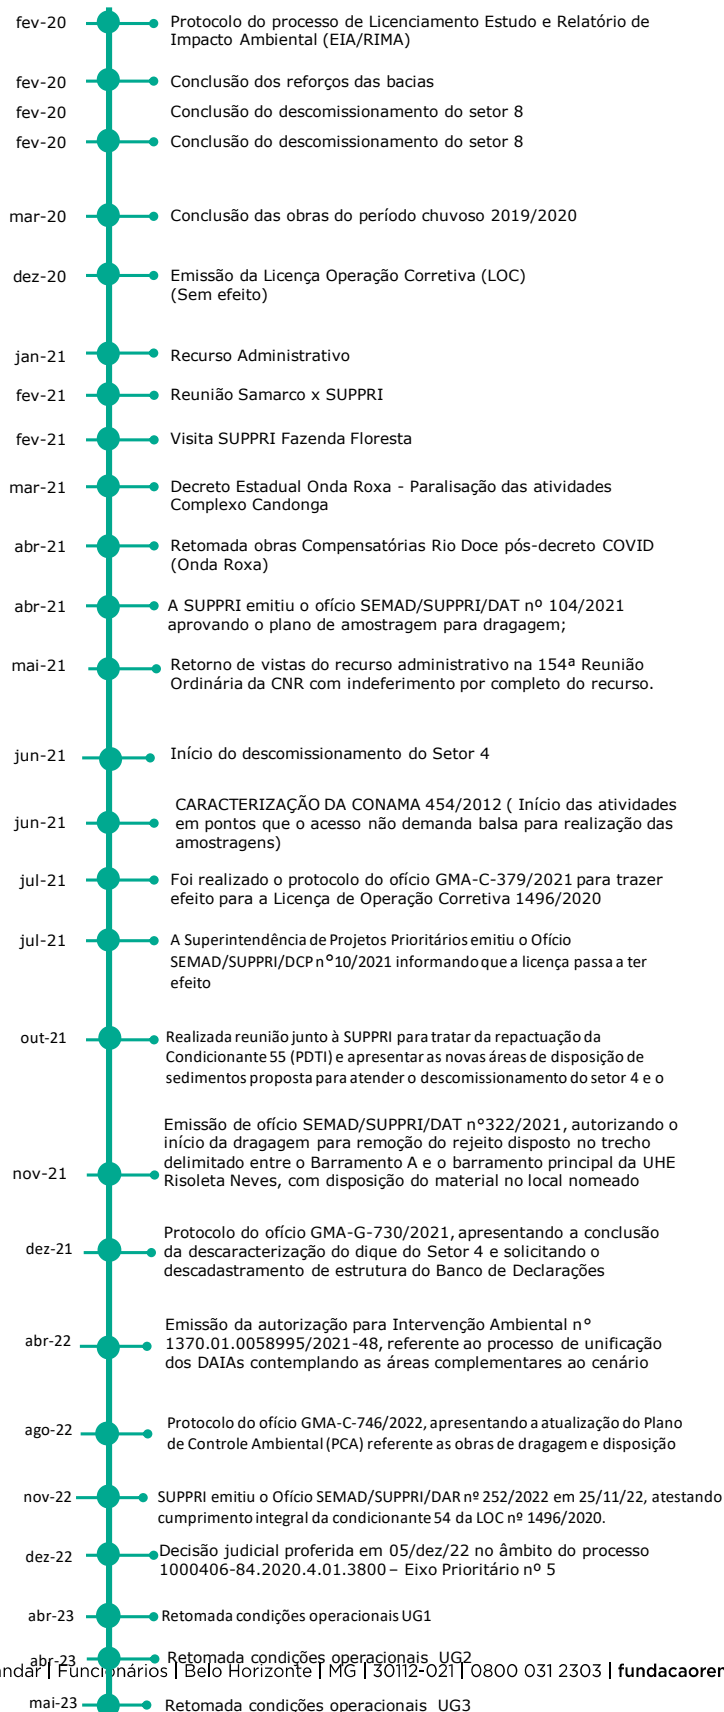

## Progressos do Mês

### Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m<sup>3</sup> de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m<sup>3</sup>**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m<sup>3</sup>** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

## FATOS RELEVANTES DO MÊS

- **Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)**
- Descaracterização das estruturas de disposição temporária

### **ASS4:**

Vol. Previsto	Vol. Executado	Saldo
34.077 m <sup>3</sup>	26.924,2 m <sup>3</sup>	7.152,8 m <sup>3</sup>
100%	79,01%	20,99%

*Tabela 1 – Evolução descaracterização AAS4*



*Figura 1 – Em andamento descaracterização das estruturas AAS4*

## **ADME-2:**

Vol. Previsto	Vol. Executado	Saldo
70.442 m <sup>3</sup>	48.791,1 m <sup>3</sup>	21.630,9 m <sup>3</sup>
100%	69,28%	30,72%

*Tabela 2 – Evolução descaracterização ADME-2*



*Figura 2 - Em andamento descaracterização das estruturas ADME-2*



*Figura 3 – Descomissionamento e implantação do sistema de drenagem Setor 5b*

- Disposição de sedimentos em bacias (Status:25/06)

Previsto total	56.928,00 m <sup>3</sup>
Realizado	37.790,70 m <sup>3</sup>
Saldo	19.137,30 m <sup>3</sup>

Tabela 3 – Evolução Disposição em bacias



Figura 4 - Disposição de sedimentos bacia 1

- Empilhamento de sedimentos (Status: 25/06)

Previsto total	70.356,00 m <sup>3</sup>
Realizado	62.525,62m <sup>3</sup>
Saldo	<b>7.830,38m<sup>3</sup></b>

Tabela 4 – Evolução Disposição em pilhas



Figura 5 - Contrapilhamento O.E Dique Principal

- Sistema de drenagem estruturas setor 11



## ➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

**Nota:** As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

### ✓ Destaques:

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- A obra de estabilização da ADME A encontra-se em andamento. Em decorrência do aterro de selagem, os marcos e crack meters foram descomissionados.
- Não houve pontos de destaque no monitoramento dos deslocamentos. Foram instalados novos marcos na Pilha 1 e ADME 1.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

## ➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

**Nota:** Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 2 para a bacia 1.
- Saída: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 1 para o Rio Doce.

### **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme mencionado no relatório anterior:

#### Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.



- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
  - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como background da região.
  
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
  - Desvio de alumínio dissolvido, cor verdadeira, ferro dissolvido, fósforo, manganês, sólidos suspensos totais e turbidez. Não há atividades do projeto na vertente do córrego dos Borges e os desvios já foram visualizados no ponto de montante, em local sem possibilidade de interferência pelo empreendimento.
  
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe
  - Desvios de alumínio dissolvido, ferro dissolvido e manganês. Reforça-se que não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto eventuais desvios neste não guardam nexos causal com o empreendimento.
  
- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
  - Desvios de manganês e ferro dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.
  
- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
  - Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

## ✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 7 - Localização Nascente 2



Figura 8 - Nascente 2

## **Conclusões / considerações finais**

- A Nascente 2 apresentou desvios Ferro e Manganês no período no monitoramento.

**Nota:** Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

## ✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05) e um poço na pedreira Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-01. Está em andamento as atividades de perfuração e instalação do FLOR-PM-PROP-07 e LOR-PM-PROP-06.

## ✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

## Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

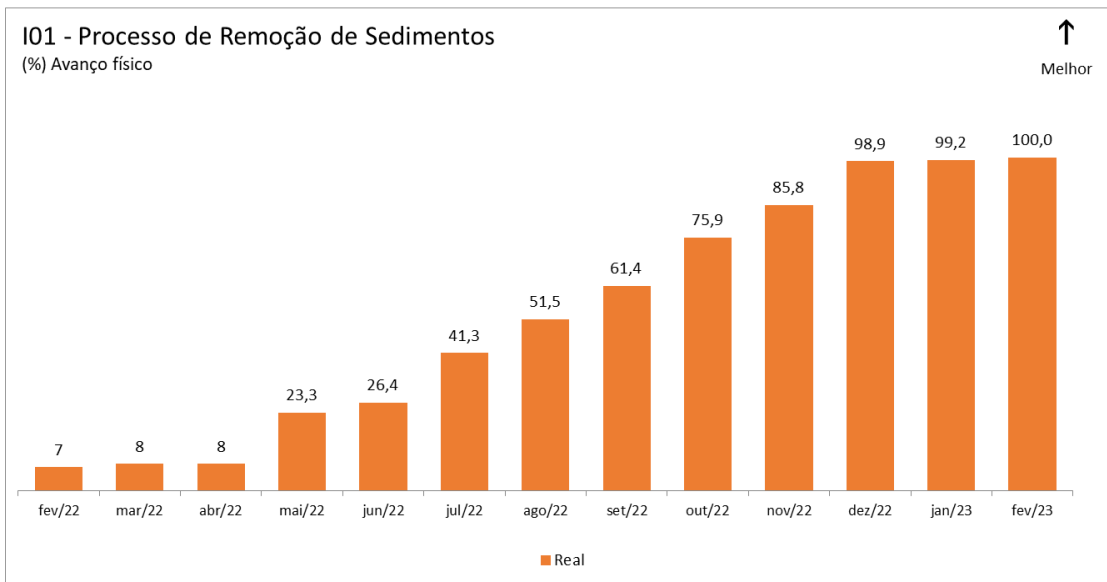


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

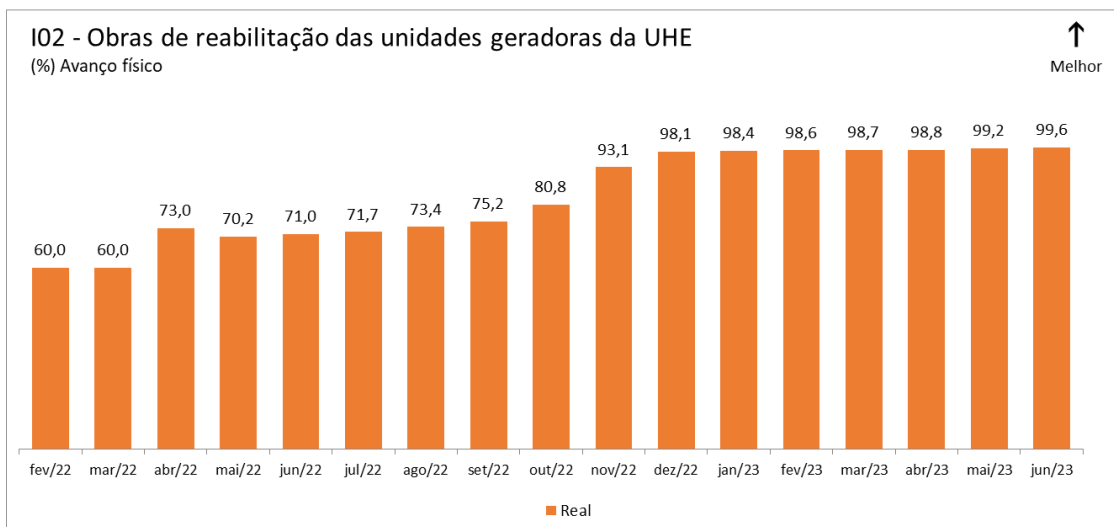


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

## Indicadores

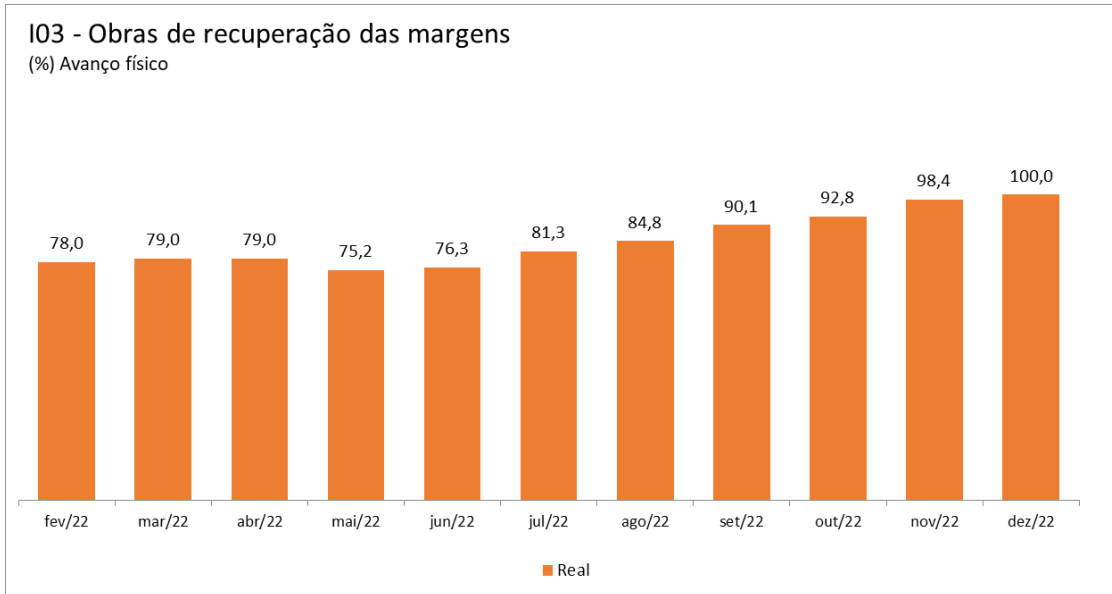


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

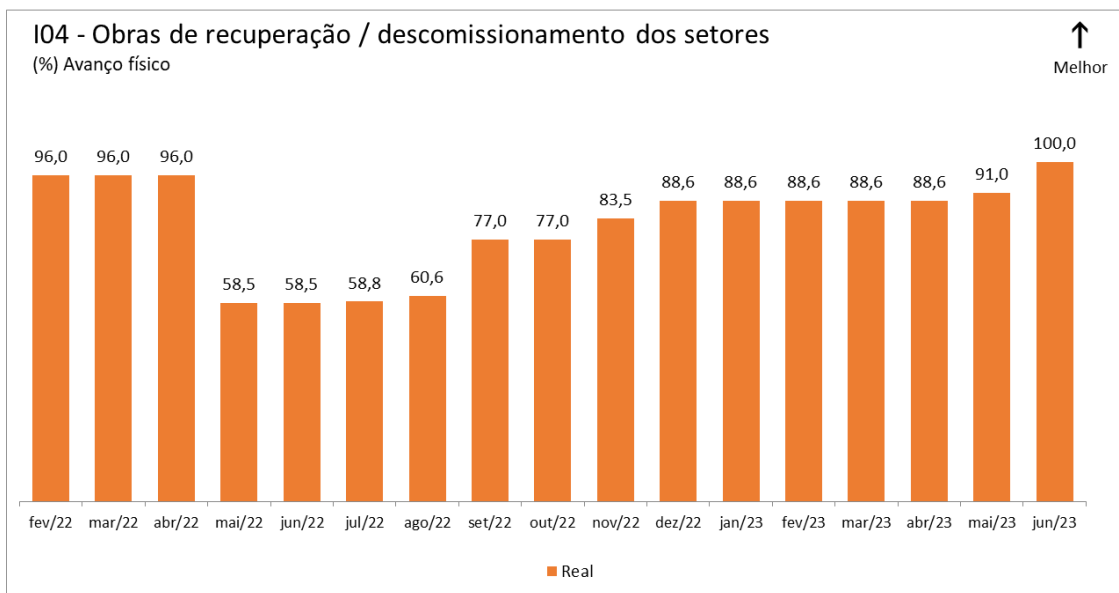


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

**Nota:** A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

# **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- março de 2023 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
- março de 2023 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- maio de 2023 ● Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
- outubro de 2023 ● Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)
- dezembro de 2023 ● PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
- dezembro de 2023 ● PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes Números do Programa**

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.888,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.080,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.562 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 214 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

### **Barra Longa:**

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

**Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

**Termos de entrega para Morádias e Comércio:**

**Morádias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

**Comércio Barra Longa:**

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

## Fatos relevantes do mês

Conclusão das obras dos Bens Públicos de Ponte do Gama;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Gesteira x Claudio Manoel - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Gesteira x Engenho Fernandes x Rocinha x Ponte Corvinas - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Ponte Jurumirim x Pimenta x Tabuões x Dobra - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Tabuões x Gesteira - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Tabuões x Pau D alho - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção de vias pavimentadas - Entrega definitiva - Trecho: Trevo de São João x Bonito x Fazenda dos Macacos - aguardando retorno do termo de aceite assinado pela prefeitura de Barra Longa;

Manutenção em 80,20 km de vias não pavimentadas;

Visita da comunidade a obra dos Bens Públicos de Ponte do Gama em 16/06/23.

## Indicadores

### I1 – % Obras concluídas de impacto direto

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

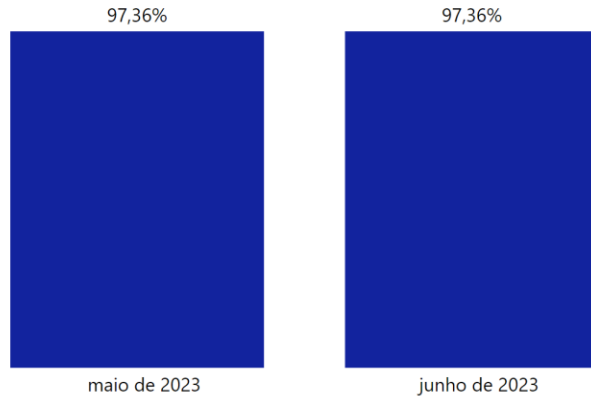


Gráfico 1: I1 – % Obras concluídas de impacto direto - Frequência Mensal

### I2 – % Obras concluídas de impacto indireto

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

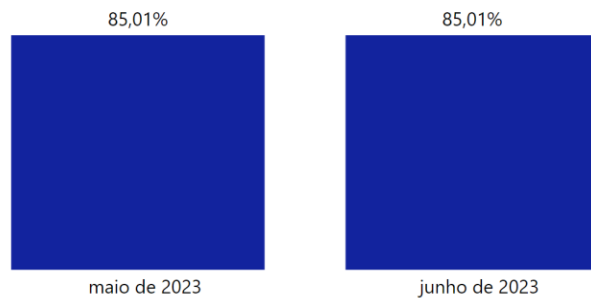


Gráfico 2: I2 – % Obras concluídas de impacto indireto - Frequência Mensal

## Indicadores

### I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

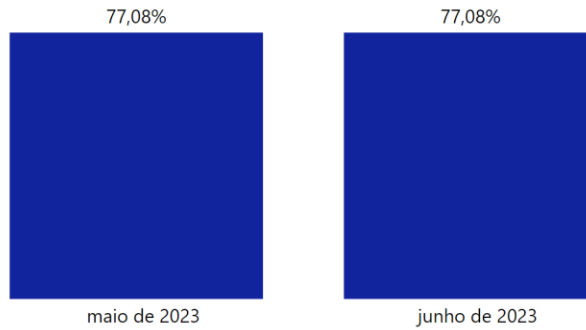


Gráfico 3: I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - Frequência Mensal

### I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 4: I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - Frequência Mensal

# **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
- dezembro de 2023 ● Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
- dezembro de 2023 ● Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Em junho, os alunos de EM Paracatu de Baixo conheceram, através do programa Vimver, a escola do novo distrito de Paracatu,. As visitas aconteceram nos dias 21, 22 e 23 de junho.

No dia 17 de junho, foram realizadas as Festas Juninas das escolas de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, finalizando o calendário de eventos previsto no primeiro semestre. A festa de Paracatu aconteceu na escola temporária na sede de Mariana e a de Bento Rodrigues na nova escola, marcando o retorno da festividade ao distrito e a participação de toda a comunidade. Ao todo mais de 500 pessoas estiveram presentes aos eventos.

## Indicadores

### I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

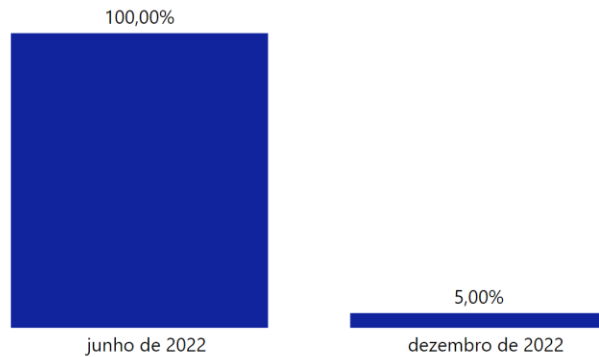


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

### I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

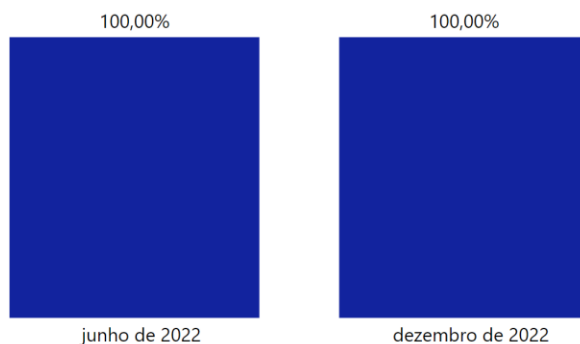


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

## Indicadores

### I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

### I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

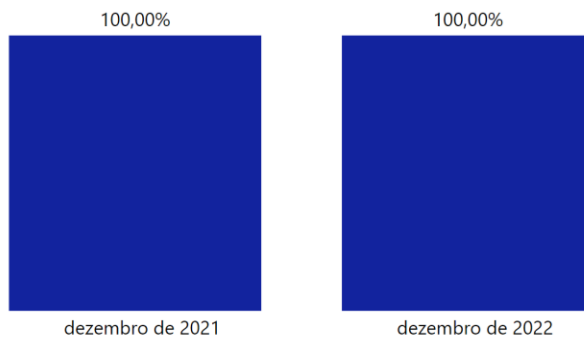


Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

## Indicadores

### I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

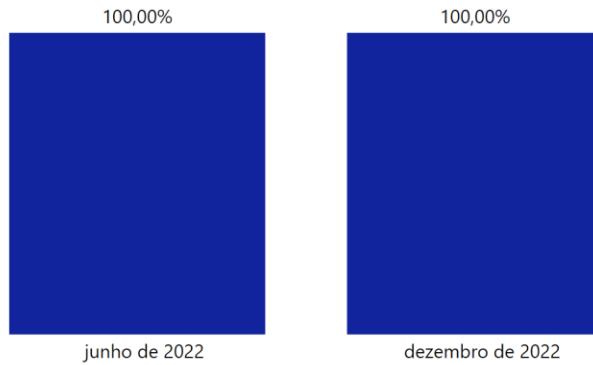


Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

### I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75  
Pontos

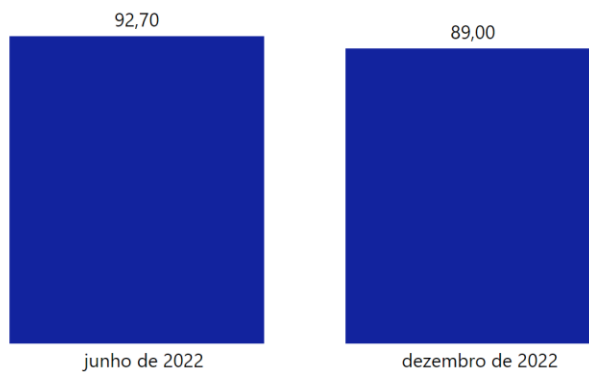


Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador I07 nunca medido por ser redundante com o I05, retirado da definição do PG conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

### I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

## Indicadores

### I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)

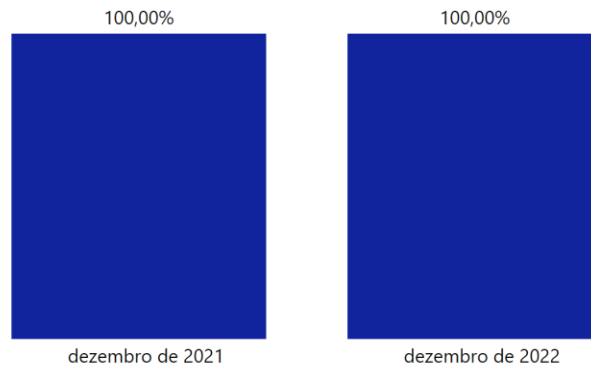


Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Realização do “Encontros de Patrimônio | Ativando Conexões: Patrimônio Cultural e Territórios Educativos” em Mariana (MG).

## **Indicadores**

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

## **PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Em andamento
Deliberação	652	3	Em andamento
Deliberação	652	4	Em andamento
Deliberação	652	5	Em andamento
Deliberação	653	1	Em andamento

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Em andamento



## Entregas do ano de 2023

- junho de 2023 ● Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- novembro de 2023 ● Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- dezembro de 2023 ● Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- dezembro de 2023 ● Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- dezembro de 2023 ● Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Lançamento da 3ª edição do Edital Doce, que visa promover a qualidade de vida e promoção do destino turístico, dividido em 2 modalidades:

Modalidade 1: apoio à projetos sociais de turismo, cultura, esporte e lazer.

Modalidade 2: reparação do lazer (somente para Marilândia, Conselheiro Pena, Fernandes Tourinho, Rio Casca e Tumiritinga).

## Indicadores

### I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

### I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

## Indicadores

### I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

### I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

## Indicadores

### I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

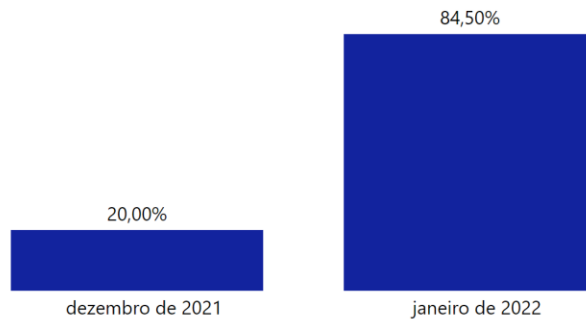


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

### I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%  
Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

# PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

## Eixo pessoas e Comunidades

### Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.\*

\* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento



Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Judicializada

## Entregas do ano de 2023\*

janeiro de 2023 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH

\*Postergação dos repasses de abril, julho e outubro de 2023 para o ano de 2024 devido a ausência de prestação de contas pelo município de Mariana. A prestação de contas está prevista no acordo judicial.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa \***

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG.

\* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

## Fatos relevantes do mês

### Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

## Indicadores

O escopo do programa encontra-se judicializado.

## **PG015 Promoção da Inovação**

### **Eixo pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- outubro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Realização do Demoday do Projeto Rio Doce Labs (Hub de Inovação) em Governador Valadares, Linhares e Ipatinga, evento que marcou a finalização da pré-aceleração de negócios e a seleção dos participantes para fase de aceleração.

Povoamento dos tanques e inauguração da Unidade Demonstrativa de Piscicultura no Assentamento Cachoeirinha, em Tumiritinga/MG.

Início do Projeto Rio Doce Labs (Hub de Inovação) em Mariana.

## Indicadores

### I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40  
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

### I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220  
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 30%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

# **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

## **Eixo pessoas e Comunidades**


### **Objetivo**

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

#### ▪ Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

- **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
- **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

#### ▪ Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- **16,97 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- **9** informes trimestrais, **3** semestrais e **2** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

### Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

#### ▪ Projeto Cultivando para Pescar:

- **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
- **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
- **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
- **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.



## Grandes números do programa

### ▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- o **4** associações beneficiadas:
  - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
  - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
  - 38** APIGUA (Guaxe)
  - 52** APAP (Povoação);
- o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- o **4** Planos de negócio entregues.

### ▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

## Grandes números do programa

### ▪ Projetos da Foz

o **96** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

### ▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **(E...** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

o **(E...** Total número de pescadores profissionais qualificados acumulado.

o Capacitação de **511** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

Localidade	Número de turmas capacitadas	Total de participantes capacitados
Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES	4	60
Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG	2	32
Comunidade do Guaxe – Linhares – ES	2	20
Comunidade Regência – Linhares – ES	2	24
Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG	4	34
Município de Aimorés – MG	12	138
Município de Conselheiro Pena – MG	2	30
Município de Governador Valadares – MG	2	29
Município de Itueta – MG	2	76
Município de Povoação – ES		15
Município de Resplendor – MG	2	24
Município de Tumiritinga – MG	2	28
Total número de pescadores profissionais		60

## **Fatos relevantes do mês**

Conclusão da construção da Microestação Fase II.

Nono informe Trimestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES

## Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

## **PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

### **Eixo Terra e Água**




#### **Objetivo**


Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Conclusão das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lotes 3 - Tumiritinga (1º Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e Águas da Prata II), Periquito (Liberdade)
- junho de 2023  Término dos contratos de aluguel de pastagem
- dezembro de 2023  Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 0 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 163 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 24.817,9 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 139,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.887,3 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.



## **Médio Rio Doce**

- 8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 77.255,2 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.901,7 toneladas no mês;

## Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 8.693,5 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 212,3 toneladas no mês;

## Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

## Fatos relevantes do mês

Finalização das operações de reparação (PTIP) em 18 propriedades à jusante.

## Indicadores

### I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)

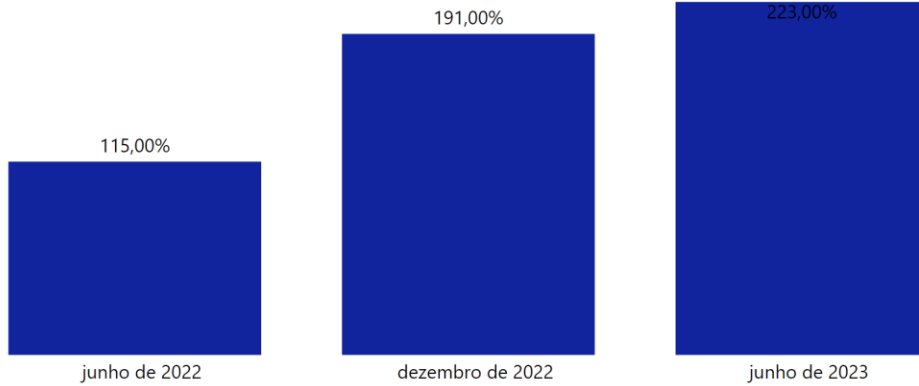


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

### I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)

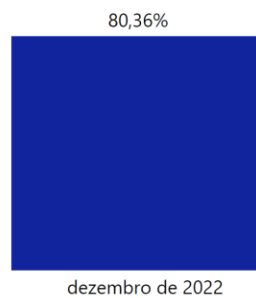


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

## Indicadores

### I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)




Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

### I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

## Indicadores

### I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022



## **PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica**

### **Eixo pessoas e Comunidades**









#### **Objetivo**




Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023  Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
- abril de 2023  Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
- maio de 2023  Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
- junho de 2023  Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
- julho de 2023  Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
- julho de 2023  Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
- setembro de 2023  Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG
- dezembro de 2023  Conclusão do Projeto da Cadeia do cacau ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 103,34 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80,71 milhões foram desembolsados para 1.995,00 contratos e 1.454,00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 22,63 milhões foram desembolsados para 583,00 contratos e 533,00 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225,00 contratos e 127,00 empresas.

## Fatos relevantes do mês

Projeto Microcréditos Banco Comunitário - Inauguração do Banco Comunitário Rio Doce, em Regência, Linhares/ES

## Indicadores

### I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

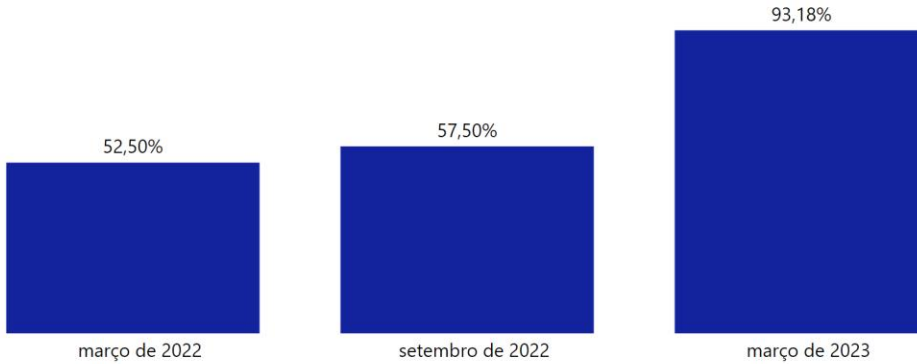


Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

### I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500  
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

### I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral




Gráfico 6: I06 - Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal



## Indicadores

### I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos

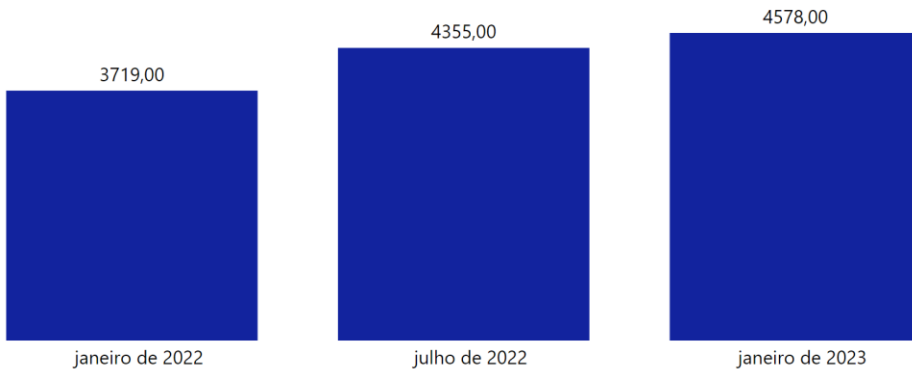


Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

## **PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**






#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- junho de 2023  Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce
- setembro de 2023  Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- setembro de 2023  Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- novembro de 2023  Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

1294 atendimentos realizados a 480 micro e pequenos negócios, por meio de 886 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 371 reposições de insumos e equipamentos e 20 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

## Fatos relevantes do mês

51 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a junho/23)

## Indicadores

### I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

### I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral



## **PG020 Estímulo à Contratação Local**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**


#### **Objetivo**

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- 
- agosto de 2023 ● Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
  - setembro de 2023 ● Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
  - novembro de 2023 ● Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
  - dezembro de 2023 ● Finalização do Eixo-Projeto Qualificação Profissional

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes Números

### Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 333 **turmas, abertas** 9.768 **vagas**, 8.838 **pessoas matriculadas**, 6.268 **concluintes**, 635 **reprovadas** e 1.687 **evadidos**.

### Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$ 3.817.017** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

### Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG e ES. Formaram em Governador Valadares 14 pessoas no curso de Iniciação em Confeitaria, em Degredo formaram 12 pessoas em Técnicas de Confeitaria, em Baixo Guandu 14 pessoas em Costura Industrial - Confecção de Lingerie, em Povoação 18 pessoas no curso Noções de Elétrica Básica, em Ipatinga 18 pessoas e Iniciação Profissional em Processos Siderúrgicos.

### Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 189 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 122 contratações locais e 67 contratações não locais. Dessas 189 contratações, 137 profissionais são de Minas Gerais, 05 do Espírito Santo e 47 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 303 currículos e prospectadas 119 vagas de emprego no mês. No acumulado, 11.049 currículos estão cadastrados e 9.512 vagas já foram captadas.

### Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Realização de 2 Encontros de Negócios do Projeto +Gestão sendo um em Ipatinga (MG) e o outro em Linhares (ES), nos dias 27 e 29 de junho, respectivamente, como forma de gerar novos negócios, contribuindo assim para o desenvolvimento das empresas locais.

Realização de 239 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Até o momento foram realizadas 254 consultorias no estado de Minas Gerais e 150 consultorias no estado do Espírito Santo.

Conclusão do Estudo de Prospecção de Potenciais Empreendedores Negócios e Mercados.

O projeto +Gestão tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação."

## Indicadores

### I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%  
Percentual(%)

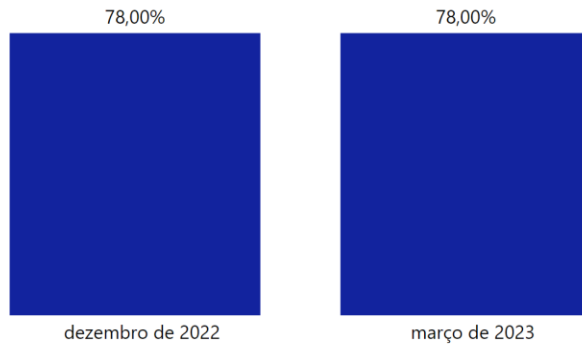


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

### I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%  
Percentual(%)

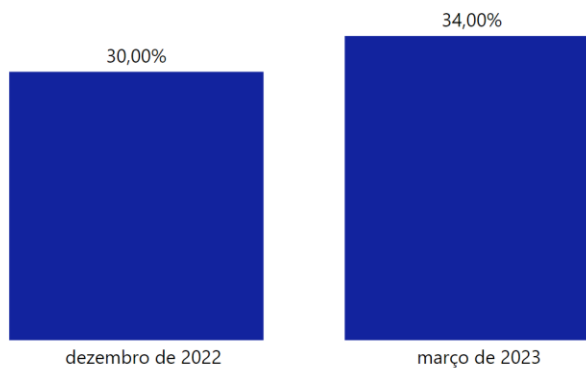


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

## Indicadores

### I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

### I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

## Indicadores

### I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000  
Quantidade

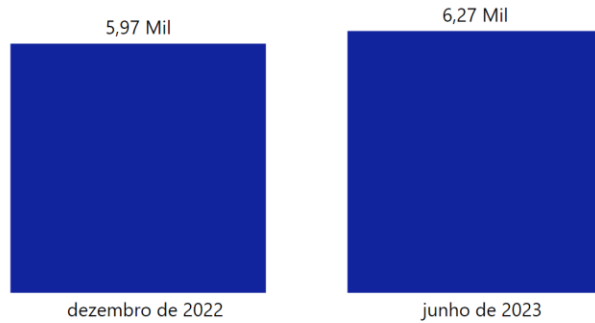


Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

### I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400  
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual



## Indicadores




Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal

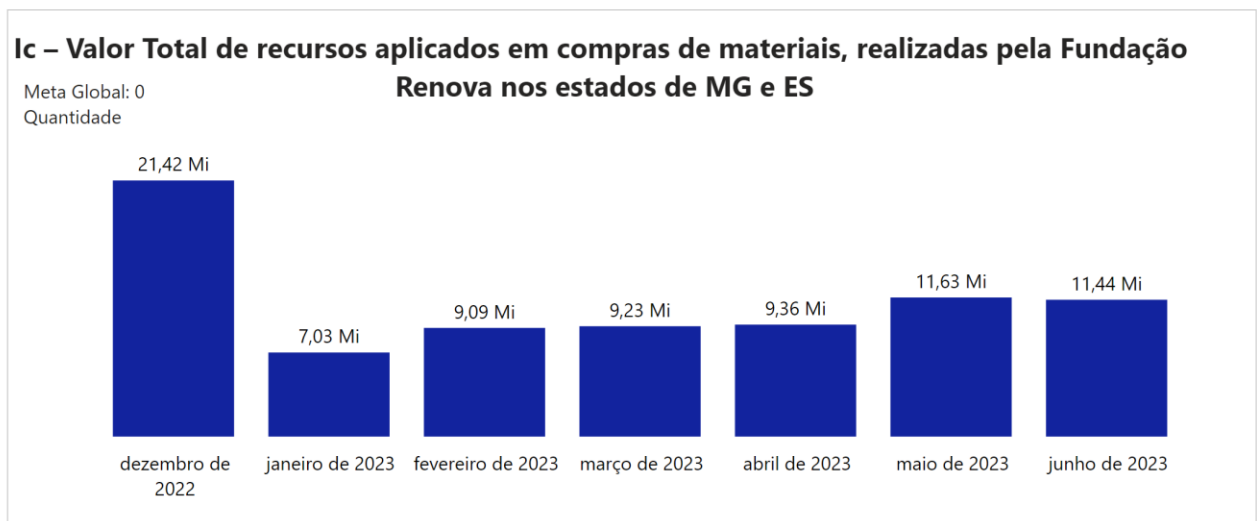


Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

## **Entregas do ano de 2023**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

## **Grandes números do programa**

- Atualmente há 14.246 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.823 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.481.356.305.

## Fatos relevantes do mês

Exclusão de 30 auxílios.

Inclusão de 02 auxílios.

## Indicadores

### I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%  
Percentual(%)

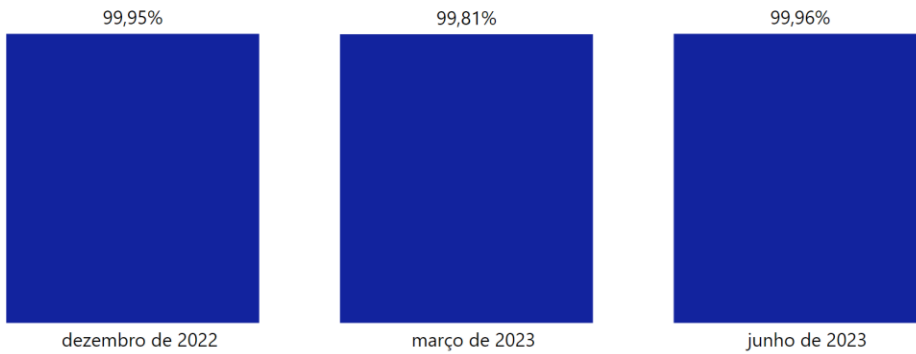


Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

### I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

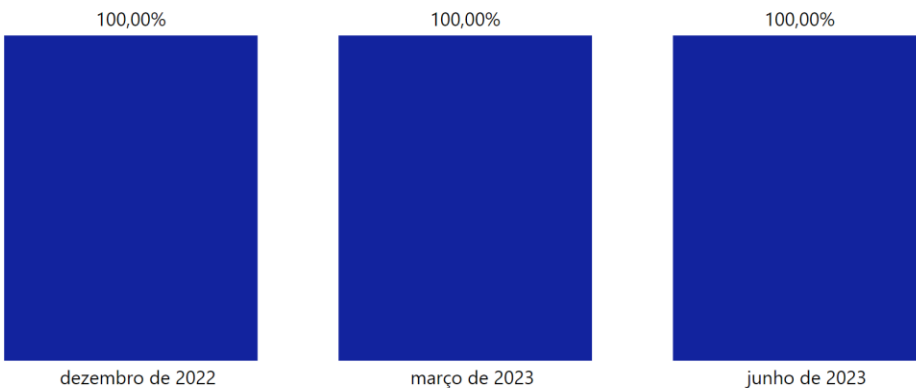


Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.



## Status de Cláusulas e Deliberações






Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Em andamento
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente



## Entregas do ano de 2023

- junho de 2023  Protocolo da revisão do relatório do 1º e 2º ano de resultados da região Deltaica na CT-GRSA
- junho de 2023  Protocolo do Relatório AS-IS Barra Longa na CT-GRSA
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021
- agosto de 2023  Protocolo da Atualização do Estudo da Mancha de Inundação - T13 a T16

Em atendimento a Deliberação CIF n.o 618 de 10/11/22, que determinou a revisão do Estudo da Mancha de Inundação no prazo de 5 meses

Em atendimento ao encaminhamento 62.1 da 62ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em 19/09/22 para a substituição do Plano de Manejo de Rejeitos da área urbana, solicitado na Nota Técnica CT-GRSA nº 14/2019

Em cumprimento a Deliberação CIF nº 632/2022 de 08/12/22 que solicitou a revisão do "Relatório Técnico Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Região Deltaica

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Realizado Protocolo, em 13/06/2023, do relatório de atualização das medidas de controle de erosão e manutenção da bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do PMR, em atendimento a Deliberação CIF nº 619/2022.

Realizado Protocolo, em 13/06/2023, da revisão do "Relatório Técnico Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Região Deltaica (WSP, 2023)." em cumprimento a Nota Técnica CT-GRSA nº 12/2022 e Deliberação CIF nº 632/2022.

Realizado Protocolo referente a contestação da reprovação do PMR 13 e 14, DB CIF 69, item 11.1, na CT-GRSA (Ofício FR.2023.1468) em 19/06/2023.

Realizado Protocolo no SEI do relatório AS IS da área urbana e periurbana de Barra Longa, em 26/06/2023, em atendimento ao encaminhamento 62.1 da CT-GRSA

Realizado o protocolo da proposta revisada do Plano de Monitoramento Integrado - Trechos 06 a 16 (WSP, 2023), na CT-GRSA ( Ofício FR.2023.1439) em 20/06/2023.

Realizada reunião gerencial do estudo da mancha de inundação para apresentação da calibração do modelo computacional para a CT-GRSA em 27/06/2023

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.



## **PG025 Recuperação Ambiental Área 1**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

## Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

## Indicadores

### I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

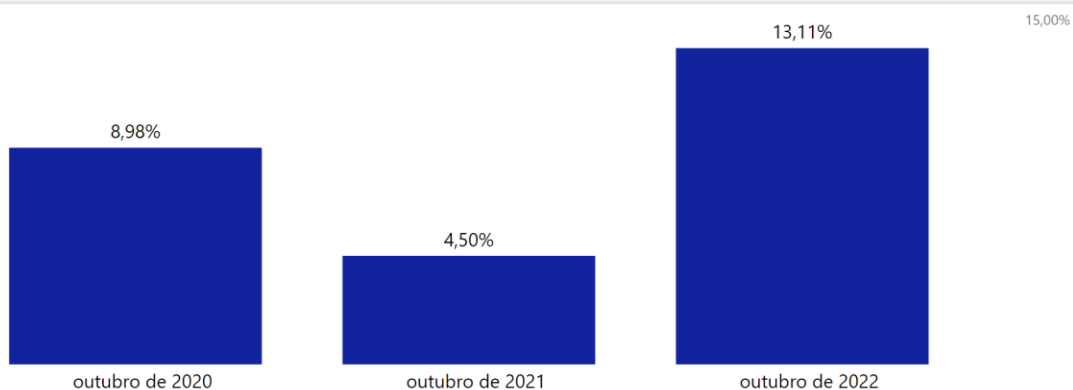


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	$I01 - (\text{Área total com cobertura vegetal herbácea-arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I02 – Índice de solo exposto	$I02 - (\text{Área total com Solo Exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I03 – Biomassa Total da Vegetação	$I03 - (0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDV12}) + (-0,008 * \text{banda } 3 * \text{NDV12})$	t/ha	março/2017
I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	$I04 - (\text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle}) * 100$	%	março/2017
I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$I05 - (\text{diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%	janeiro/2020
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	$I06 - \text{Número de indivíduos} / \text{área amostral}$	Nº indivíduos/ha	janeiro/2020
I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$I07 - (\text{Área total com espécie invasora} / \text{total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%	janeiro/2020

## **PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
maio de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
julho de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 48.933,20 **hectares** inscritos no edital;
- 37.882 hectares validados.
- 18.449,8 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.736.758 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 1.205 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

## **Fatos relevantes do mês**

Coleta de dados para monitoramento do Viveiro Mudas Martins em Gov. Valadares/MG, Viveiro RPPN Muriqui em Caratinga/MG e Viveiro Ouro Verde em Belo Oriente/MG.

Participação da Rede de Sementes e Mudas na ação de empreendedorismo e cidadania em Santa do Paraíso/MG.

Treinamento de Colheita e manejo das sementes nos Assentamentos Ulisses Oliveira e Maracanã em Jampruca/MG, Comunidade quilombola Santa Bárbara em Sabinópolis/MG e Assentamento Iraguiar em Santa Maria do Suaçuí/MG.

Participação no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano e do Caribe em restauração ecológica.

Ação de empreendedorismo e cidadania em Timóteo/MG.

Aplicação do Diagnóstico da Rede, junto aos coletores (as) de sementes das Comunidades da Barra do Santo Antônio I e II, Córrego Fonte, Quilombolas do Turvo, Santa Cruz, Santiago e Contenda, em Sabinópolis/MG.

Mobilização e Treinamento junto aos coletores (as) nas Comunidades do Torra, Córrego Fonte, em Sabinópolis/MG, nos Assentamentos Santa Maria Monalisa, Santa Martha e Belo Monte, em Jampruca/MG, e do grupo Córrego dos Prazeres, em Governador Valadares/MG.

Semeadura de espécies para teste de germinação Casa de Sementes no distrito de Baguari – Gov. Valadares/MG.

Visita técnica no viveiro do Instituto Terra – Aimorés/MG.

Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Bom Jardim – Sabinópolis/MG.

Visita da Coordenação de Suprimentos e Gerência de Planejamento estratégico, junto com a Coordenação de Restauração Florestal da Fundação Renova na Casa de Sementes, no distrito de Baguari – Gov. Valadares/MG.

Monitoramento do Viveiro Mata Atlântica - Rio Bananal/ES.

Participação da Rede de Sementes no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano da Restauração ecológica, em Bogotá - Colômbia.

Vim Ver com equipe da UNESCO, visita a área de plantio do David Colodetti.

Reunião CIF/MST para tratamento de ações da restauração florestal em assentamentos.

## Fatos relevantes do mês

Vim Ver com alunos e professores de Agronomia da UFES (Alegre-ES) em visita a área de plantio do Edson Pancieri.

Vim ver com equipe de Desenvolvimento Humano e Segurança.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

## **PG027 Recuperação de Nascentes**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente



## Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
- fevereiro de 2023 ● Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
- fevereiro de 2023 ● Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
- maio de 2023 ● Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
- junho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2023



agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 5.749 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.921 nascentes validadas;
- 1.838 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 537.708,71 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 782 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

## Fatos relevantes do mês

Visita técnica no viveiro do Instituto Terra – Aimorés/MG.

Visita da Coordenação de Suprimentos e Gerência de Planejamento estratégico, junto com a Coordenação de Restauração Florestal da Fundação Renova na Casa de Sementes, no distrito de Baguari – Gov. Valadares/MG.

Vim ver com equipe de Desenvolvimento Humano e Segurança.

Vim Ver com equipe da UNESCO, visita a área de plantio do David Colodetti.

Vim Ver com alunos e professores de Agronomia da UFES (Alegre-ES) em visita a área de plantio do Edson Pancieri.

Treinamento de Colheita e manejo das sementes nos Assentamentos Ulisses Oliveira e Maracanã em Jampruca/MG, Comunidade quilombola Santa Bárbara em Sabinópolis/MG e Assentamento Iraguiar em Santa Maria do Suaçuí/MG.

Semeadura de espécies para teste de germinação Casa de Sementes no distrito de Baguari – Gov. Valadares/MG.

Reunião CIF/MST para tratamento de ações da restauração florestal em assentamentos.

Retirada de Sementes na Comunidade Quilombola Bom Jardim – Sabinópolis/MG.

Participação no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano e do Caribe em restauração ecológica.

Participação da Rede de Sementes e Mudanças na ação de empreendedorismo e cidadania em Santa do Paraíso/MG.

Monitoramento do Viveiro Mata Atlântica - Rio Bananal/ES.

Mobilização e Treinamento junto aos coletores (as) nas Comunidades do Torra, Córrego Fonte, em Sabinópolis/MG, nos Assentamentos Santa Maria Monalisa, Santa Martha e Belo Monte, em Jampruca/MG, e do grupo Córrego dos Prazeres, em Governador Valadares/MG.

Coleta de dados para monitoramento do Viveiro Mudanças Martins em Gov. Valadares/MG, Viveiro RPPN Muriqui em Caratinga/MG e Viveiro Ouro Verde em Belo Oriente/MG.

Aplicação do Diagnóstico da Rede, junto aos coletores (as) de sementes das Comunidades da Barra do Santo Antônio I e II, Córrego Fonte, Quilombolas do Turvo, Santa Cruz, Santiago e Contenda, em Sabinópolis/MG.

Ação de empreendedorismo e cidadania em Timóteo/MG.

## Fatos relevantes do mês

Participação da Rede de Sementes no V Congresso Colombiano e VI Congresso Iberoamericano da Restauração ecológica, em Bogotá - Colômbia.

## Indicadores

### I00 – Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000  
Unidade: ha



Gráfico 1: I00 – Nascentes recuperadas - Frequência Anual

-O Programa levará para a Câmara Técnica a revisão da Ficha do Indicador de Definição I00 – Nascentes Recuperadas.

### I01 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40  
Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Riqueza de espécies - Frequência Anual

## Indicadores

### I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000  
Unidade: N° indivíduos/ha




Gráfico 3: I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Frequência Anual

### I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)

Meta Global: > 2000  
Unidade: N° indivíduos/ha



Gráfico 4: I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80  
Percentual(%)

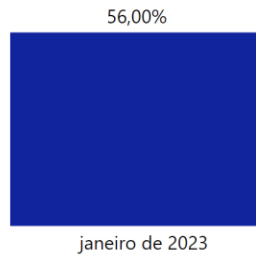


Gráfico 3: I03 - Cobertura do dossel - Frequência Anual



## **PG028 Conservação da Biodiversidade**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Em andamento
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- junho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

De 19 a 24 de junho de 2023 foi realizado o Seminário do projeto Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce. A abordagem envolveu eventos satélites em escolas dos municípios onde ocorreram o projeto Ciência Cidadã e culminou no evento principal em Governador Valadares, na Univale, de 22 a 24 de junho.

Em 14 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1396 e anexos em resposta ao ofício SEI Nº28/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio, referente apresentação do cronograma online do PMBA.

Em 29 de junho de 2023 foi emitida a Deliberação CIF nº 693, que aprova o cumprimento da cláusula 165, inciso I, do TTAC.

Em 30 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1578 e seus respectivos anexos referentes à Apresentação do 4º Relatório Anual do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, cláusula 165 do TTAC.

Em 30 de junho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1579 e seus respectivos anexos referentes à Apresentação do Relatório de Monitoria do Ano 1 do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do rio Doce (PABA) – Cláusula 164 c.

Em 30 de junho de 2023 foi publicada a Chamada de Projetos 11/2023 para financiamento projetos de pesquisa da Ação 23 do PABA (Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática) – Criar edital de pesquisa direcionado ao monitoramento da estrutura e dinâmica das populações da biota aquática alvo do PA.

## Indicadores

### I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

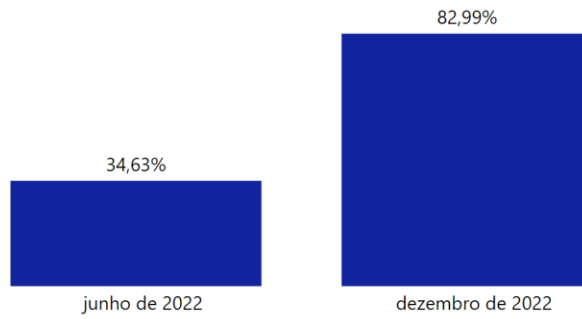


Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

## **PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**


- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.






## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

junho de 2023  Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Em 30/06/2023 foi concluído o Projeto Executivo detalhado do CETRAS-ES.

## Indicadores

### I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

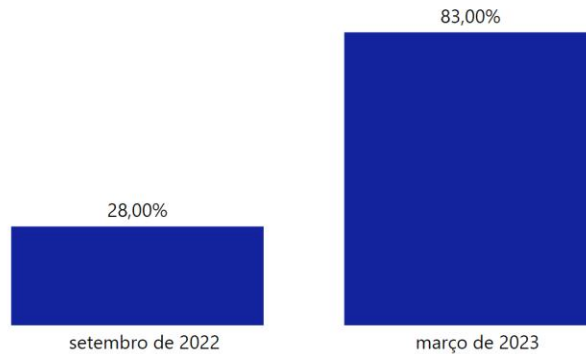


Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 83%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

### I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES - Frequência Semestral

## **PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
julho de 2023	●	Protocolo do relatório semestral 2 do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS
agosto de 2023	●	Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
novembro de 2023	●	Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

## Fatos relevantes do mês

06 de junho - Realização da 3ª oficina de monitoria do PABT (Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre).

22 a 24 de junho - Realização do Seminário de Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce e dos eventos satélites em escolas dos municípios onde ocorreram o projeto Ciência Cidadã, como parte da execução da Ação #7 do PABT.

30 de junho - CTBio emite ofício atestando a aprovação pelo GAT (Grupo de Assessoramento Técnico), dos relatórios de monitoria referentes ao primeiro e segundo ano de execução do PABT.

## Indicadores

### I01 – Execução do Plano de Ação

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

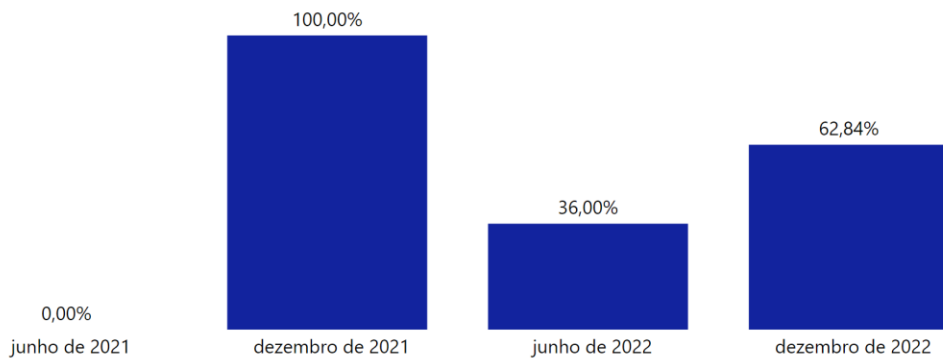


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Em andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
julho de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03
dezembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02

### Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

**BALESCT01** - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **NAQESPM01** - Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico; **MREESCT01** - Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande; **AIMESPJ03**- Pleito de Aimorés AIMESPJ03-Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede; **DIOESOB03** - Pleito de Dionísio DIOESOB03-Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- No mês junho 2023 foram repassados R\$ 3.764.417 para ações dos municípios\*;
- No mês junho 2023 foram ofertadas 0 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês junho 2023 a equipe técnica realizou 62 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	3.764.416,59	*Repasses para ações dos municípios de Ipaba, Ipatinga, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe, Condoeste.

## Fatos relevantes do mês

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$146.863,57 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$730.079,09 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina;

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$1.122.635,78, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$1.187.076,71 referente a obra de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$72.370,57, referente a elaboração/adequação de projetos de engenharia para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário totalizando 10 localidades na área rural e 02 na área urbana;

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$390.449,85, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$114.941,02, referente a obra de implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu.



## Indicadores de Resultados

### I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

### I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

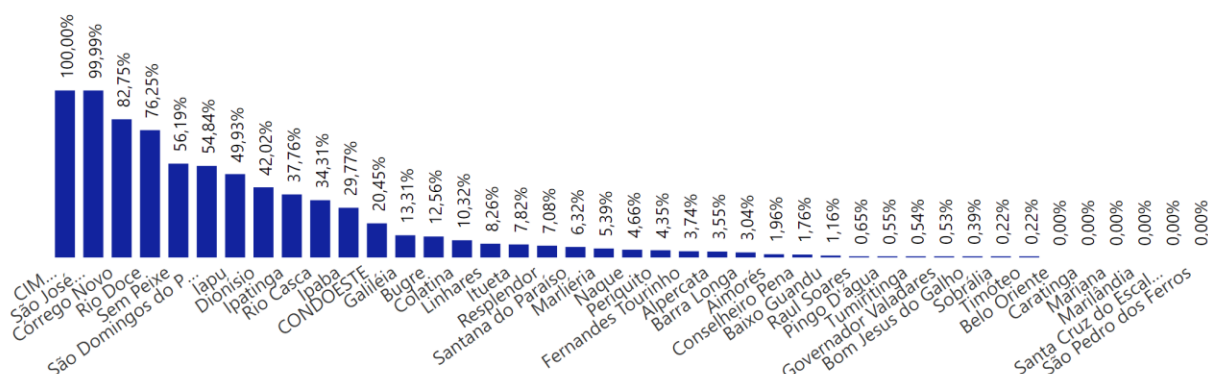


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi o fechado em dezembro de 2022. Esse valor será a base para as informações referentes ao I02 no ano de 2023.

## Indicadores de Resultados

### I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

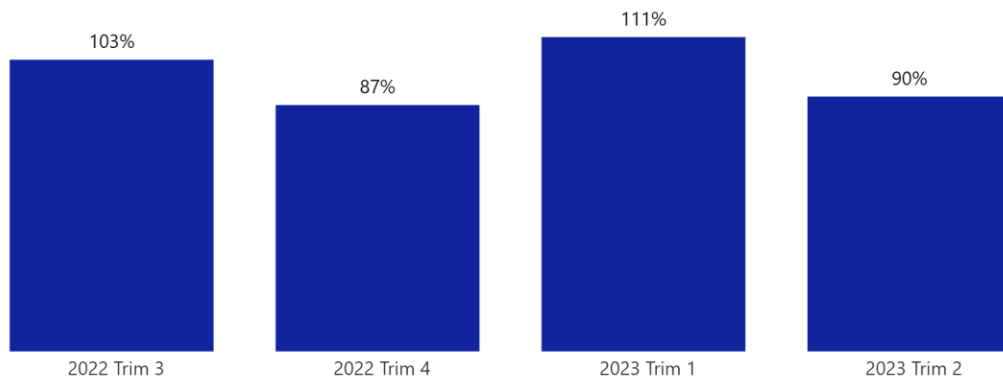


Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

### I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%  
Percentual(%)

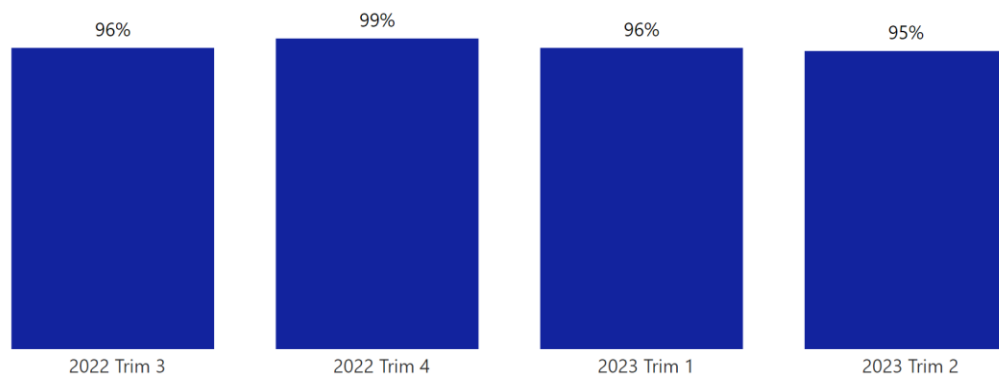


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

## Indicadores de Resultados




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

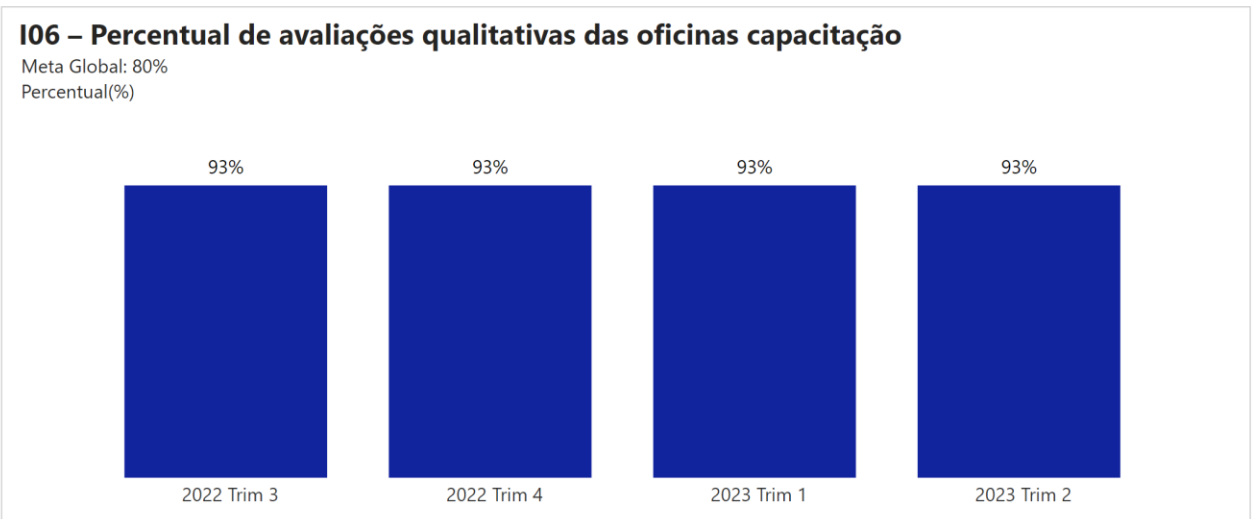


Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)

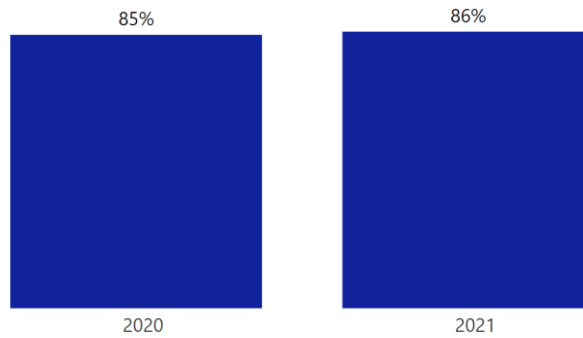


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

### I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)

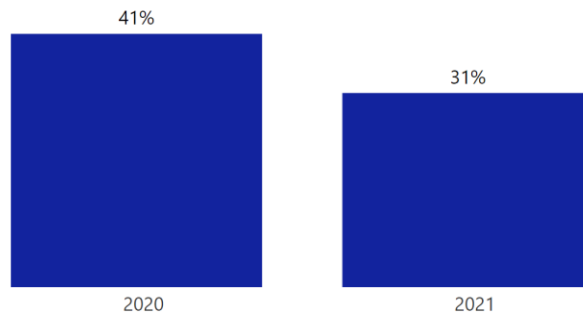


Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

### I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)

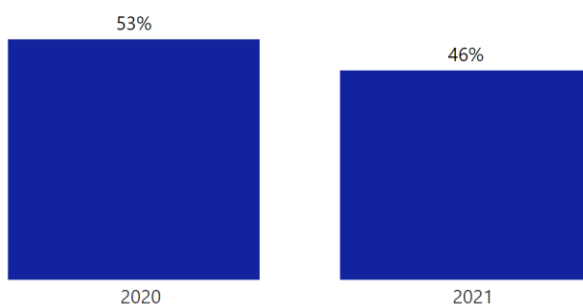


Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

- Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
- I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

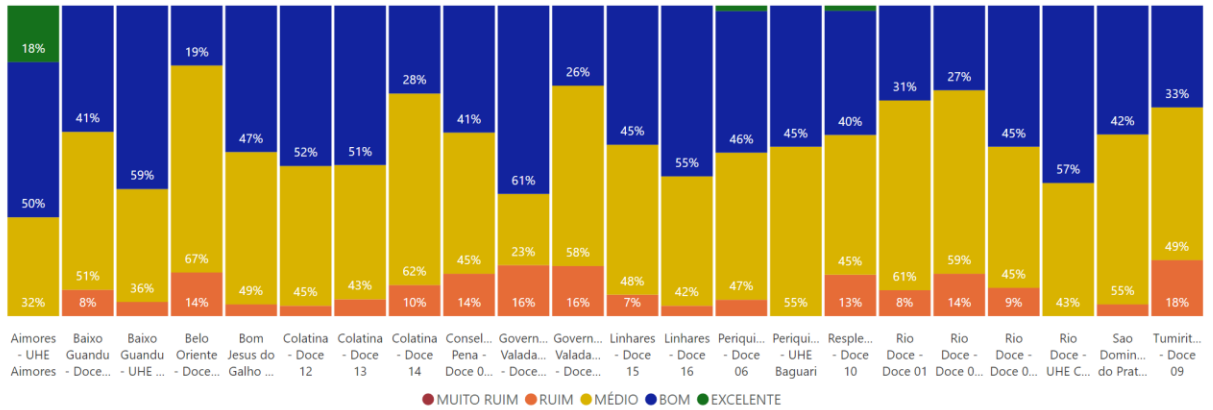


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

Os valores desse indicador são os que constam na planilha de evidência.  
Favor desconsiderar o valor digitado no campo de "Valor da Medição".

### I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

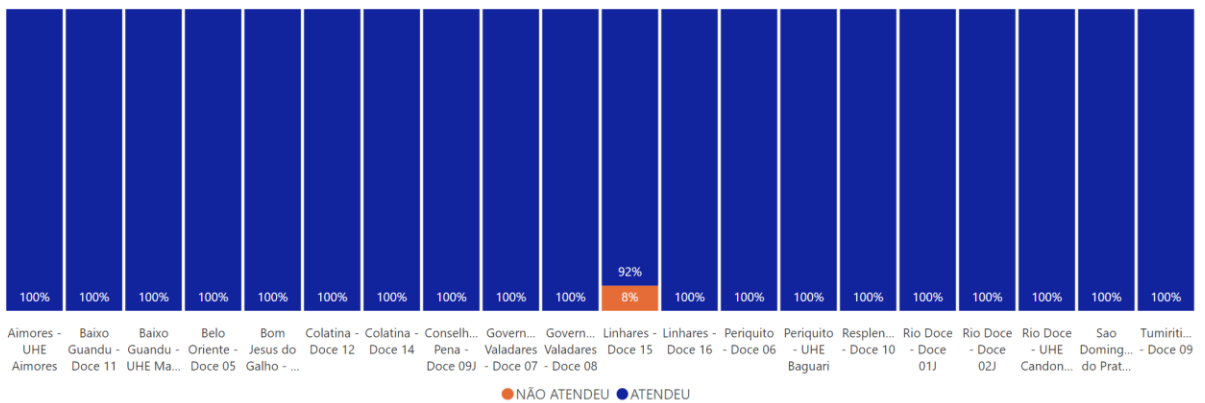


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

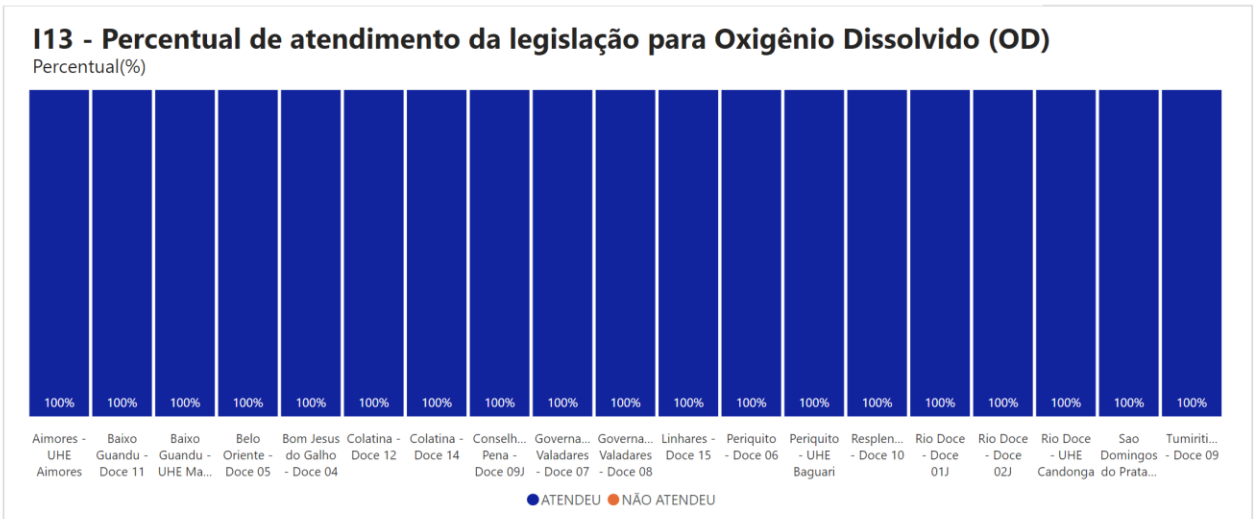


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.




## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

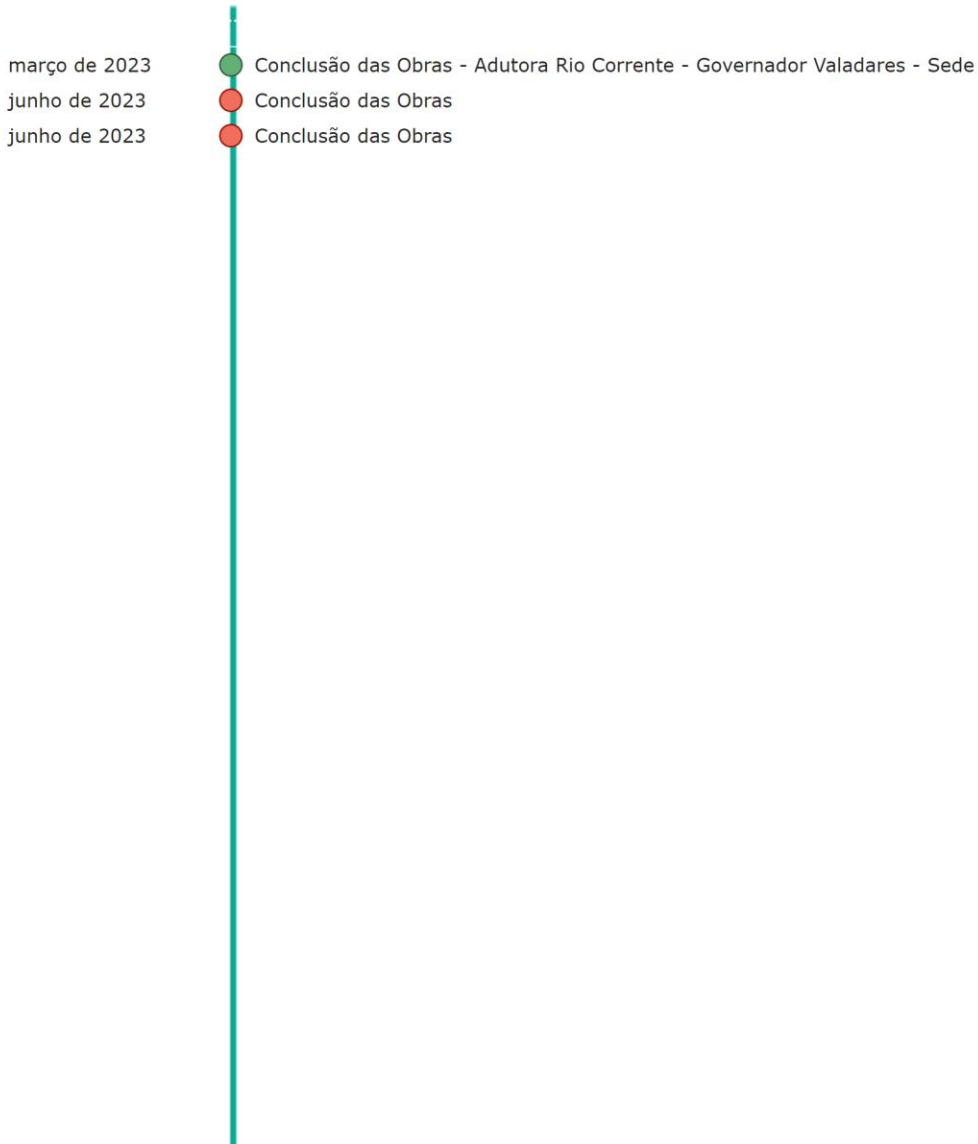

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 18 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas ( entre concluídas e reformadas);

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa terá um prazo de duração de 05 (cinco) meses a contar dessa data de formalização.

## Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

No dia 30 de junho de 2023, a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal de Belo Oriente celebraram entre si a assinatura do Termo de Compromisso. Com isso fica formalizado o consenso para a solução técnica a ser implantada na localidade para cumprimento da cláusula 171.

No dia 06 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visita técnica às obras da localidade Sede do município de Baixo Guandu/ES; da localidade Sede do município de Resplendor/MG; e da localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, referentes à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. As visitas técnicas iniciarão pelas localidades:

- Sede de Baixo Guandu/ES: Às 08:30h, na captação superficial no rio Guandu, localizada na coordenada geográfica 19°30'48.5"S 41°00'36.1"W;
- São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG: Às 11:00 hs, na estação de tratamento de água de São Tomé do Rio Doce, localizada na coordenada geográfica 19°00'41.4"S 41°32'49.1"W.

No dia 05 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visitas técnicas à localidade Pedra Corrida, município de Periquito/MG; às obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG; da localidade Sede do município de Colatina/ES; da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES; e da localidade Sede do município de Linhares/ES, referentes à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. As visitas técnicas iniciarão pelas localidades:

- Pedra Corrida (Periquito/MG): Às 11:00 hs, na captação subterrânea localizada na coordenada geográfica 19°05'25.22"S 42°09'17.72"W;
- Sede de Linhares/ES: Às 13:00 hs, na ETA de Linhares, localizada na Avenida Barra de São Francisco, 1.137, Colina, Linhares/ES.

No dia 02 de junho de 2023, a Fundação Renova apresentará para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

No dia 01 de junho de 2023, a equipe de perícia realizará visita técnica às obras da localidade Gesteira, município de Barra Longa/MG, referente à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento. A visita técnica iniciará às 10:30 hs na Quadra de Gesteira Mutirão, coordenadas geográficas 20°15'26.7"S, 43°07'26.9"W.

## Indicadores

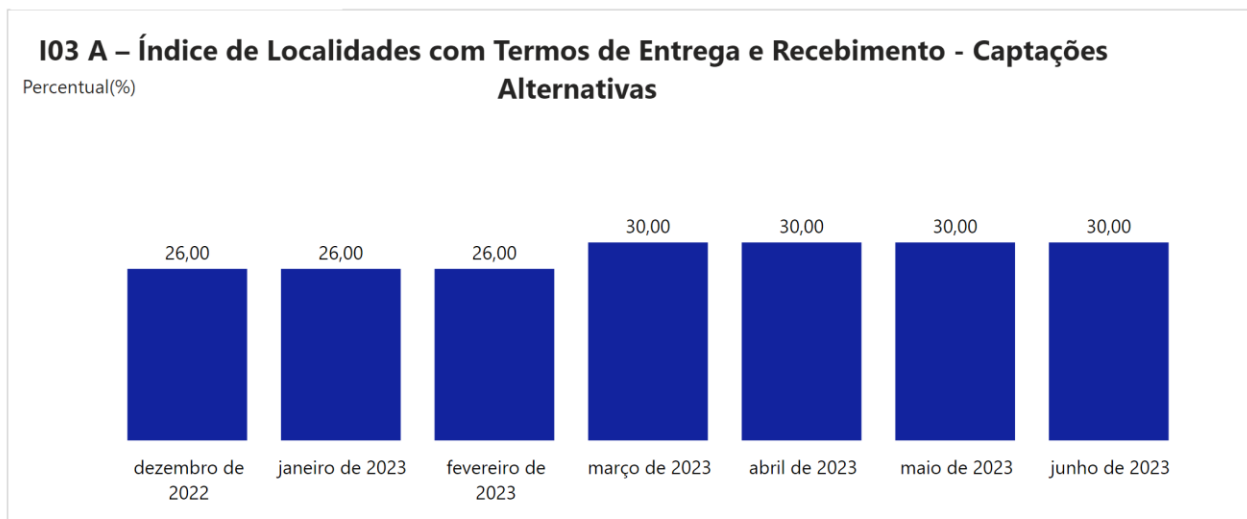


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

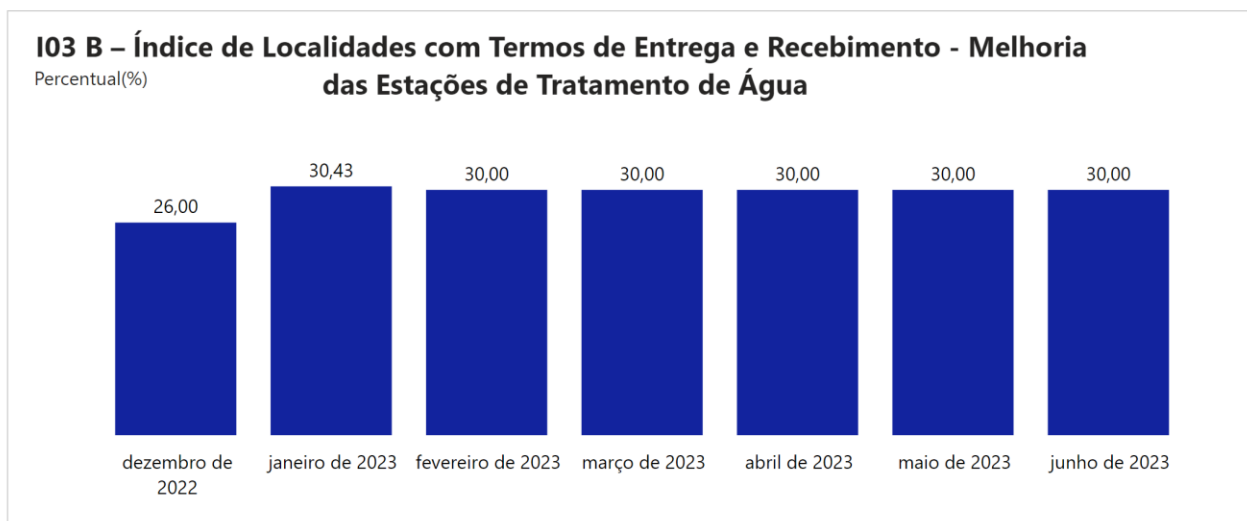


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

## Indicadores

### I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

### I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

## **PG033 Programa de Educação Ambiental**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento

## Entregas do ano de 2023



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

O curso técnico em agroecologia, o primeiro com essa temática a ser ofertado no Espírito Santo, foi executado pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES – em parceria com o Centro de Formação Maria Olinda – CEFORMA – formou, no dia 30/06/2023, 26 técnicos. Trata-se de uma ação de muita relevância para a comunidade já que habilita tecnicamente assentados da reforma agrária a atuarem de forma sustentável em seus territórios, além de contribuírem para a difusão da agroecologia em propriedades familiares do estado

## Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

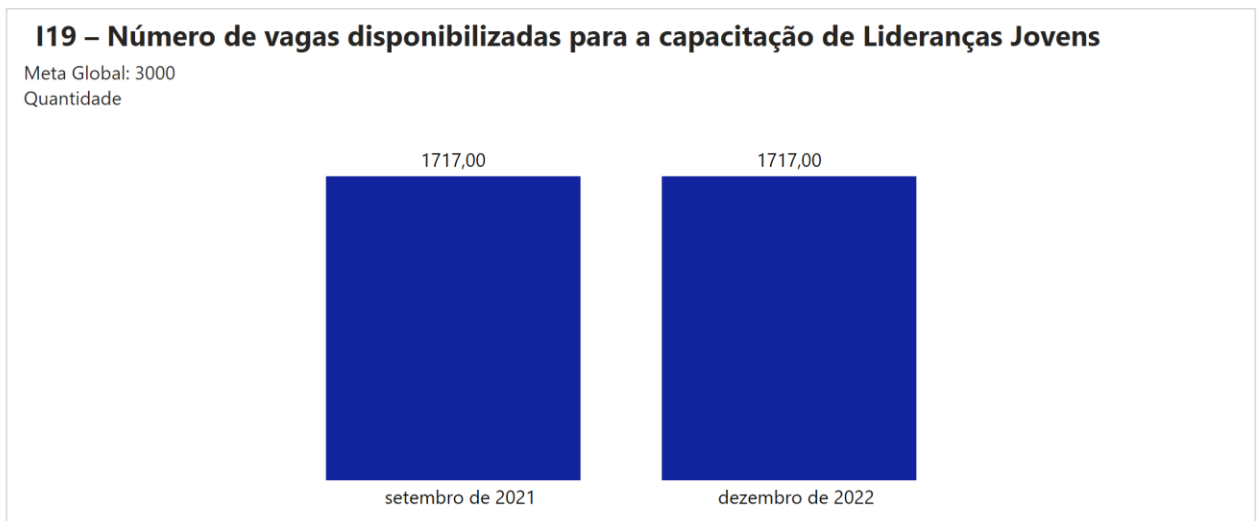


Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

## **PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

## Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Cíveis para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

## Indicadores

### I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

### I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

## Indicadores

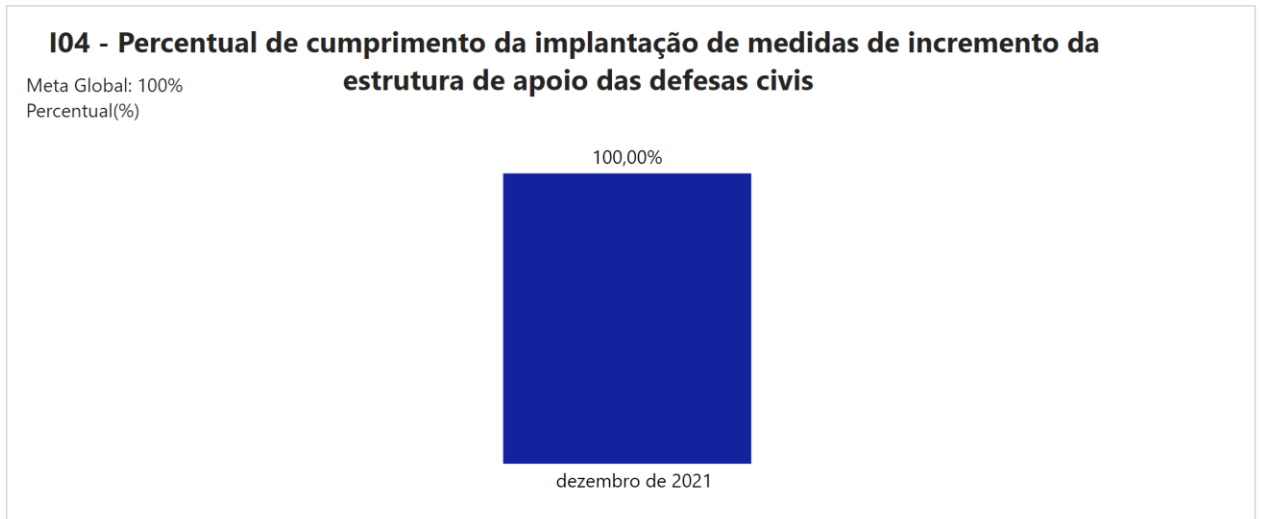


Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	$I01 = \frac{\text{Total de indivíduos formados}}{\text{Total de indivíduos inscritos}}$	%	abril/2025

## **PG035 Informação para a População**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Publicação dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023	●	Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
novembro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## Grandes números do programa

Dado	mai/2023	jun/2023	Acumulado 2023	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	24993	18653	112365	146637
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	4	19

## Fatos relevantes do mês

No dia 07 de junho de 2023, foram feitos os uploads do Ebook do Conhecimento em Pauta e também da versão digital do livro do Trilhas de Memórias. Os arquivos são resultados do 2º ciclo de ações de Descentralização e Itinerância realizadas no primeiro semestre de 2023.

No dia 28/06/2023, a equipe do PG35 esteve em Santa Rita Durão para alinhamento do Projeto Sineiros com a escola e comunidade. O projeto é uma ação do CIT Mariana e tem como objetivo contribuir para manutenção da tradição do ofício de sineiro, principalmente entre os jovens da comunidade de Santa Rita Durão, através de oficinas lúdicas, promovendo a valorização e perpetuação da prática deste bem imaterial do Estado de Minas Gerais. A ação está sendo desenhada pelas equipes do PG35 e Diálogo da Fundação Renova, a equipe da escola municipal, o Sr. Tutim e o pároco local.

O PG35 esteve presente na Inauguração do Banco Foz do Rio Doce em Regência, dia 28/06/2023 às 18h00min, na comunidade de Regência. O evento contou com a participação de moradores da comunidade de Regência, Areal, Povoação, representante Assistência Social de Linhares, Cras de Regência, Banda de Congo São Benedito, lideranças locais, Representante do banco comunitário Bem de Vitória, representantes do legislativo municipal e estadual, e representantes da Fundação Renova. Na ocasião, representante do programa conversou com alguns moradores da comunidade de Regência, Areal, Povoação entre outras, com objetivo de apresentar o CIT, e divulgar ponto de acesso do Centro Ecológico.

## Indicadores

### 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto

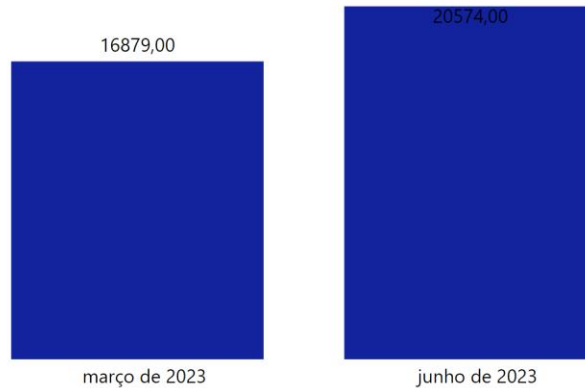


Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

A medição do Indicador I01 Do Programa de Informação à População (PG35) teve início em janeiro de 2023 e não em julho/2022. O Programa emitirá uma errata do documento de Definição reportando a data correta do início das medições se e a enviará para o sistema CIF.

### 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

O Programa não recebeu resposta dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador. Sendo assim, não foi possível fazer o reporte dos valores, desde janeiro de 2023, data do início das medições, até o presente momento.

## Indicadores

### 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

O Programa não recebeu resposta dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador. Sendo assim, não foi possível fazer o reporte dos valores, desde janeiro de 2023, data do início das medições, até o presente momento.

As medições dos Indicadores "I04 - Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no CIT" e "I05 - Avaliação de satisfação com as unidades do CIT" não foram iniciadas porque os CITs ainda não foram implantados e não há como fazer a medição desses indicadores.

### 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %



Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

## Indicadores

### 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

## **PG036 Comunicação Nacional e Internacional**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**




#### **Objetivo**


- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado



## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

<b>Indicador</b>	<b>mai/2023</b>	<b>jun/2023</b>	<b>Acumulado 2023</b>	<b>Acumulado (2016 - 2023)</b>
Acesso ao Site (mês)	189.499	164.081	870.063	10.889.131
Documentos no site (mês)	3	4	66	632
Notícias Publicadas (mês)	4	10	47	1.082
Vídeos (mês)	14	7	83	825

## Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores

### I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Meta Global: 15.000

Unidade



Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

### I02 – Visualizações de páginas de serviço

Meta Global: 20.000

Unidade

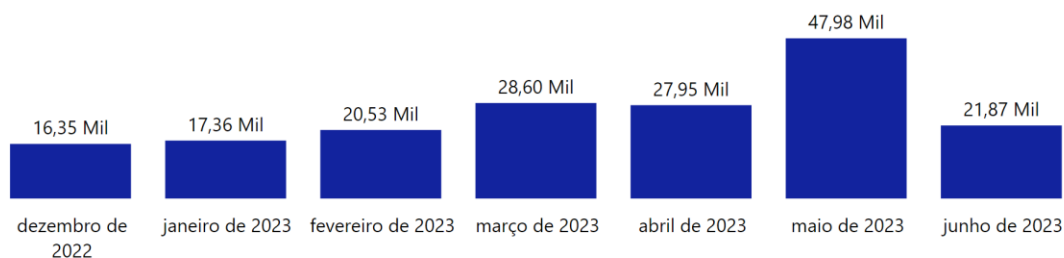


Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – Tempo de resposta

Meta Global: 24  
Hora

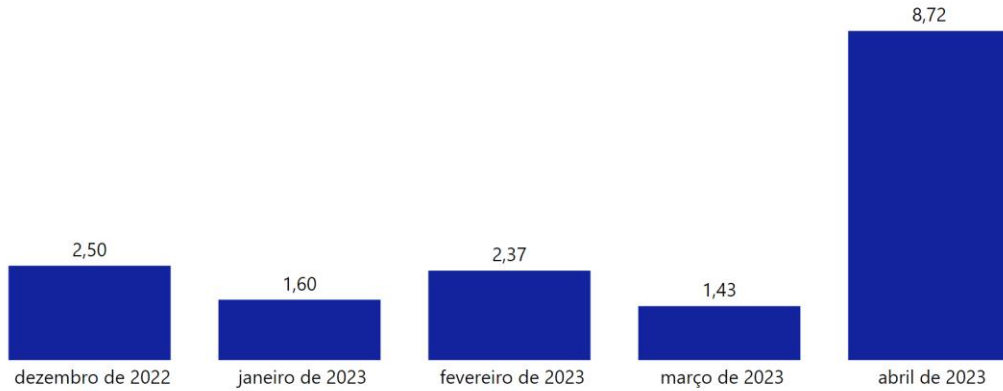


Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

### I04 – Alcance total no LinkedIn

Meta Global: 30.000  
Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

## **PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento



## Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
novembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
dezembro de 2023	●	Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de R\$ 31.517.144 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

## Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,8 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em [www.monitoramentorioce.org](http://www.monitoramentorioce.org);
- 696 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 estações automáticas formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados na água e 38 nos sedimentos

## Grandes números do programa

### Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 82 pontos, sendo 31 com tratamento e 51 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

## Fatos relevantes do mês

Protocolo do Ofício FR.2023.1562 referente ao QA/QC trimestral.

Protocolo do Ofício FR.2023.1349 referente a proposta da Fundação Renova para a revisão do PMQACH.

## Indicadores

### I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%  
Percentual(%)

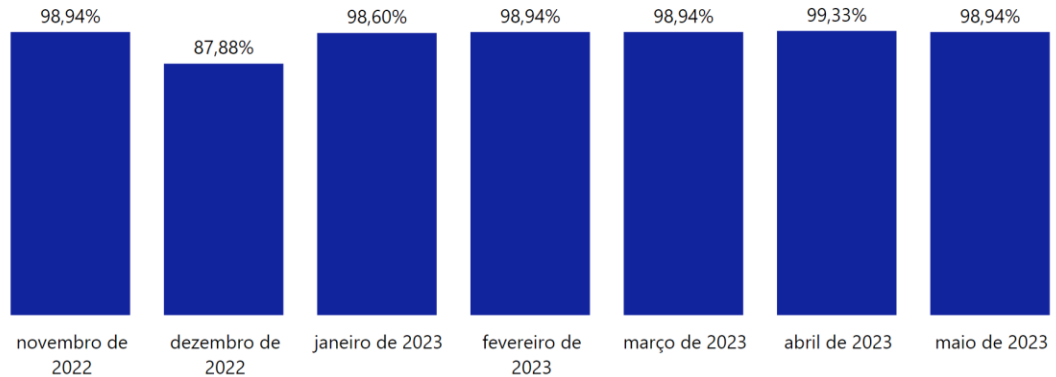


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Não foi possível realizar a coleta em alguns pontos, em dezembro/22, devido às fortes chuvas ocorridas nas regiões de atuação do PMQSQS, e a correnteza estava muito forte. Considerou-se a situação insegura para realização das atividades.

### I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%  
Percentual(%)

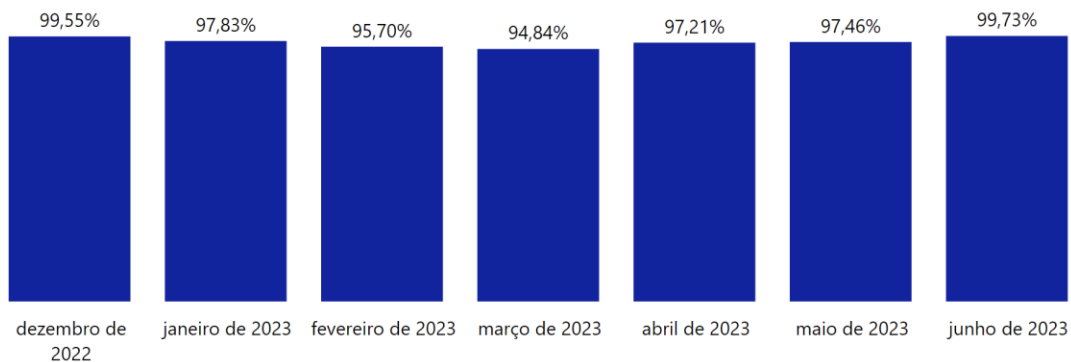


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%

Percentual(%)

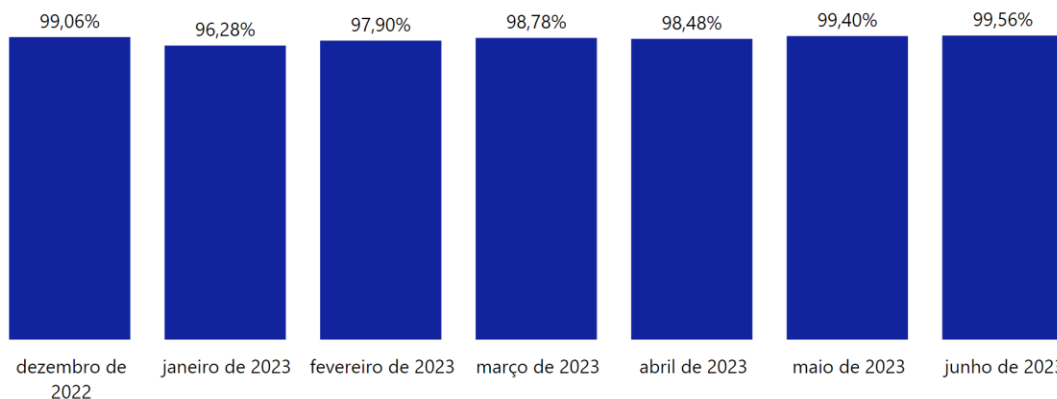


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

### I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%

Percentual(%)

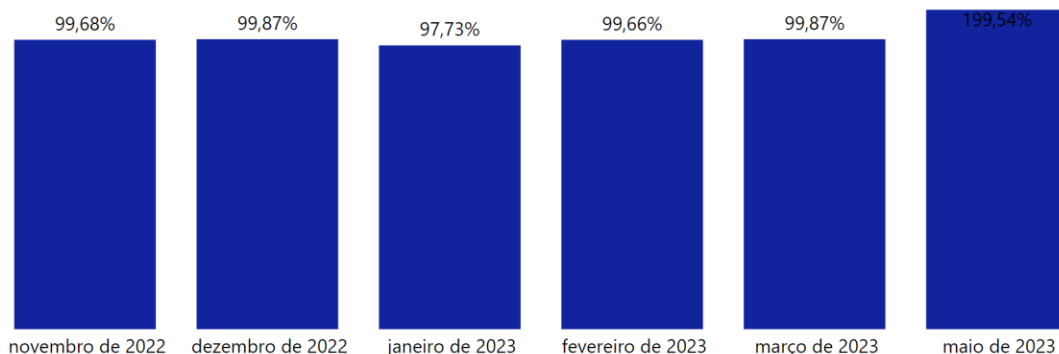


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

## Indicadores

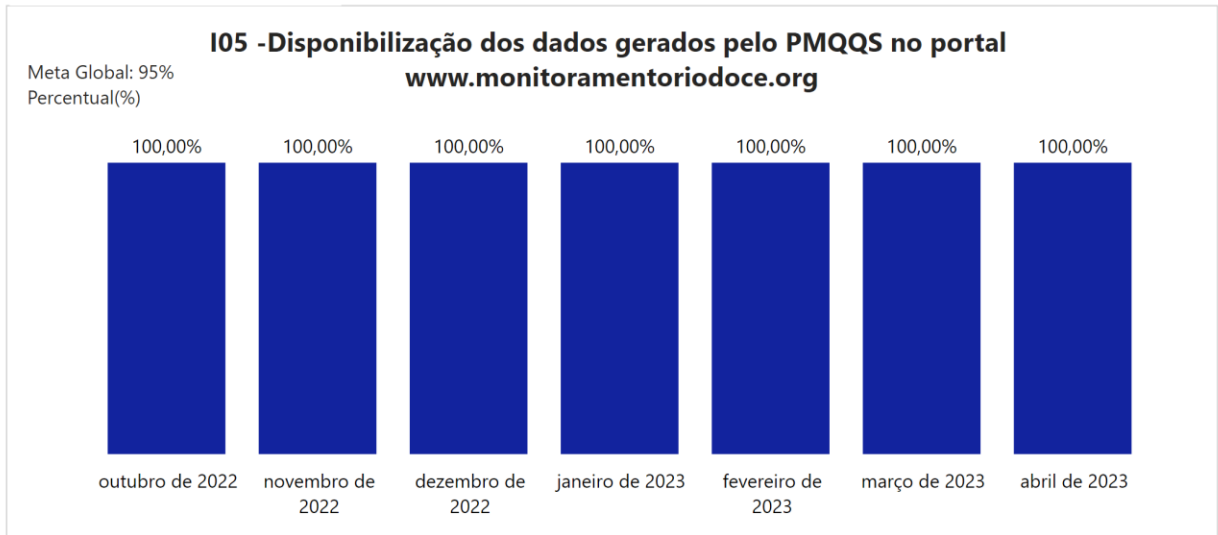


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal [www.monitoramentorioce.org](http://www.monitoramentorioce.org) - Frequência Mensal

## **PG039 Unidades de Conservação**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

















- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

fev/23		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
jul/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
jul/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
jul/23		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
jul/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
ago/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
ago/23		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
ago/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
set/23		Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
set/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
set/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
out/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
out/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
dez/23		Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números

## Fatos relevantes do mês

19/06/2023 Ofício FR.2023.1444 e seus respectivos anexos referentes Revisão do Documento "Síntese da Avaliação de Impacto Ambiental das Unidades de Conservação na bacia do Rio Doce e região costeira-marinha – Grupo 4", em atendimento ao item 2 Deliberação CIF nº 665.

19/06/2023 Ofício FR.2023.1443 e seus respectivos anexos referentes Revisão do Documento "Síntese da Avaliação de Impacto Ambiental das Unidades de Conservação na bacia do Rio Doce e região costeira-marinha – Grupo 3", em atendimento ao item 2 da Deliberação CIF nº 664.

05/06/2023 Ofício FR.2023.1332 referente apresentação dos desdobramentos das atividades de análise para atendimento às ações emergenciais da Reserva Biológica de Comboios para implementação do Plano de Ação, em resposta à Deliberação CIF nº 663.

## Indicadores

### I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%  
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

### I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

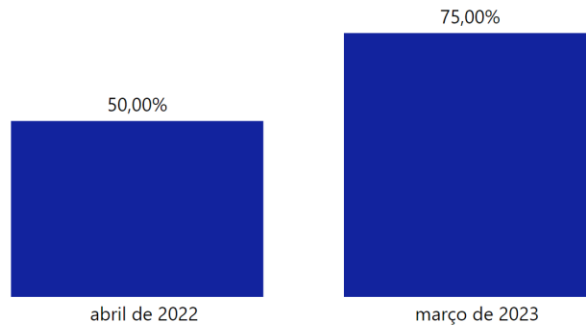


Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

## **PG040 CAR e PRAs**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente



## Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- julho de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

599 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 78 ( 13% ) imóveis declinaram e 521 ( 87% ) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 514 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

Finalização da Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para Território de Povos e Comunidades Tradicionais.

## Indicadores

### I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

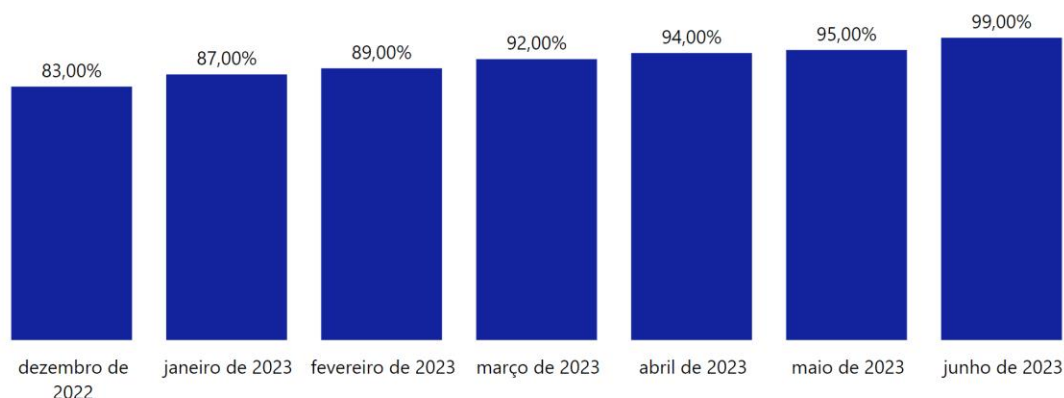


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

### I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

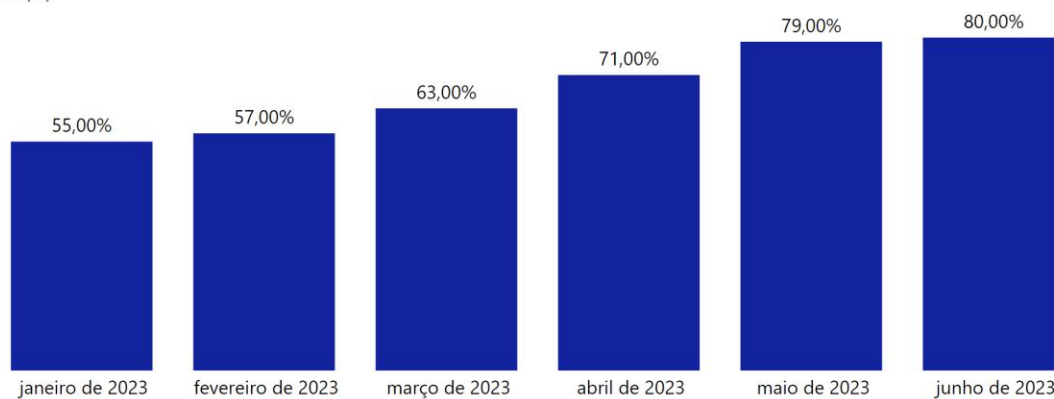


Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

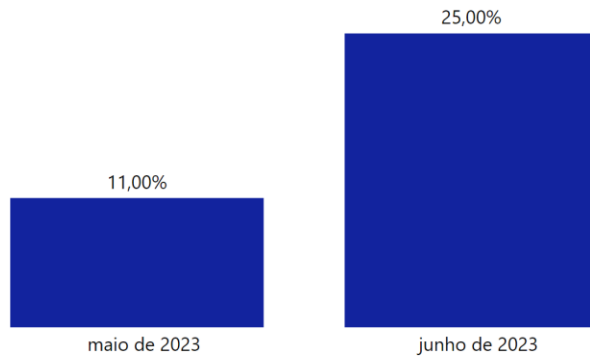


Gráfico 3: I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa - Frequência Mensal

## **PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

## Entregas do ano de 2023

- setembro de 2023 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2023 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

## Fatos relevantes do mês

Não houve Fatos Relevantes no Período

## Indicadores

### I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%

Percentual(%)

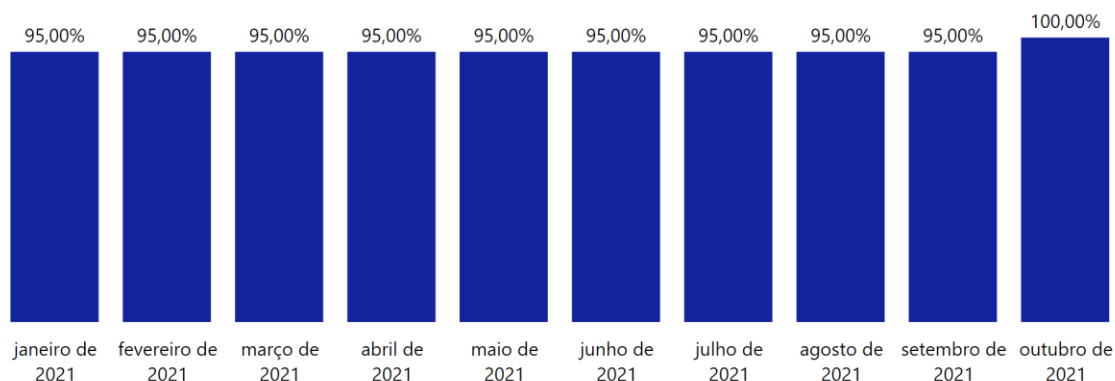


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

### I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%

Percentual(%)

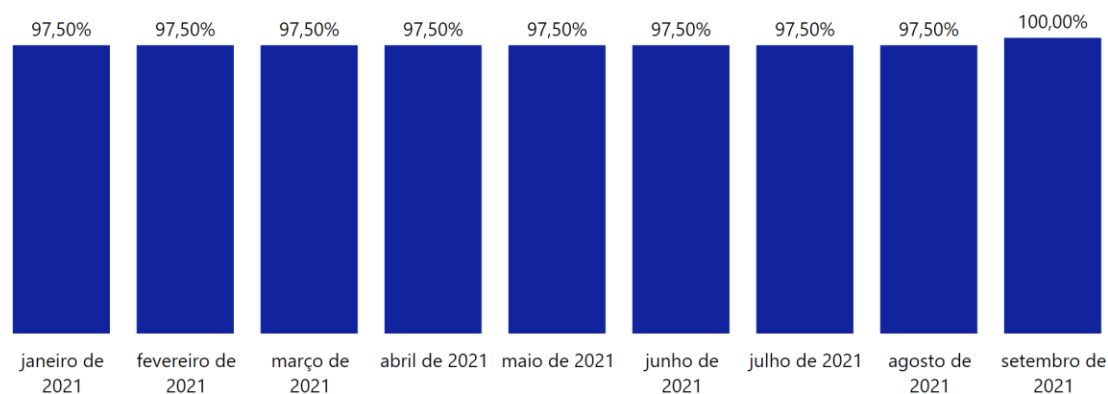


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%  
Percentual(%)

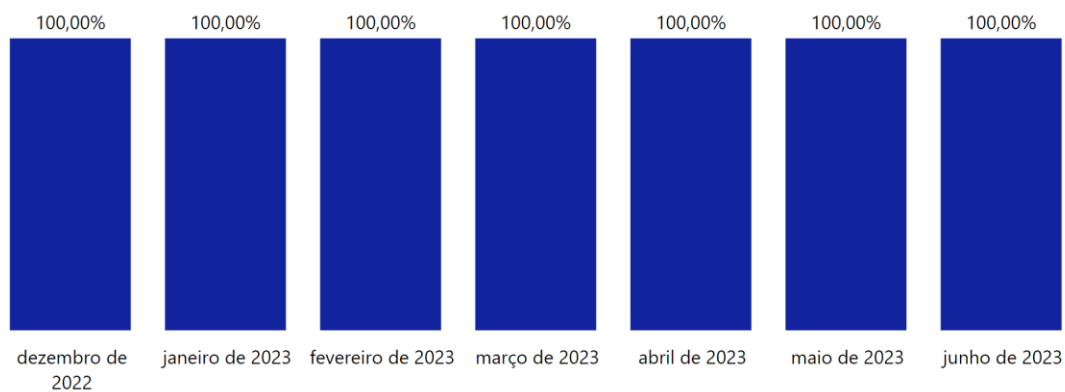


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.



XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

## Taxa de acidentes registrados

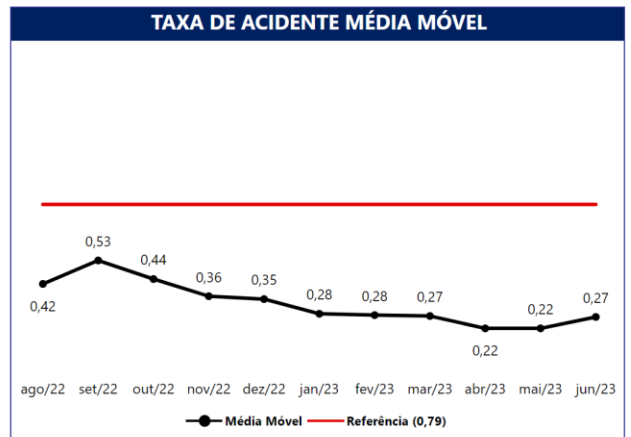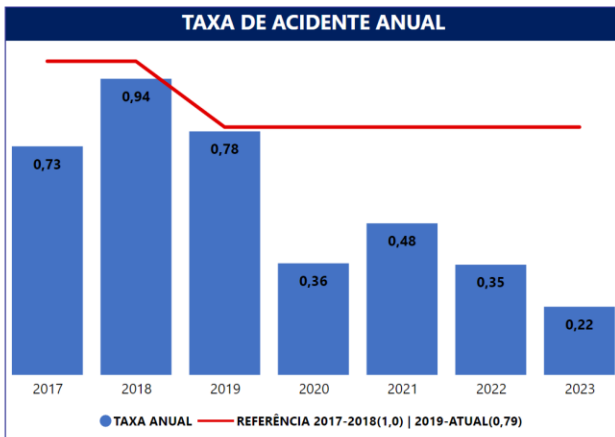

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica\*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	5,1	-10,8	-67,9%	6,1	5,1	-1,0	-16,2%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	2,5	-2,9	-53,7%	2,4	2,5	0,2	6,4%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	2,6	-1,4	-35,0%	2,1	2,6	0,5	23,9%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	2,5	-1,6	-39,3%	2,0	2,5	0,5	23,5%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	79,2	-153,7	-66,0%	89,5	79,2	-10,4	-11,6%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	22,2	-17,8	-44,5%	16,4	22,2	5,8	35,5%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	3,8	-0,3	-8,3%	3,1	3,8	0,7	22,5%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	18,8	-40,0	-68,0%	31,6	18,8	-12,8	-40,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	29,4	16,0	119,7%	12,2	29,4	17,2	140,6%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	2,9	-22,3	-88,3%	14,3	2,9	-11,3	-79,3%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	1,8	-2,5	-58,1%	1,3	1,8	0,6	43,1%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,1	-12,8	-99,0%	6,7	0,1	-6,6	-98,1%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	0,8	-1,9	-71,1%	1,2	0,8	-0,5	-37,4%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	46,1	-12,0	-20,6%	43,2	46,1	3,0	6,9%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	1,8	-2,4	-57,0%	3,6	1,8	-1,8	-50,1%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	15,6	-107,6	-87,3%	46,3	15,6	-30,7	-66,2%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	235,2	-374,0	-61,4%	282,0	235,2	-46,7	-16,6%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	27,9	-57,9	-67,5%	36,6	27,9	-8,8	-24,0%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	672,9	-2555,8	-79,2%	2172,6	672,9	-1499,7	-69,0%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	57,7	-169,6	-74,6%	106,4	57,7	-48,7	-45,8%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	5,4	2,2	68,0%	1,0	5,4	4,4	435,3%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	12,5	-14,8	-54,1%	10,3	12,5	2,2	21,1%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	33,1	-42,4	-56,1%	39,0	33,1	-5,9	-15,0%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	4,3	-9,8	-69,5%	9,8	4,3	-5,5	-56,3%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	739,7	-902,9	-55,0%	935,4	739,7	-195,7	-20,9%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	133,4	-129,5	-49,3%	157,4	133,4	-24,0	-15,3%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	48,0	-70,9	-59,6%	68,1	48,0	-20,2	-29,6%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	4,0	-6,0	-60,0%	4,5	4,0	-0,5	-11,1%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	4,7	-11,9	-71,6%	5,6	4,7	-0,9	-15,4%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	2,1	-4,5	-67,8%	1,5	2,1	0,6	38,7%
PG14	SAÚDE	6,6	2,4	-4,2	-64,0%	3,4	2,4	-1,0	-29,9%
PG16	PESCA	20,1	7,7	-12,5	-61,9%	11,1	7,7	-3,5	-31,2%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	48,1	-40,1	-45,5%	39,6	48,1	8,5	21,5%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	4,6	-9,1	-66,4%	4,6	4,6	0,0	-0,8%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	202,2	-243,6	-54,6%	206,9	202,2	-4,7	-2,3%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	66,5	-79,7	-54,5%	63,5	66,5	3,0	4,8%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	16,8	-12,5	-42,7%	15,0	16,8	1,8	12,1%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	50,2	-119,0	-70,4%	66,8	50,2	-16,6	-24,9%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	12,7	-21,0	-62,4%	17,9	12,7	-5,2	-29,2%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	69,7	-102,5	-59,5%	84,1	69,7	-14,4	-17,1%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	15,4	-16,1	-51,1%	15,6	15,4	-0,2	-1,3%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	1,1	-6,5	-85,8%	0,9	1,1	0,1	12,7%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	154,3	-156,9	-50,4%	153,9	154,3	0,4	0,2%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	2396,9	-4797,7	-66,7%	4231,6	2396,9	-1834,8	-43,4%
Total Programas		7803,8	2632,1	-5171,7	-66,3%	4513,6	2632,1	-1881,5	-41,7%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	81,0	-91,1	-52,9%	83,7	81,0	-2,6	-3,2%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	16,9	-124,2	-88,0%	99,4	16,9	-82,5	-83,0%
Total Despesas Administrativas		313,3	97,9	-215,3	-68,7%	183,1	97,9	-85,2	-46,5%
Total Geral		8117,1	2730,0	-5387,1	-66,4%	4696,7	2730,0	-1966,7	-41,9%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	2,53	1,59	-0,94	-0,37	Fatore internos: Edital Doce segunda edição execução: Desvio devido a estratégia de equilibrar as medições entre projetos reparatórios e compensatórios. Desta forma, as medições do eixo reparatório estão compensando o eixo compensatório. Incentivo à leitura: aceleração das entregas da etapa de modernização realizada em 2022.
PG15	INOVAÇÃO	0,32	0,37	0,05	0,17	N/A.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,43	0,08	-0,35	-0,80	Fatores Internos (Aceleração): R\$ 0,7 M Projeto Agroecológico MG: Antecipação de atividades relacionadas à agroindústria. Plano de Ação: N/A. R\$ 0,1 M Banco Comunitário: Antecipação de valores (mudança de solução). Plano de Ação: N/A. (R\$ 0,3 M) Projeto Agroecológico ES: Aumento do escopo do projeto (Assentamento Rio Quartel). Plano de Ação: Prestação de contas em julho, após término da execução.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,39	0,55	0,15	0,39	Fator externo: R\$ 0,4 M Estudos e Mapeamento: Mapeamento Mão de Obra Mariana e Prospecção de Fornecedores Locais. Valor acima do orçamento para o período no caso do contrato Expressão Socioambiental houve atraso para dar início no ano passado devido parecer CTEI e Deliberação CIF. Os custos do contrato DVF estão orçados em 2024 e foram antecipados pelo Programa. Plano de Ação: Ajustar no Draft 21 (concluído). Fator interno: R\$ 0,1 M Empresa Especializada RH: Contrato CPHO. Impacto reajuste contratual acima do previsto e oferta de 2 workshops não previstos no período. Plano de Ação: N/A.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	11,68	16,00	4,32	0,37	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 8,50 MM) Valores previstos para 2023 que foram medidos em dezembro/2022.</p> <p>(R\$ 5,38 MM) Atraso na emissão do Relatório de Homologação do Edital da Bacia do Manhuaçu (7.332 hectares), e da Bacia do Suaçui com atraso no início do processo de contratação.</p> <p>+R\$ 3,51 MM Aumento no fornecimento de insumos para os processos de cercamento, e adiantamento na aquisição de sementes.</p> <p>Plano de Ação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhar processo de contratação com suprimentos e governança (APROs 35 e 36) e replanejar atividades junto as contratadas.</li> <li>- Recuperar a curva operacional a partir da mobilização.</li> <li>- Revisar o quantitativo de entregas de insumos de cercamentos e de aquisição de sementes.</li> </ul>	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,22	3,45	1,23	0,55	<p>Fatores Internos</p> <p>R\$ 5,81 MM:</p> <p>Alteração das ações do CIAAT incorporando atividades de restauração ativa.</p> <p>Plano de ação:</p> <p>Revisão do planejamento do CIAAT.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,39	0,21	-0,18	-0,46	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,10 MM) Lançamento de medição indevida no DR Gerenciamento do CETRAS MG (atividades paralisadas).</p> <p>(R\$ 0,60 MM) Contrato de Gerenciamento do CETRAS-ES medido sob demanda.</p> <p>Ação CETRAS MG:</p> <p>Reclassificar as medições indevidas no DR de gerenciamento do CETRAS MG - Prazo: 31/8.</p> <p>Ação CETRAS ES:</p> <p>Monitorar as atividades junto à Engenharia para acompanhamento das demandas, conforme plano de trabalho apresentado - Prazo: 31/8.</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,45	0,58	-2,87	-0,83	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 12,8MM)</p> <p>Os municípios apresentaram medições em desconformidade com o previsto em cronograma/orçamento.</p> <p>Plano de Ação: Intensificar a rotina de reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, entendimento dos atrasos, orientações e repactuação das entregas definidas em cronograma.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	1,07	4,71	3,64	3,39	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 17,2MM</p> <p>Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022.</p> <p>Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,53	0,08	-0,44	-0,84	<p>Fatores Interno</p> <p>(R\$ 7,9 MM) - IFES: referente a postergação de repasse definitivo;</p> <p>(R\$ 2,28 MM) - UFMG/UFOP: demora na conclusão do take off que ocasionou atraso no pagamento de bolsa da 2ª turma do aperfeiçoamento;</p> <p>(R\$ 1,0 MM) - Lideranças Jovens ciclos 2 e 3: reprogramação da execução para adequar à aceleração;</p> <p>(R\$ 0,14 MM) - Fortalecimento do Redes: replanejamento de execução.</p> <p>Plano de Ação: Apresentar ao CIF manifestação conjunta do IFES, governo do Estado do ES e Fundação Renova, favorável ao repasse definitivo, para aprovação da estratégia e quitação das obrigações referentes ao projeto. Para os demais projetos, o valor será absorvido nos próximos meses.</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,02	0,18	0,16	9,04	<p>Fatores Internos:</p> <p>ESCOLA SEGURA / NUPDEC / APOIO A DEFESA CIVIL</p> <p>R\$ 0,33 MM Medição de dez/22 e lançada em jan/23. Necessidade de mais HH para conclusão do contrato gerando aditivo de prazo até abril/23. Suplementação do orçamento e nova contratação para atendimento da deliberação 623 (postergação de 18 meses NUPDEC e Escola Segura) a partir de jun/23.</p> <p>Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.</p> <p>AVCB ESCOLA SEGURA</p> <p>R\$ 0,18MM (SPCI) do Escola Segura - verbas não previstas para acompanhamento e cadastramento das escolas no INFOSCIP e valores de gerenciamento não previstos no orçamento.</p> <p>Plano de ação: Inserir no próximo ciclo orçamentário os custos com o serviço para atendimento aos municípios, monitorar a aprovação deste orçamento e as medições futuras.</p> <p>CENSO ÁREAS DE RISCO</p> <p>0,2MM PU para pagamento de pontos extras do mapeamento de áreas de risco identificados durante a execução.</p> <p>Plano de ação: Contrato encerrado e variação inserida no draft 2021.</p> <p>FORMAÇÃO CONTINUADA</p> <p>0,2MM Antecipação de pagamento referente ao conclusão dos cursos de curta duração do 1º semestre de 2023, que estava prevista para julho/23.</p> <p>Plano de ação: Monitorar próxima medição junto ao fornecedor.</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,97	0,04	-0,94	-0,96	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias.</p> <p>Postergação: (-R\$ 6,6 MM)</p> <p>- CIT Mariana – A Prefeitura de Mariana retirou a indicação do Terminal turístico e indicou a Arena esportiva do município como nova localidade para instalação do CIT. Em fase de avaliação da nova indicação e re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação equipamento. Em paralelo será realizada a instalação temporária em espaço provisório até o término da formalização da parceria PMM.</p> <p>- CIT GV – O Projeto executivo finalizado, porém PMGV solicitou atualização do termo de parceria, aguardando nova assinatura do documento para contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento.</p> <p>- CIT Linhares - Termo de Parceria aguardando assinatura pelo ICMBio. Processo concorrencial de contratação da empresa responsável pelas obras realizado e aguardando da aprovação da Apro.</p> <p>Plano de Ação: O Programa ampliou os pontos de acesso para plataforma digital de 3 para 13 unidades em todo o território visando mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar a ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na próxima janela de oportunidade.</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,00	-0,20	-1,00	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 0,2 MM) - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,3 MM) - atraso no registro da medição do mês de abril do fee mensal. Em abril de 2023 o contrato se encontrava bloqueado para medição no SAP, devido execução paralela do aditivo contratual, para medição das últimas entregas e de reajuste.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,93	0,12	-0,81	-0,87	Economia  Fatores Internos  Fatores Externos R\$ 6,0 MM Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice IPCA. Plano de Ação: N/A  (R\$ 3,0 MM) Causa: Postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS Plano de Ação: Priorizar a contratação dos serviços e equipamentos em que tivemos termo de referência recebido.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,68	0,31	-0,38	-0,55	Mudança de Solução (R\$ 0,74 MM) - ELABORAÇÃO DO PRA (R\$ 0,43 MM) - IMPLANTAÇÃO DO PRA - RESTAURO FLORESTAL Falta de engajamento dos produtores impactando nas atividades da empresa contratada para elaboração dos PRADAs; e Atraso nas atividades de implantação dos PRA Pilotos pelos produtores. Plano de ação: N/A Reprogramação da execução (R\$ 6K) - CADASTRO DAS PROPRIEDADES RURAIS - CAR (R\$ 0,58 MM) - CONSULTORIA AMBIENTAL PG40 (R\$ 9K) - COMUNICAÇÃO PG40 Atividades replanejadas no cronograma aprovado em março/2023. Plano de ação: Desembolsos revistos no Draft21.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	17,39	0,20	-17,19	-0,99	Fatores Internos: (R\$ 0,17 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos  Fatores Externos: +R\$ 15,0 MM: Por definição externa, realizado o repasse de 100% do orçamento para operação do aterro sanitário Mariana. + R\$ 0,49 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses (R\$ 16,5 MM): Base Integrada Segurança Pública Mariana: nova decisão CIF, será reiniciado acordo (R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Caberá a Fundação Renova a execução dessa obra. (R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ponte Nova – acordo não firmado (R\$ 3,0 MM): Agenda Integrada Ensino São Pedro dos Ferros – acordo não firmado (R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ouro Preto – depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação em programa. (R\$ 2,5 MM): Perícia Agenda Integrada suspensa.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Compensatórios		43,21	28,46	-14,75	-0,34	Fatores Externos



PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$: 6,0 MM
PG01	CADASTRO	7,87	4,59	-3,28	-0,42	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 6,6 MM) - Não adequação do contrato da demanda judicializada de gravação de voz previsto no Draf20 para fevereiro. Medição com valores iniciais de cadastro, ou seja, valor unitário menor que o orçado. Pendente regularização contratual. Além disso, proporções de cadastros (53%) VS tratativa (47%) menor que o cenário orçado de 70% cadastro e 30% tratativa. (-R\$ 2,2 MM) - Índice do reajuste do contrato da Synergia ficou negativo, fazendo com o que mesmo não fosse reajustado.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	381,39	258,19	-123,20	-0,32	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 621,49) – Novel: baixa qualificação dos casos novos. (- R\$ 438,06) – Aba Recursal: pendência na entrega de Laudo por parte do Perito. (- R\$ 155,50) – Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido as decisões recentes do judiciário. (- R\$ 132,13) – Demais indenizações: processos do DG com laudos abaixo do previsto. (- R\$ 98,42) – Infra e Serviços: despesa menor que o previsto. (- R\$ 44,61) – Dano Água: acordos fase de protocolo para Homologação e quantidade de sentença abaixo do previsto. (- R\$ 9,44) – Mariana ACP: redução do ticket médio.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG03	POVOS INDÍGENAS	25,39	9,36	-16,03	-0,63	<p><b>Economia:</b></p> <p>(R\$ 1,6 MM) Alimentação animal Resplendor. Valor desembolso do contrato foram estimados a maior. Foram planejados dois reajustes no contrato, mas ocorreu uma única vez durante o período da previsão. Plano de Ação: Remanejado o valor para a contingência na Draft 21.</p> <p>(R\$ 5,9 MM) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de junho/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Em TG e Comboios ainda ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes já está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente e o valor da cesta básica foi estimado a maior. Plano de Ação: Desembolso adequado no orçamento no Draft 21.</p> <p><b>Fatores Internos:</b></p> <p>(R\$ 2,5 MM) Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi estimado a maior que o praticado atualmente, principalmente referente aos caminhões pipa. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e a curva de desembolso já ajustada no Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,4 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p><b>Fatores Externos:</b></p> <p>(R\$ 4,5 MM) Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal e orçamento adequado no Draft21 considerando a sazonalidade.</p> <p>(R\$ 23,6 MM) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo será definido após a audiência de conciliação que foi adiada para setembro/23, uma vez que as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. Plano de ação: Acompanhar a audiência de conciliação, em setembro/23.</p> <p>(R\$ 4,0 MM) Detalhamento, Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,2 MM) SAA Krenak. Ação replanejada pela coordenação, tendo em vista o cenário na TI Krenak. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,11	0,63	0,52	4,59	<p>Fatores Externos</p> <p>R\$ 4,5 MM - Pagamentos da assessoria técnica ASPERQD e perita Kearney executados em atendimento à decisão judicial, não previstos no Draft20. E, pagamento realizado ao perito judicial, conforme decisão judicial referente aos honorários para mediação de audiências com povos originários do ES. Plano de Ação: Despesas incluídas no Draft21.</p> <p>R\$ 0,4 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ de gestão e monitoramento; finalização dos livros de medicina tradicional e referências culturais. Oficinas de revisão do Programa que atrasaram porque a CT-IPCT e respectivo GT solicitaram postergação do prazo, devido às mudanças dos representantes do governo federal. Plano de Ação: Desembolso ajustado no Draft21 e acompanhar o cronograma das oficinas.</p> <p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,5 MM) - Gerenciamento do Programa: despesas por demanda. Diálogo especializado: recurso será utilizado para contratação de produtora de eventos que fará a logística das atividades coletivas nas comunidades. Plano de ação: Desembolso ajustado no Draft21.</p>	
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,04	0,47	-1,58	-0,77	<p>Fatores Internos:</p> <p>R\$ 2,2 MM - Planos Municipais em Proteção Social: Antecipação de baixas contábeis de adiantamento para o plano de demais municípios que estavam previstas no orçamento para os meses de julho e dezembro.</p> <p>Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais e as ações desenvolvidas nos Planos Municipais e Estadual.</p>	
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,09	7,34	1,25	0,20	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 1,9 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens de manutenção dos das CIAS, principalmente contratos geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança.</p> <p>Plano de ação: Acompanhamento das execuções dos gastos com as áreas de suporte e adequações no próximo ciclo orçamentário.</p> <p>(R\$ 1,5 MM) - Participação e Diálogo: Execução a menor no contrato da a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Processo de contratação de empresa para suporte aos fóruns de prestação de contas reiniciado.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar a curva orçamentária do programa visando maior aderência das ações em implementação, além das estratégias de execução dos fóruns e plataforma. Ações propostas para o próximo ciclo ainda no aguardo da aprovação.</p> <p>(R\$ 2,3 MM) - Assessorias Técnicas: Rosa Fortini está pendente resolução interna das prestações contas para efetuar lançamento para dar baixa no sistema.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.</p> <p>Fatores Externos</p> <p>(R\$ 0,5 MM) - Decisão Judicial: Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial ASPERQ DEGREGO conforme homologação. Orçamento estava contemplado para 2022 no draft 20.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no próximo draft.</p>	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	1,78	0,28	-1,50	-0,84	<p>Fatores Internos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Emissão de nota do contrato 4900000394 (ERG Engenharia Ltda.) posterior ao período de medição (30/06/2023) em função de problema de acesso ao SAP Fiori, somente regularizado na segunda (03/07/2023).</li> <li>Redimensionamento (redução) e postergação de valores destinados à aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07.</li> </ol> <p>Fatores Externos: Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG08	REASSENTAME NTO	159,54	210,33	50,80	0,32	Economia (R\$0,0) Fatores Internos (- R\$ 195,7) (- R\$ 38,3) Assist. Impactados - Atraso Valores do PERPE não realizados (- R\$ 36,2) Novas moradias Familiar. Atrasos das Obras F1, F2, F3; (- R\$ 26,0) Novas moradias Demais custos Pag. Pecúnia abaixo do previsto (- R\$ 24,1) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto); (- R\$ 20,9) Contenções Familiar. Custos lançados em novas moradias (- R\$ 20,6) Infra Sítiantes. Reprogramação das atividades. (- R\$ 18,4) Equipamentos públicos Bento. Interrupção de Id's; (- R\$ 16,4) Contenções Bento. Frentes em mobilização (- R\$ 14,5) Iluminação pública Paracatu: atraso na entrega de medições; (- R\$ 13,0) Construção Trevo Baixa performance da empresa (- R\$ 12,1) Equipamentos públicos Paracatu. Empreiteira não performando; (- R\$ 10,5) Diversos Paracatu não realizado acesso Pedras. R\$ 18,8 Novas Moradias variação positiva execução contratadas R\$ 98,4 Pagamento do acordo Judicial de Gesteira (- R\$ 61,9) Outras atividades reprogramadas. Fatores Externos (R\$0,0)	
PG09	UHE CANDONGA	22,44	17,27	-5,17	-0,23	Economia Fatores Internos: (R\$ 24,0 MM) Desembolso menor que o previsto nos serviços de Auditoria e Consultoria, Custos Fundiários, Dragagem, Drenagem, Engenharia, e nas obras de Condicionantes. Fatores Externos	
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	15,58	4,63	-10,96	-0,70	Economia Fatores Internos: (R\$ 24,8MM) (R\$ 1,9MM): Pontes já finalizadas antes do previsto. R\$ 1,6MM: Escopos sob demanda (Man. Edificações e Vias) Ações: Novo Draft em andamento para correção do previsto. Escopos sob demanda em andamento. (R\$ 24,6MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de solução para nova contratação. Ações: Pacote de novas contratações em fase de conclusão. R\$ 1,8MM: Campo em Ponte do Gama - Postergação por ineficiência da contratada Ações: Foram feitas intervenções junto à contratada. Obra em finalização/desmobilização. (R\$ 2,4MM): Talude Camargos - Paralisada espeleologia. Ações: Custo transferido para o risco no Draft21 (sem previsibilidade). R\$ 0,7MM: Diversos Fatores Externos: R\$ 4,6MM (R\$ 4,5MM): Postergação de pagamento do Pacote de Repasse para Prefeitura de Barra Longa. Aguardando finalização do acordo judicial. Ações: Setor jurídico da FR acompanhando junto ao judiciário. R\$ 9,1MM: Pagamento honorário do perito conforme decisão judicial.	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,98	1,06	0,08	0,08	Fatores Internos (R\$ 0,55MM) - Psicopedagógico Institucional:efere-se ao atraso no processo de contratação concorrential do novo fornecedor para o apoio Psicopedagógico. O processo foi teve atraso na contratação, previsto para fev/22 e finalizado em abr/22, começando as atividades somente em jun/22. Plano de ação: Engajar as escolas para que as ações ocorram como planejamento.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,10	1,00	-0,10	-0,09	<p>Fatores Internos (R\$ 0,4 MM) - Eixo imaterial: atraso nas execuções das ações da Casa dos Saberes, Plano de Reparação e UNESCO devido à comunidade e necessidade de reprogramação de atividades, havendo também atraso na medição de parceria do Museu da Pessoa, para ajuste na prestação de contas. Plano de Ação: As ações da UNESCO serão medidas na sua totalidade até o mês de outubro. As ações da casa dos saberes foram ajustadas no contrato para aumento do prazo de execução e refletida no draft 21, além disso, estão sendo antecipadas ações do plano de reparação.</p> <p>(R\$ 0,3 MM) - Eixo material: reprogramação dos contratos de infraestrutura e dos contratos sob demanda. Plano de Ação: As ações de gerenciamento serão medidas a partir do mês de Junho.</p> <p>(R\$ 0,2 MM) - Consultoria da arquidiocese: valores não realizado, contrato sob demanda. Plano de Ação: Antecipação das ações de restauração de capelas inicialmente previstas para 2024.</p>
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,19	0,94	0,76	4,06	<p>Fatores Internos Edital Doce: 2ª edição - execução: antecipação das medições das prestações de contas afim de cobrir os desvios do eixo compensatório;</p>
PG14	SAÚDE	0,03	0,00	-0,02	-0,86	<p>Fatores Externos: (R\$ 1,6 MM) O município de Mariana não efetuou prestação de contas judicialmente do terceiro, quarto e quinto repasses. Por este motivo, não foi realizado o repasse financeiro para suplementação de RH em cumprimento ao acordo judicial. +R\$ 0,6 MM Realização de repasse para complementação do valor disponibilizado em setembro/2022 para suplementação de RH em Barra Longa e aluguel de carros e cartão combustível. Na elaboração do Draft 20, não foi contemplada a possível dilação de prazo do acordo judicial de Barra Longa. Plano Ação: Revisão das estimativas e do fluxo econômico no Draft21</p>
PG16	PESCA	4,49	2,85	-1,64	-0,37	<p>Fatores Internos: (R\$ 1,8 M) Projetos da Foz Rampa de Subida de Barco e Edificação de Povoação: Aguardando licença ambiental para iniciar as obras. Plano de ação: Articulação junto à Prefeitura Municipal de Linhares para obtenção da licença ambiental. Prazo: Edificação 11/23 e Rampa 12/23. (R\$ 0,9 M) Caracterização e Monitoramento: Postergação da execução das atividades. Plano de Ação: Reprogramar valor no Draft 21 (concluído). (R\$ 0,8 M) Cultivando para o Pescar: Baixa performance do fornecedor. Atraso no processo de aditivo em Suprimentos. Plano de Ação: Acompanhar conclusão do aditivo e realizar visitas quinzenalmente para acompanhar execução do projeto.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	1,02	0,99	-0,03	-0,02	N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	34,11	33,64	-0,46	-0,01	Fatores Externos Postergação: (- R\$ 4,74) - AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial, aumento de ticket médio e aumento de dependentes.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	12,86	9,37	-3,49	-0,27	MANEJO DE REJEITOS Fatores Internos: R\$ 0,15 MM: AÇÕES DE INFRA, (R\$ 0,48 MM) PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6; (R\$ 1,47 MM) AUDITORIA PG23 (R\$ 0,31 MM) LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG23, (R\$ 0,15 MM) EVENTOS E COMUNICAÇÃO PG23, (R\$ 0,15 MM) MANUTENÇÃO DE ACESSOS MANEJO DE REJEITOS Plano de Ação: Corrigir a curva no DRAFT21  Fatores Externos PG23 (R\$ 0,30 MM): ARSH e ARE; R\$ 0,38 MM: ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS; (R\$ 2,29): RENATURALIZAÇÃO Plano de Ação: ARSH e ARE - acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; CONSULTORIA AMBIENTAL PG23 e ESTUDOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS : N/A; RENATURALIZAÇÃO: Buscar junto a CT-GRSA a validação das áreas de expansão;  BARRAMENTO: Fatores Externos R\$ 7,6 MM: Pagamento Perícia Eixo 4 Plano de Ação: Ajustado Draft21

		Mensal				Anual Acumulado		
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada		
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	5,34	10,78	5,44	1,02	<p>Ações da Infra (R\$ 1,35 MM)</p> <p>Atividades de infraestruturas paralisadas, aguardando estratégia mediante decisão judicial sobre a pecúnia. Plano de ação: Contrato já finalizado e curva ajustada no Draft21.</p> <p>N/A. Aguardar posicionamento judicial.</p> <p>Execução (+)</p> <p>R\$ 0,29 MM - IMPLANTAÇÃO DAS MELHORIAS ALTERNATIVAS - Replanejamento das atividades de recursos hídricos, em função de revisão das demandas PASEA e perfuração de poços.</p> <p>R\$ 10,5 MM - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS IMPACTA - Avanço nas atividades de reparação dos danos (jusante) PTIP.</p> <p>R\$ 0,27 MM - RESTAURO FLORESTAL APP - PG17 - Adiantamento de atividades.</p> <p>R\$ 6,5K - PSA - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS"</p> <p>Plano de ação: N/A. Desembolsos revistos no Draft21.</p> <p>Mudança de Solução</p> <p>R\$ 1,1 MM - GERENCIAMENTO PG17) - Abertura de duas novas ordens de serviço no contrato da Progen para reforço da equipe (PAR 2) - Aumento de escopo.</p> <p>Plano de ação: Desembolsos revistos no Draft21.</p> <p>Prestação de contas de terceiros</p> <p>(R\$ 0,14 MM) - MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES D - Parceria</p> <p>(R\$ 0,39 MM) - FORNECIMENTO DE SILAGEM TERRITÓRIO II - Continuidade do fornecimento de silagem por decisão judicial.</p> <p>(R\$ 70K) - PROJETO INOVATER - FUNDAGRES E INCAPER" - Parceria</p> <p>Plano de ação: N/A. Desembolsos revistos no Draft21.</p> <p>Economia</p> <p>(R\$ 1,0 MM) - SANEAMENTO RURAL (MINI ETE)</p> <p>(R\$ 68K) - IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS</p> <p>(R\$ 1K) - MELHORAMENTO GENÉTICO"</p> <p>Saving após término das atividades.</p> <p>Plano de ação: N/A - Redistribuição do orçamento para as demais atividades do PG.</p> <p>Processos Internos</p> <p>(R\$ 0,45 MM) - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA AUMENTO DA PROD - Neste diagrama de rede haviam contratos apropriados indevidamente, logo a curva de desembolsos contavam com essas atividades, que foram para o Diagrama correto (ATER 2).</p> <p>(R\$ 33K) - PLANO SAÍDA SILAGEM - Estratégia de criação de DR específico para a atividade.</p> <p>(R\$ 1,0 MM) - ATER TERRIT II - CANDONGA A FOZ - Foram feitos aditivos nos contratos para reajuste dos preços, que estão sendo medidos. Ainda, os contratos de ATER a jusante estavam apropriados em DR errado, com o ajuste estão sendo debitados neste DR corretamente.</p> <p>Plano de ação: Desembolsos revistos nos diagramas corretos no Draft21, incluindo os aditivos e reajustes.</p> <p>Contratos sob demanda</p> <p>(R\$ 3K) - RECONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS E ACESSO</p> <p>(R\$ 0,16 MM) - DESPESAS DIVERSAS</p> <p>(R\$ 0,47 MM) - FORNECIMENTO ÁGUA - CAMINHÃO PIPA</p> <p>(R\$ 5,8K) - RECOMP ALIMENTAÇÃO ANIMAL SILAGEM</p> <p>(R\$ 5,2K) - SEGURO RECUP PROPRIEDADES RURAIS</p> <p>(R\$ 5,7K) - COMUNICAÇÃO PG17</p> <p>R\$ 20K - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG17</p> <p>(R\$ 35,3K) - CUSTO ADICIONAL COVID19 PG17</p> <p>Contratos sob demanda.</p> <p>Plano de ação: N/A</p>		

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos: (R\$ 0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,49	3,16	0,68	0,27	Fatores Internos R\$ 1,41MM - Desembolso Manutenção Cercamento Restauro (Século XXI e Antônio Garavini) maiores que o previsto Plano de ação: NA (Revisado no Draft21) R\$0,41MM - Desembolso Gerenciamento maior que o previsto. Plano de ação: NA (Revisado no Draft21)	
PG28	BIODIVERSIDADE	3,44	0,37	-3,07	-0,89	Economia Fatores Internos R\$: (6,20) MM Causa: Alteração do cronograma de repasses, R\$ 34,3 MM de adiantamento de pagamento em 2022. Liberação da 3ª Parcela do 6º Aditivo e 2ª Parcela do 7º Aditivo da parceria FEST/UFES, realizado em mai/23. Plano de Ação: Promover a fusão dos cronogramas de desembolsos dos aditivos do ATC-FEST na previsão orçamentária, Draft 21.  R\$: (9,23) MM Causa: Avanço financeiro dos projetos de pesquisa da Chamada 10 FAPEMIG inferior ao previsto no plano de trabalho, o que é refletido na prestação de contas ano I (inferior ao previsto), e prestação de contas ano II (pendente). Plano de Ação: Identificar junto a FAPEMIG quais pendências ainda encontram-se em aberto junto aos projetos, e cobrar das linhas temáticas a regularização das prestações de contas do ano II.  R\$: (1,18) MM Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A Fatores Externos	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	4,89	1,04	-3,85	-0,79	Economia (1,10M): Não execução de análises potenciais no monitoramento (menor coleta de amostras). Menor demanda de contratos "sob demanda"  Fatores Internos (4,50M): Replanejamento de duas contratações por necessidade de redefinição na estratégia de contratação e de escopo do Plano de Ação Terrestre - PABT. Atraso em duas contratações. Atraso por parte da RNP na conclusão da contratação e valor da UFV que não foi emitido.  Ação: Não haverá recuperação em relação ao Draft 20 e o ajuste será feito no Draft 21.	



PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,47	12,99	-0,48	-0,04	<p>Economia:</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 13,9MM)            Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022. Rede Elétrica Adutora GV Com postergação da conclusão da obra, os custos previstos com energia elétrica durante período de operação assistida não se concretizaram.            Infra RD: Abastecimento de água por caminhão pipa: A implantação de medidas alternativas de fornecimento de água, somadas a redução de consumo, em função das baixas temperaturas, promoveu a execução a menor do que o projetado para o contrato. Ainda corroborando para o acumulado negativo, a medição contratual do período não foi executada devido a fatores internos.            Reparação de vias: As obras de reparação definitiva de vias ainda não foram realizadas. Medidas paliativas foram adotadas nas localidades até que os processos internos de desenvolvimento de projetos e contratação estejam concluídos. Isto posto, o desembolso projetado para o período não está sendo executado.</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 0,5MM)            Infra LI: Adequações da captação alternativa (aquisições e serviços) em antecipação do escopo a ser contratado justificado pelas mobilização para o descomissionamento das ensecadeiras, autorizado pelo juiz.</p>	
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,48	2,50	0,02	0,01	Sem devio relevante.	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,03	0,08	0,05	1,40	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos            R\$ 0,03 MM            Causa: Serviço sob demanda (Painel de especialista, Doce Vivo e Custos adicional COVID 19)            Plano de Ação: N/A</p> <p>R\$ 0,10 MM            Causa: Ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia)            Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos            R\$ 0,40 MM            Causa: Parceria Unesco - Contabilização de prestação de contas não previstas no Draft 20. Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira.            Plano de Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria.</p> <p>(R\$ 0,41 MM)            Causa: Atraso de envio de prestação de contas pelo parceiro FBDS            Plano de Ação: Cobrar a prestação de contas ao parceiro e garantir o atendimento do cronograma de entrega dos produtos planejados.</p>	

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,79	25,56	0,77	0,03	Economia Fatores Internos (+R\$ 3,0 MM) Serviços de TI, Contrato 4800095620 Brasoftware - Aditivo não finalizado a tempo para faturamento dentro de 2022 a variação permanecerá até a revisão do próximo Draft. (+R\$2,0 MM) Despesas Finalísticas, sendo (+R\$5,50MM) em Despesas com pessoal; (-R\$3,87MM) com Serviços Contratados, (+R\$0,35MM) em Despesas de Viagem, (-R\$0,02MM) em Despesas Diversas e Materias. (-R\$ 4,1 MM) Contratos Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação (PMO) sob demanda - Accenture, G4f e Progesys. (-R\$ 0,5 MM) Outros como; Contratação de MDO (serviços sob demanda, fornecedor PRESTAR) e serviços relacionados a veículos. Fatores Externos
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia Fatores Internos
Total Reparatórios		733,94	619,44	-114,50	-0,16	
Total Programas		777,15	647,90	-129,25	-0,17	

**\*Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	13,91	14,90	0,99	0,07	<p>Economia: (- R\$ 2,1)            (- R\$ 0,60) serviços de impressão            (- R\$ 0,14) correios e malotes, devido menor volume de informes de rendimentos remetidos via postagem física            (- R\$ 0,26) serviços de consultoria Gestão de Riscos, havia previsão de utilização de 4 recursos da KPMG, mas otimizamos as atividades e estamos utilizando 3 recursos.            (- R\$ 0,36) serviços não realizados no escritório de Belo Horizonte devido a desmobilização de espaços.            (- R\$ 0,72) consultoria para TAC GOV, que passaram a ser alocados em Custeio Governança.</p> <p>Fatores Internos: (- R\$ 0,55)            (+ R\$ 3,4): Despesas com pessoal - é principalmente devido ao pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes. Variação também acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes. Posições não desmobilizadas conforme planejado no Draft 20.            (+ R\$ 0,92): Despesas Diversas e Materiais - +R\$ 0,69 MM seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23 e +R\$ 0,16 MM de gastos com acordos e custas judiciais acima do previsto. +R\$ 0,05 MM outros.            (- R\$ 3,77): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades reprogramadas), consultorias para Gestão de Pessoas e Diretoria Institucional, serviços não realizados em TI.</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	3,39	-13,19	-0,80	<p>Economia:            (R\$ 3,5 MM) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Abaixo do previsto no Draft 20, com reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF no início do ano.            Fatores Internos:            (R\$ 8,0 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Realizado repasse de R\$ 8,0 MM (previsto R\$ 16,0 MM).            (R\$ 2,1 MM) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23.            Fatores Externos:            (R\$ 68,9 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		30,49	18,29	-12,20	-0,40	
Total Geral		807,64	666,19	-141,45	-0,18	

**\*Valores em milhões de reais.**
